

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações Biênio 2018-2019

Revisão 2019

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



## **ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO 2018 - 2019**

DESEMBARGADORA VANIA CUNHA MATOS  
PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RICARDO CARVALHO FRAGA  
VICE-PRESIDENTE

DESEMBARGADOR MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO  
CORREGEDOR REGIONAL

DESEMBARGADOR MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA  
VICE-CORREGEDOR REGIONAL

### **COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES**

DESEMBARGADOR CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA  
PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DESEMBARGADOR GEORGE ACHUTTI

DESEMBARGADOR MARCELO JOSÉ FERLIN D'AMBROSO

JUÍZA ANITA JOB LUBBE  
DIRETORA DO FORO DE PORTO ALEGRE

JUIZ EVANDRO LUIS URNAU  
JUIZ DO TRABALHO

RODRIGO FONTES CORREA  
REPRESENTANTE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

JUIZ CLOCEMAR LEMES SILVA  
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA

BÁRBARA BURGARDT CASALETI  
DIRETORA-GERAL

ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS  
SECRETÁRIO-GERAL JUDICIÁRIO

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA  
DIRETORA DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

## ÍNDICE

Introdução	4
1. Diagnóstico de Governança e Gestão de TIC	4
1.1. Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle	4
1.2. Políticas e Planejamento	5
1.2.1. Gestão da Segurança da Informação	5
1.2.2. Planejamento e Gestão das Contratações	6
1.2.2.1. Contratações 2018	6
1.2.2.2. Execução Orçamentária 2018	7
1.3. Estrutura Organizacional e macroprocessos	9
1.4. Pessoas	9
1.4.1. Força de Trabalho	9
1.4.2. Gestão da Capacitação da equipe de TIC	10
2. Catálogo de Serviços e Sistemas	13
2.1. Catálogo de Sistemas	13
2.1.1. Sistemas desenvolvidos total ou parcialmente pela equipe de desenvolvimento do TRT e sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	13
2.1.2. Sistemas de terceiros	13
2.2. Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviço	13
2.3. Avaliação do PDTIC 2018	15
2.4. Projetos concluídos em 2018 - Resultados	15
2.5. Situação do portfólio de projetos aprovado em 2018	18
2.6. Portfólio de Projetos 2019	18
3. Plano de Contratações de TIC 2019	18

# INTRODUÇÃO



O presente documento apresenta os indicadores de acompanhamento da execução do plano diretor de TIC, relacionados ao ano de 2018, bem como o planejamento atualizado para o ano de 2019.

## 1. DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

### 1.1. Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle

A partir de 2017, o TCU decidiu unificar os quatro levantamentos de governança realizados com foco nas organizações públicas, além de tornar o levantamento anual público e parte integrante do processo de prestação de contas anuais.

As notas são apresentadas em gráficos do tipo radar, variando de 0 (0%) a 1 (100%). No gráfico, os dados da organização em análise são enfatizados em azul. Em seguida são apresentadas as médias dos agrupamentos por tipo e por segmento ao qual a organização em análise pertence. Se o grupo por tipo é idêntico ao grupo por segmento, é apresentado apenas o agrupamento por tipo. Finalmente, são apresentadas as médias de todos os 488 participantes.

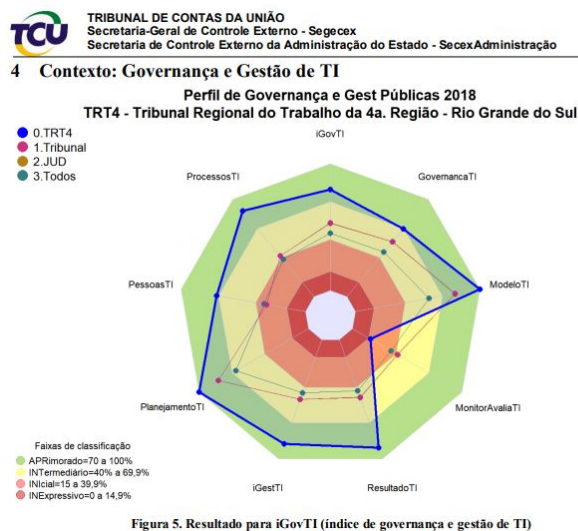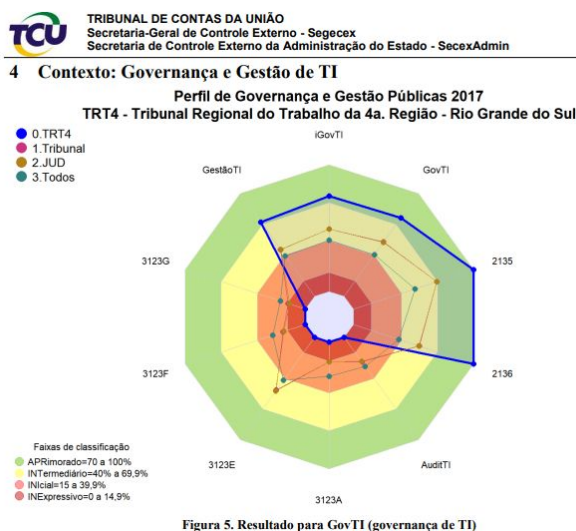

A partir de 2016, o CNJ também passou a realizar levantamento anual sobre a maturidade da governança e gestão de tecnologia da informação e comunicações no âmbito do Poder Judiciário, representada pelo índice iGovTIC-JUD.

No levantamento de 2018, o Tribunal obteve o primeiro lugar entre todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive os estaduais e militares, atingindo o índice de 0,86.

Tabela 7. Resultados do **Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região** no iGovTIC-JUD 2018

Nota do Órgão		Nível de Maturidade	
0,86		Aprimorado	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade	
1. Das Políticas Planejamento	0,97	Excelência	
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,94	Excelência	
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,72	Aprimorado	
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,86	Aprimorado	
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,81	Aprimorado	
6. Dos Serviços de Infraestrutura	1	Excelência	
7. Detalhamento	0,73	Aprimorado	
Classificação 2018			
Segmento	Porte	Geral	
1º (de 24)	1º (de 27)	3º (de 92)	
Evolução iGovTIC-JUD			
2016	2017	2018	
0,84	0,87	0,86	

No entanto, apesar da notável evolução do Tribunal, os processos de governança e gestão de TIC devem permanecer em constante melhoria, visando sempre o interesse e necessidades do Tribunal na execução da sua missão.

## 1.2. Políticas e Planejamento

### 1.2.1. Gestão da Segurança da Informação

Em 2015, quando da implantação do 1º ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, foram definidos os indicadores e metas para acompanhamento e melhoria contínua. O segundo ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação foi executado em 2017, onde foi possível verificar uma melhoria nos índices de segurança da informação, demonstrados a seguir. Em 2018 foi executado o 3º Ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, tendo como escopo os ativos tecnológicos que suportam o PJe e ativos tecnológicos que sofreram mudança significativa entre 2017 e 2018. Verificou-se, ao final do ciclo, que o índice de segurança do escopo avaliado atingiu o valor de 84,1%. Também em 2018, o processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação foi redesenhado, com o objetivo de melhor adequá-lo às necessidades do TRT e de aumentar a eficiência das ações de segurança da Informação.

Indicador	2015	2016		2017		2018	
	Coleta base	Meta	Coleta	Meta	Coleta	Meta	Coleta
(1) Treinamento e conscientização em SI - Percentual de usuários treinados	N/A	10%	7,18%	15%	18,89%	25%	23,96%
(2) Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI	26,10%	0%	11,50%	0%	0%	0%	0%
(3) Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)	69,35%	72%	71,73%	74%	85,15%	76%	85,15%
(4) Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de conformidade (SGSI)* <i>* em 2018 o indicador foi descontinuado uma vez que foi alcançado um índice satisfatório de conformidade.</i>	84,44%	90%	92%	95%	94,44%	-	-
(5) Percentual de incidentes de SI registrado - origem interna (redução)	55,60%	20%	42,10%	35%	65,40%	35%	53,30%
(6) Percentual de controles obrigatórios e mandatórios efetivamente implementados, definidos no SGSI, na Declaração de Aplicabilidade da ISO 27002:2013* <i>* esse indicador foi descontinuado em 2018 pois os controles deixaram de ser classificados como obrigatórios e mandatórios.</i>	-x-	-x-	64%	67%	82,42%	-	-

## 1.2.2. Planejamento e Gestão das Contratações

### 1.2.2.1 Contratações 2018

Em 2018 foram realizados diversos processos de contratações para a manutenção e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta a operação do Tribunal, considerando, especialmente, o aumento da demanda relacionada ao Processo Judicial Eletrônico-PJe e sua criticidade para a prestação jurisdicional. Dentre as contratações, destacam-se a renovação de 1.750 microcomputadores, 1.984 monitores LED, 333 notebooks para os magistrados, Pregão Eletrônico para solução de otimização de rede destinada à melhoria da qualidade e desempenho da comunicação das unidades do interior, firewall de internet para o aprimoramento da segurança da informação e Registro de Preços para aquisição de servidores para o interior do Estado com armazenamento adicional para atender ao videomonitoramento dos prédios, ação concluída em 2019, além de equipamentos, serviços e *softwares* utilizados na infraestrutura tecnológica do Tribunal. Ao todo, foram gerenciados 8 processos de contratação por Pregão, 6 participações em registros de preços, 1 adesão a registro de preços, 19 aditivos contratuais e 18 dispensas de licitação.

Em dezembro de 2018 havia 154 contratos vigentes na SETIC.

## 1.2.2.2 Execução Orçamentária 2018



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho da 4ª Região

### ORÇAMENTO DE TIC PARA 2018

Data Atualização: 31/12/2018

Código	Despesa	Orçamento TRT4 - AC-IT EXECUTADO 31/12/2018			Verba Descentralizada - MGSS / MSNTI EXECUTADO 31/12/2018			
		Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total
<b>33 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.814</b>	<b>56.187</b>	<b>58.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 90 30 17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.814</b>	<b>56.187</b>	<b>58.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Suprimento de Fundos	0	0	0	0	0	0	0
2	Fitas LTO	0	38.249	38.249	0	0	0	0
88	Mouse Ortopédico	0	0	0	0	0	0	0
98	Baterias para ultrabooks	0	0	0	0	0	0	0
79	Cordões Fibra Óptica	0	7.750	7.750	0	0	0	0
91	Abastecimento diesel geradores	1.814	3.698	5.513	0	0	0	0
99	Fone de ouvido Headset USB mono	0	8.489	8.489	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 90 35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>42.759</b>	<b>443.619</b>	<b>486.378</b>	<b>146.637</b>	<b>34.080</b>	<b>19.283</b>	<b>200.000</b>
<b>33 90 35 04</b>	<b>CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>42.759</b>	<b>443.619</b>	<b>486.378</b>	<b>146.637</b>	<b>34.080</b>	<b>19.283</b>	<b>200.000</b>
3	Consultoria Zabbix	0	7.395	7.395	0	0	0	0
4/5	Consultoria Jboss / PostgreSQL	0	10.038	10.038	146.637	34.080	19.283	200.000
6	Consultoria Red Hat	0	14.905	14.905	0	0	0	0
7	Consultoria Microsoft	0	3.322	3.322	0	0	0	0
8	Consultoria TSM	7.930	0	7.930	0	0	0	0
9	Consultoria VMware	0	0	0	0	0	0	0
10	Consultoria Citrix	0	21.285	21.285	0	0	0	0
11	Consultoria Google	0	0	0	0	0	0	0
12	Consultoria Moodle	0	0	0	0	0	0	0
13	Consultoria TraceGP	0	7.084	7.084	0	0	0	0
14	Consultoria Gartner	13.746	267.390	271.135	0	0	0	0
83	Consultoria solução de indexação de conteúdo	0	0	0	0	0	0	0
89	Consultoria BI Qlik	21.084	122.250	143.333	0	0	0	0
<b>33 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.025</b>	<b>62.990</b>	<b>68.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Manutenção Centrais Telefônicas	5.025	59.335	64.360	0	0	0	0
104	Associação do TRT junto à SUCESU	0	2.179	2.179	0	0	0	0
55	Assinatura Software PLEO	0	1.476	1.476	0	0	0	0
<b>33 90 40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	<b>283.520</b>	<b>2.412.253</b>	<b>2.695.773</b>	<b>123.480</b>	<b>197.193</b>	<b>2.809.955</b>	<b>3.130.628</b>
<b>33 90 40 07</b>	<b>MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES</b>	<b>1.251</b>	<b>235.873</b>	<b>237.124</b>	<b>0</b>	<b>57.678</b>	<b>883.921</b>	<b>941.599</b>
15	Manutenção de softwares Oracle	0	0	0	0	48.819	540.687	587.506
16	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	0	0	0	0	0	76.226	76.226
17	Manutenção Software SIABI - Biblioteca	0	16.203	16.203	0	0	0	0
18	Manutenção do Software de gestão de Projetos	0	71.987	71.987	0	0	0	0
19	Manutenção Software BI (SAP)	0	88.974	88.974	0	0	0	0
20	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	0	0	0	0	0	0	0
21	Manutenção Solução de Seg.da Informação - Risk Manager	0	0	0	0	0	41.576	41.576
22	Manutenção Citrix	0	0	0	0	0	0	0
23	Manutenção Antivírus	0	0	0	0	10.858	130.299	141.158
24	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	1.251	51.352	52.603	0	0	95.133	95.133
64	Subscrições de software JBOSS	0	0	0	0	0	0	0
102	Subscrição Software Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level	0	1.300	1.300	0	0	0	0
54	Manutenção Software Netscaler	0	5.650	5.650	0	0	0	0
	Manutenção Software Orçamento e Controle de Obras	0	0	0	0	0	0	0
92	Renovação do Cisco Prime	0	2.407	2.407	0	0	0	0
<b>33 90 40 10</b>	<b>SUPORTE A USUÁRIOS DE TI</b>	<b>0</b>	<b>100.733</b>	<b>100.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Terceirização helpdesk	0	100.733	100.733	0	0	0	0
<b>33 90 40 09</b>	<b>HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>	<b>0</b>	<b>467.595</b>	<b>467.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	0	467.595	467.595	0	0	0	0
<b>33 90 40</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.</b>	<b>147.226</b>	<b>99.236</b>	<b>246.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Serviços SERPRO - HOD, InfoConv	119.081	74.349	193.430	0	0	0	0
28	Certificado de assinatura de código	0	0	0	0	0	0	0
29/110	Certificados Digitais Sistemas	570	0	570	0	0	0	0
30	Certificado Digital para servidores e magistrados	27.320	9.400	36.720	0	0	0	0
31	Acesso GID - DETRAN	255	2.884	3.139	0	0	0	0
32	Serviços diversos de pequeno valor	0	550	550	0	0	0	0
81	Registro Anual da Base de Roteamento	0	0	0	0	0	0	0
84	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA	0	859	859	0	0	0	0
103	Assinatura software Prezi	0	0	0	0	0	0	0
104	Associação do TRT junto à SUCESU	0	0	0	0	0	0	0
85	Aluguel Software Monitoramento de Alarmes	0	7.980	7.980	0	0	0	0
69	Instalação Impressora de Crachás	0	814	814	0	0	0	0
87	Sistema CFTV	0	2.400	2.400	0	0	0	0
94	Filtro, instalação e revisão do sistema de detecção e combate a incêndio do CPD2	0	0	0	0	0	0	0



**ORÇAMENTO DE TIC PARA 2018**

Data Atualização: 31/12/2018

Código	Despesa	Orçamento TRT4 - ACJJ EXECUTADO 31/12/2018			Verba Descentralizada - MGSS / MSNTI EXECUTADO 31/12/2018			
		Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>33 90 40 12</b>	<b>DE TIC</b>	<b>95.166</b>	<b>363.346</b>	<b>458.512</b>	<b>0</b>	<b>18.470</b>	<b>723.321</b>	<b>741.792</b>
33	Manutenção PDDE	0	49.920	49.920	0	0	0	0
34	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e corretiva	0	25.200	25.200	0	0	0	0
35	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	95.166	288.226	383.391	0	0	0	0
36	Serviço de manutenção preventiva de datacenters - sala-cofre e CPD2	0	0	0	0	14.870	500.810	515.480
37	Manutenção Tape Library	0	0	0	0	0	0	0
38	Manutenção Proxy	0	0	0	0	3.800	59.242	63.042
39	Manutenção Blade	0	0	0	0	0	163.269	163.269
41	Manutenção VTL	0	0	0	0	0	0	0
62	Reparo e Manutenção Anel Fibra Óptica	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 90 40 13</b>	<b>COMUNICACAO DE DADOS</b>	<b>39.876</b>	<b>1.145.470</b>	<b>1.185.346</b>	<b>123.480</b>	<b>121.045</b>	<b>1.202.713</b>	<b>1.447.238</b>
42	Link Internet 200 Mbps	4.470	48.940	51.411	0	0	0	0
43	Link Internet Redundante 200 Mbps	0	52.241	52.241	0	0	0	0
44	Acesso à Internet para notebook	10.240	112.612	122.852	0	0	0	0
45	Link WAN João Telles	0	25.200	25.200	0	0	0	0
46	Link ADSL SETIC	883	4.709	5.572	0	0	0	0
47	Link interligação prédios Santa Rosa	0	1.285	1.285	0	0	0	0
48	Rede WAN principal (OI/CLARO)	0	0	0	123.480	121.045	1.202.713	1.447.238
49	Rede WAN redundante (AVATO)	24.303	902.603	926.805	0	0	0	0
86	3º Link de Internet	0	0	0	0	0	0	0
95	Links WAN unidades adm	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 90 92</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>16.467</b>	<b>16.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5, 27, 43, 100	Despesas de Exercícios Anteriores	0	16.467	16.467	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>33 90 93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Indenizações e Restituições	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>44 90 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aplicações Diretas	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>44 90 40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	<b>0</b>	<b>64.662</b>	<b>64.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.921</b>	<b>219.921</b>
<b>44 90 40 05</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>	<b>0</b>	<b>64.662</b>	<b>64.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.921</b>	<b>219.921</b>
50	Licenças Microsoft Server	0	0	0	0	0	0	0
51	Licenças Vmware	0	0	0	0	0	0	0
52	Licenças ferramenta de Data Discovery (Qlik)	0	0	0	0	0	0	0
53	Softwares diversos para atualização do parque	0	0	0	0	0	0	0
54	Software Netscaler	0	0	0	0	0	0	0
55	Software PLEO	0	0	0	0	0	0	0
85	Software Monitoramento de Alarmes	0	0	0	0	0	0	0
87	Sistema CFTV	0	9.120	9.120	0	0	0	0
90	Monitoramento PJ-e	0	31.853	31.853	0	0	219.921	219.921
100	Licença de ramal IP com protocolo SIP	0	3.792	3.792	0	0	0	0
101	Licença Software Powershell Studio 2018	0	0	0	0	0	0	0
92	Renovação Cisco Prime	0	2.059	2.059	0	0	0	0
	Software Orçamento e Controle de Obras	0	15.176	15.176	0	0	0	0
107	Software Corel	0	1.745	1.745	0	0	0	0
108	Software Camtasia	0	917	917	0	0	0	0
106	Software GV- Recording Server	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>44 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.179.839</b>	<b>4.071.443</b>	<b>5.251.282</b>	<b>0</b>	<b>91.875</b>	<b>9.335.216</b>	<b>9.427.091</b>
<b>ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>19.640</b>	<b>2.337.906</b>	<b>2.357.546</b>	<b>0</b>	<b>91.875</b>	<b>6.870.625</b>	<b>6.962.500</b>
56	Renovação do parque de micros	0	0	0	0	91.875	5.330.600	5.422.375
57	Renovação Tvs aeroportua	0	0	0	0	0	0	0
58	Renovação Workstations CFTV que vencem em 2018	0	0	0	0	0	0	0
65	Notebooks	0	37.000	37.000	0	0	1.540.125	1.540.125
66	Docking Station para Notebooks	0	0	0	0	0	0	0
67	Scanners	19.640	113.490	133.130	0	0	0	0
68	Impressoras coloridas	0	0	0	0	0	0	0
69	Impressora de crachás funcionais	0	7.000	7.000	0	0	0	0
70	Impressoras Multifuncionais	0	0	0	0	0	0	0
71	Impressora plotter SEMPRO	0	0	0	0	0	0	0
72	Monitores	0	2.180.416	2.180.416	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
<b>EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>1.160.199</b>	<b>1.731.209</b>	<b>2.891.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.464.591</b>	<b>2.464.591</b>
59	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0	0	0	0	0	0	0
60	Renovação de otimizadores WAN (Aceleradores)	1.160.199	1.688.297	2.848.495	0	0	0	0
61	Renovação de switches LAN interior	0	0	0	0	0	1.709.591	1.709.591
62	Expansão Armazenamento Servidores Interior	0	0	0	0	0	0	0





**ORÇAMENTO DE TIC PARA 2018**

Data Atualização: 31/12/2018

Código	Despesa	Orçamento TRT4 - AC.II EXECUTADO 31/12/2018			Verba Descentralizada - MGSS / MSNTI EXECUTADO 31/12/2018			
		Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total
63	Expansão da solução de servidores blades	0	0	0	0	0	0	0
74	Racks Foro POA e interior – switches/telecom	0	7.018	7.018	0	0	0	0
75	Servidores de Rede Interior	0	0	0	0	0	0	0
78	Memória para servidores	0	0	0	0	0	0	0
77	Firewall	0	0	0	0	0	755.000	755.000
78	Roteadores para Acesso à Internet	0	0	0	0	0	0	0
79	Cordões de Fibra Óptica	0	0	0	0	0	0	0
80	Transceivers 10Gbps Switches POA	0	9.122	9.122	0	0	0	0
98	Central Telefônica de Gualaíba	0	7.456	7.456	0	0	0	0
	Renovação Solução de Backup	0	772	772	0	0	0	0
97	Nobreaks de médio porte para Gualaíba e reservas	0	20.544	20.544	0	0	0	0
	<b>EXPANSÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Projetores multimídia	0	0	0	0	0	0	0
106	Controle de Acesso Integrado de Pessoas e Veículos	0	0	0	0	0	0	0
93	Tablet para Segurança	0	2.328	2.328	0	0	0	0
<b>44 90 92</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
		<b>1.512.956</b>	<b>7.127.620</b>	<b>8.640.576</b>	<b>270.117</b>	<b>323.148</b>	<b>12.384.376</b>	<b>12.977.641</b>

### 1.3. Estrutura organizacional e macroprocessos

Ainda em conformidade com o artigo 12 da Resolução CNJ 211/15, foram formalizados em 2018, os seguintes processos:

- Processo de Gerenciamento de Conhecimento (Portaria nº 7.310/2018), que dispõe sobre as atividades de criar, compartilhar, usar e gerenciar os conhecimentos envolvidos nas resoluções dos chamados de suporte de TIC.
- Processo de Homologação e Implantação de Sistemas (Portaria nº 7.309/2018), que padroniza as atividades envolvendo a implantação de um software ou versão de um software a fim de diminuir o impacto ao usuário final.

### 1.4. Pessoas

#### 1.4.1. Força de trabalho

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com 116 servidores, distribuídos da seguinte forma:

Unidade	Número de servidores 2017	Número de servidores 2018
Direção da Secretaria	2	1
Coordenadoria de Atendimento a	35	30

Usuários		
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	40	39
Coordenadoria de Gestão de TIC	9	11
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	29	30
Coordenadoria de Implantação de Sistemas	5	5

Segundo os critérios da Resolução CNJ 211/2015 a força mínima de trabalho, a qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados, para o um Tribunal do porte do TRT da 4 Região, é de 187 pessoas. Desse contingente, pelo menos 122 pessoas devem pertencer ao quadro permanente do órgão. O cálculo detalhado está apresentado a seguir:

$$\text{TURTic} = \text{TUInt} + 0,1 \times \text{TUExt}$$

$$\text{TURTic} = 3.718 + 0,1 \times 59.257 = 9.643,7$$

onde:

$$\text{TURTic} = \text{N}^\circ \text{ total de usuários de TIC: } \mathbf{9.643,7}$$

$$\text{TUInt} = \text{N}^\circ \text{ de usuários internos: } \mathbf{3.718}$$

TUExt = N° de usuários externos: **59.257** (N° de advogados, procuradores, assistentes de procuradoria e peritos que fizeram alterações no banco de dados do PJe entre 15/9/2015 e 15/9/2017).

Critérios da Res CNJ 211/2015:

Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) =  $\text{TURTic} \times 0,01 + 100 = \mathbf{196}$

Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente:  $\text{TURTic} \times 0,0065 + 65 = \mathbf{127}$   
**servidores**

Dessa forma, para atendimento à Resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabelece a força de trabalho mínima na TI, **há um déficit de 80 servidores.**

Cumprir citar que, em decorrência do corte orçamentário, o contrato de *help desk*, que aportava mais 16 pessoas à força de trabalho de TIC foi substituído por outro com apenas quatro pessoas. Tal redução de pessoal prejudicou a manutenção do serviço de atendimento a usuários e impactou negativamente no cumprimento dos acordos de nível de serviço definidos. No entanto, novos processos na Seção de Atendimento a Usuários permitiram, em 2018, restabelecer um bom nível de serviço, tendo aumentado o prazo de início de atendimento de 10 para 20 minutos.

#### 1.4.2. Gestão da Capacitação da equipe de TIC

A SETIC realiza a gestão da qualificação dos servidores promovendo e acompanhando, anualmente, plano de capacitação que permita o contínuo desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais identificadas como necessárias

para o cumprimento de seu papel institucional.

O Plano Anual de Capacitação dos servidores da SETIC é composto de:

- Quadro com Perfis Técnicos da SETIC: Planilha com a descrição de todos os perfis técnicos existentes na secretaria, composto da descrição das principais atribuições e dos conhecimentos necessários para desempenho das atividades realizadas por cada perfil de profissional. O levantamento dos perfis técnicos da SETIC é mantido com o apoio dos gestores da SETIC, e está de acordo com as atribuições formais das respectivas unidades da Secretaria.
  
- Quadro com Mapeamento das Competências dos Servidores da SETIC: Planilha onde cada servidor é relacionado aos níveis de capacitação necessários para execução das atividades relacionadas a cada perfil técnico que desempenha. A análise dos perfis técnicos e níveis de capacitação do servidor é mantida com o apoio dos gestores da SETIC. Os níveis de capacitação são avaliados como “Capacitado”, “Aprimorar/Atualizar Capacitação” ou “Iniciar Capacitação”.
  
- Lista de Treinamentos Previstos para 2019: Planilha com a descrição dos treinamentos previstos para o ano de 2019, composta das seguintes informações: dados do servidor, nome do treinamento, relação com o perfil técnico, valores estimados, carga horária prevista, número de vagas, possíveis fornecedores. A escolha dos treinamentos foi realizada com o apoio dos servidores e respectivos gestores da SETIC, observando os seguintes critérios:
  - Os cursos planejados para cada servidor deverão estar relacionados a pelo menos um dos seus perfis técnicos;
  - Atingir os indicadores estabelecidos no Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015) relacionados a seguir:
    - 75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC;
    - 60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos técnicos de TIC.
  - Os servidores realizarão entre 40 e 80 horas de treinamento por ano, visando a capacitação contínua de todos os servidores da SETIC e de modo que o tempo afastado do trabalho para capacitação não comprometa as atividades da secretaria. Cabe referir que algumas áreas demandam maior volume de treinamento devido às peculiaridades e tecnologias utilizadas pela equipe, e que alguns servidores realizarão mais que 80 horas de treinamento por estarem

envolvidos em projetos específicos que demandam maior conhecimento.

- Quadro com Síntese do Plano de Capacitação: Planilha com resumo dos dados dos treinamentos previstos por setor e por participantes, composta das seguintes informações: número de vagas a serem contratadas, valor estimado e carga horária. As informações constantes do quadro síntese são utilizadas pelas chefias da secretaria para a gestão da capacitação dos seus servidores.

O Plano de Capacitação de 2019 encontra-se no ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019

### **Resultados obtidos em 2018**

<b>Descrição</b>	<b>Treinamentos Planejados</b>	<b>Treinamentos Executados conforme o PAC</b>	<b>Treinamentos Incluídos</b>
<b>Vagas</b>	342	326	29
<b>Horas</b>	6790	5514	722
<b>Valores</b>	R\$404.674,82	R\$265.113,27	R\$80.496,23

O planejamento anual da capacitação da SETIC permite a gestão da qualificação dos servidores, com o objetivo de assegurar o alinhamento entre os treinamentos realizados e os objetivos da SETIC e da Instituição. A vinculação dos cursos com os perfis técnicos de cada servidor assegura o desenvolvimento pessoal e a contínua especialização dos times.

### **Indicadores de execução do Plano Anual de Capacitação**

- Mais de 93% dos servidores realizaram algum treinamento durante o exercício de 2018;
- A carga horária média realizada pela Secretária é de aproximadamente 52 horas por servidor.

O relatório de execução do Plano de Capacitação de 2018 encontra-se no ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018 - EXECUÇÃO

## 2. CATÁLOGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS

### 2.1. Catálogo de Sistemas

#### 2.1.1. Sistemas desenvolvidos total ou parcialmente pela equipe de desenvolvimento do TRT e sistemas nacionais da Justiça do Trabalho

Os seguintes sistemas tiveram seus nomes atualizados: AutoCLE para **AutoCCLE**, aplicação para automatizar o cadastramento de processos no PJe nas fases de conhecimento, liquidação e execução; FPP para **FAE**, ferramenta de apoio à execução; IARR para **Apoia**, ferramenta de apoio com uso de inteligência artificial.

A seguir estão listados os sistemas em uso no TRT4, incluídos no catálogo em 2018.


Nome	Descrição simples	Classificação	Situação	Área	Equipe Desenv	Tecnologia	Banco Dados
Cadastro de Informações das Unidades Judiciárias	Sistema para registro de informações administradas por cada unidade judiciária, como plantões e feriados.	Operacional	Normal	Área Judiciária	SADM	APEX	Oracle

#### 2.1.2. Sistemas de terceiros


	Nome	Descrição simples	Público Alvo	Estratégico	Classificação	Fabricante	Banco de Dados
1	Qlik Sense	Solução de análise e descoberta de dados, com	Público interno e Externo	Sim	Administrativo	Qlik	N/A

### 2.2. Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços

A seguir está apresentado o gráfico com o desempenho da Central de Serviços de TIC em 2018, considerando os acordos de níveis de serviço estabelecidos.

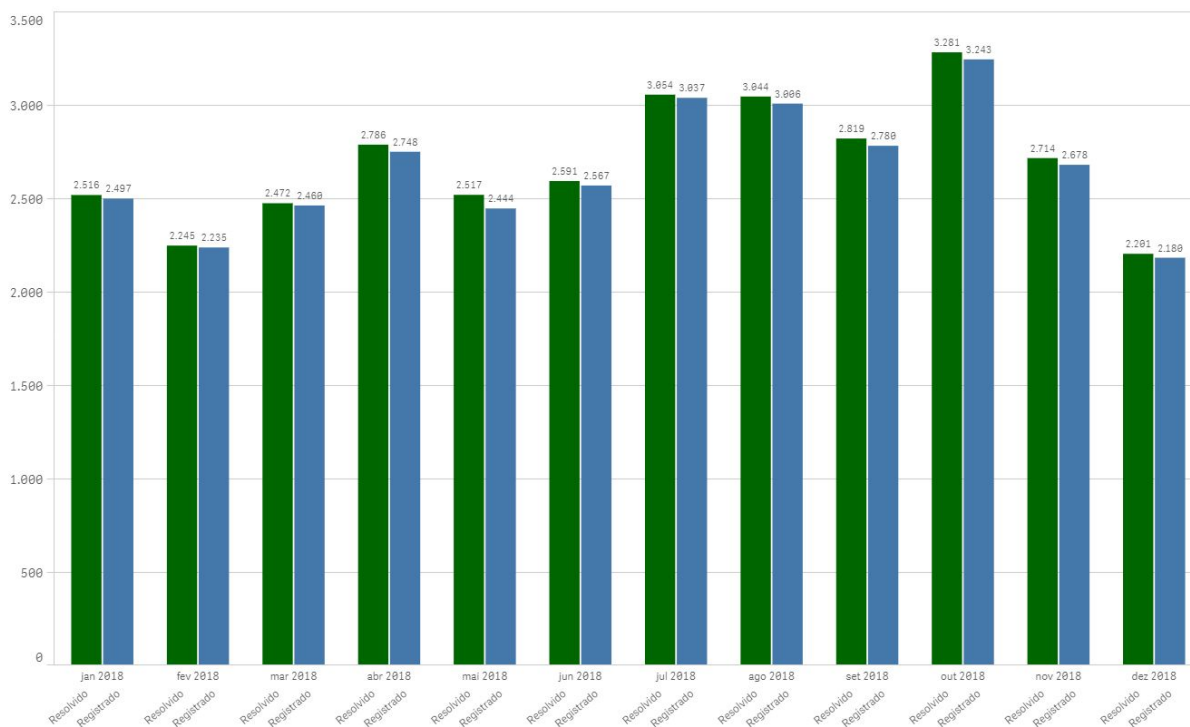

Em 2018 foram registrados 31.834 chamados.

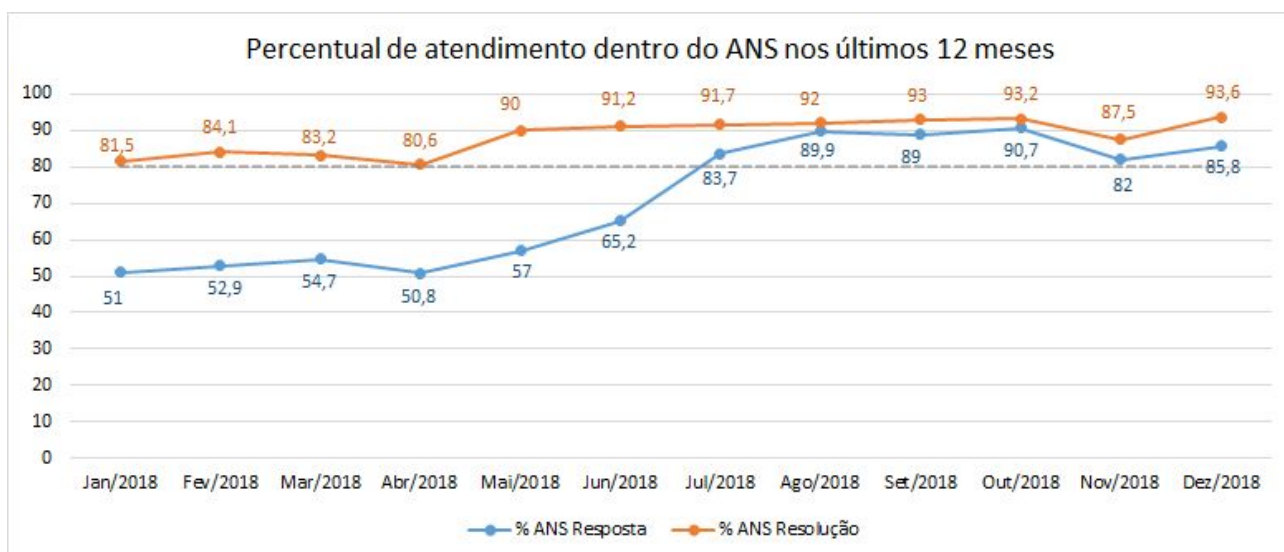

**ANS:** Acordo de Nível de Serviço - Prazos de resposta e atendimento acordados entre a SETIC e a Comissão de Informática (TRT).

**% ANS Resposta:** Percentual de demandas cujo início do atendimento foi inferior aos 20 minutos acordados, sendo considerado para tanto, o tempo transcorrido entre o registro do chamado pelo usuário e a tomada de ciência pela Seção de Atendimento a Usuários.

**% ANS Resolução:** Percentual de demandas cujo tempo de resolução (finalização da demanda) foi inferior ao prazo acordado para demandas de cada serviço.

### 3. AVALIAÇÃO DO PDTIC 2018

#### 3.1. Projetos concluídos em 2018 - Resultados

<b>Projeto</b>	<b>52 - Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)</b> Implantação de uma nova infraestrutura de gerenciamento de rede nos Foros do interior do estado, visando padronizar e concentrar os serviços de gerenciamento e armazenamento de dados (servidores de rede), switches, roteadores, aceleradores, modem e no-break. Serão instalados Racks em todos os Foros, utilizando equipamentos compatíveis para neles serem instalados, como servidores e no-breaks para rack.
<b>Resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Padronização da estrutura física que comporta os equipamentos de gerenciamento e armazenamento de dados, switches, roteadores, aceleradores, modem e no-break, das unidades do interior do estado, minimizando a ocorrência de indisponibilidade e acelerando a resolução de problemas nessas instalações</li></ul>
<b>Projeto</b>	<b>202 - Atualização de infraestrutura do interior - renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD</b> Substituição nos CPDs dos foros do Interior, os seguintes equipamentos fora de garantia ou com garantia a vencer em 2014: comutadores de rede (switches), servidores de rede, no-breaks de CPD.
<b>Resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Redução de falhas decorrentes de equipamentos com garantia vencida</li><li>• Maior eficiência e rapidez nos reparos em equipamentos com garantia</li><li>• Maior performance decorrente da evolução tecnológica dos novos equipamentos</li></ul>
<b>Projeto</b>	<b>210 - Ampliação da autonomia dos switches - Capital e Interior</b> Conexão a no-breaks de todos os switches de acesso do Complexo Praia de Belas; Conexão a-breaks, todos os switches de acesso nas unidades que já utilizam o PJe; Conexão a no-breaks, todos os switches de acesso do TRT4; Priorização da conexão nos switches de acesso dos foros que possuem PJe.
<b>Resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumento da autonomia de uso da rede em caso de falta de energia</li></ul>
<b>Projeto</b>	<b>391 - Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)</b> Adequada disponibilidade dos serviços de TIC.
<b>Resultados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecimento contínuo de energia elétrica aos datacenters do TRT, de modo a garantir a disponibilidade de serviços de TIC</li><li>• Grupos moto geradores alimentando os dois datacenters do TRT4 exclusivamente</li></ul>
<b>Projeto</b>	<b>438 - Automatização do cadastro de acessos aos sistemas</b>

	Implementação um sistema automatizado e centralizado para gestão das credenciais de acessos aos principais sistemas ofertados pela SETIC.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agilidade no atendimento a chamados com pedidos de acessos aos sistemas (alcançado parcialmente)</li> <li>● Maior confiabilidade no cadastro de acessos aos sistemas (alcançado parcialmente)</li> <li>● Maior facilidade para futuras integrações ao cadastro de acesso aos sistemas</li> <li>● Relatório de usuários por setor e seus respectivos privilégios de acesso aos sistemas: InFor, NovaJus4, Correio eletrônico e ADMEletrônico</li> </ul>
Projeto	<p><b>452 - SGSI - Ciclo 2017</b></p> <p>Novo ciclo do SGSI, com vista ao aperfeiçoamento dos controles e procedimentos relativos à segurança da informação, melhoria do processo, e a redução dos riscos a um nível aceitável, a ser definido pela Administração do TRT.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Redução dos riscos identificados no novo ciclo a um nível aceitável pela Administração</li> <li>● Melhorias no processo e na maturidade de Segurança da Informação no TRT</li> <li>● Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências dos órgãos de controle externo</li> <li>● Manutenção da conformidade com a ISO 27001 e com as orientações/exigências do controle interno</li> </ul>
Projeto	<p><b>453 - Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017</b></p> <p>Aquisição e instalação de uma solução de backup em disco (D2D), com capacidades inicial de 170 TB de área útil e no mínimo 400 TB de expansão, adequadas ao volume de dados crescente do TRT4. Além de uma Tape Library que comporte a tecnologia LT07, o que garante aumento de área de armazenamento e reduz o tempo para restabelecer os sistemas em caso de desastre.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acompanhamento do crescimento do volume de dados do PJe na camada de backup/restore rápidos</li> <li>● Garantia da integridade dos dados em backup no caso de indisponibilidade de uma das VTLs ou datacenters</li> <li>● Redução de custo, espaço físico e tempo de operação para a realização de backups</li> <li>● Aumento da capacidade do equipamento (VTL e TapeLibrary), possibilitando a realização de mais backups na mesma estrutura</li> <li>● Redução da dependência da solução de backup atual (TSM), abrindo a possibilidade de contratação de outras soluções de gerenciamento de backup</li> </ul>
Projeto	<p><b>454 - Links WAN - 2017</b></p> <p>Contratação de uma nova rede WAN até julho/2017 para interligação de todas as unidades do Tribunal na capital e interior, em substituição à atual rede contratada junto à operadora OI, cujo contrato completa 5 anos e não pode mais</p>



	<p>ser prorrogado. Realizar o Registro de Preços da rede JT para atender também aos demais Tribunais da Justiça do Trabalho por tratar-se de necessidade comum a todos os Tribunais que foram co-partícipes do processo de contratação da rede e estão com prazo de vencimento próximas à do TRT da 4ª Região.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Manter a média atual de disponibilidade de WAN (em medição até 30/06/2019)</li> </ul>
Projeto	<p><b>473 - Atualização da central telefônica de porto alegre</b></p> <p>Atualização tecnológica da central telefônica de Porto Alegre, com aquisição de equipamento a ser instalado em nova topologia: com hardware distribuído entre o prédio sede e foro Trabalhista interligados pelo anel de fibra ótica.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Redução do risco de indisponibilidade, em função de hardware e software estarem atualizados</li> <li>● Redução do risco de falha na comunicação entre Sede e Foro, com a adoção do anel de fibra como meio de comunicação</li> <li>● Ganho de produtividade com a redução das chamadas indesejadas (chamadas de telemarketing) (mais de 150 números adicionados à blacklist)</li> <li>● Aumento da oferta de portas analógicas, possibilitando a expansão do número de ramais. A adição de 64 portas nos dará uma maior folga para o atendimento as demandas futuras</li> <li>● Redução do risco de indisponibilidade dos aparelhos (terminais) digitais - em operação há 12 anos - com a substituição por novos aparelhos IP</li> <li>● Incorporação da tarifação das centrais telefônicas do interior no sistema de tarifação já utilizado pela telefonia para a capital</li> <li>● Redução da carga de trabalho das telefonistas com a implantação de uma solução de resposta audível para direcionamento automático do público externo para as áreas mais demandadas</li> </ul>
Projeto	<p><b>474 - Ferramenta de pesquisa patrimonial</b></p> <p>Possibilitar a visualização, de forma integrada, das informações referentes à execução das reclamadas em ações trabalhistas, abrangendo processos físicos e eletrônicos de todos os Foros do TRT da 4ª Região, por meio de ferramenta web que consulte as bases de dados dos sistemas inFOR e PJe-JT.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Maior visibilidade das diligências já realizadas</li> <li>● Redução do retrabalho dos oficiais de justiça e dos servidores das secretarias das Varas na fase de execução</li> <li>● Aumento do índice de processos arquivados sem dívida</li> <li>● Redução da taxa de congestionamento na fase de execução</li> <li>● Redução do tempo médio de tramitação na fase de execução dos processos</li> </ul>
Projeto	<p><b>477 - Ferramenta para análise de recursos de revista</b></p> <p>Estudo de novas tecnologias e desenvolvimento de protótipo de ferramenta de apoio à decisão que agilize o processo de análise da admissibilidade dos recursos de revista, facilitando a verificação dos seguintes requisitos básicos: guias de pagamento, trechos do acórdão citados no recurso e tempestividade.</p>

Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redução de 10,98% no tempo para análise dos pressupostos extrínsecos .</li> </ul>
Projeto	<p><b>482 - Relatório de Correição Automatizado</b></p> <p>Criar um relatório automatizado que gere parte da ata de correição, a partir dos dados do e-Gestão, RH e Metas CNJ, disponíveis atualmente no BI SAP.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celeridade na geração do relatório</li> <li>• Maior segurança na obtenção das informações</li> </ul>
Projeto	<p><b>495 - Firewall 2018</b></p> <p>Substituição do firewall de borda atualmente utilizado.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solução de firewall operando com alta disponibilidade e perfeita configuração, crítica para isolar as redes e ativos internos do tribunal do acesso não autorizado a partir da internet.</li> <li>• Melhoria na maturidade em segurança de redes, possibilitando controles de segurança em nível de aplicação</li> </ul>

### 3.2. Situação do portfólio de projetos aprovado em 2018

O arquivo ANEXO III - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - SITUAÇÃO DEZEMBRO 2018 apresenta a situação dos projetos no final de 2018, com indicadores de desempenho de projeto, situação das entregas, percentual de andamento e outras informações importantes para a avaliação do andamento dos projetos. O relatório é emitido mensalmente pelo Escritório de Projetos, após reunião com todos os gerentes de projetos, e é uma ferramenta gerencial de acompanhamento dos projetos do PDTIC.

### 3.3. Portfólio de Projetos 2019

O arquivo ANEXO IV - RELATÓRIO DE PROJETOS MARÇO 2019 apresenta o portfólio de projetos aprovados pelo Comitê de Governança de TIC para 2019.

## 4. PLANO DE CONTRATAÇÕES – 2019

O plano de contratações encontra-se no ANEXO V – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2019

## ANEXOS

ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019

ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018 - EXECUÇÃO

ANEXO III - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - SITUAÇÃO  
DEZEMBRO 2018

ANEXO IV - RELATÓRIO DE PROJETOS MARÇO 2019

ANEXO V – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2019

## ANEXO I – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**PERFIS TÉCNICOS**

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
GERAL	GERENTE DE PROJETO	Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e reportar seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade, gerenciar os custos (quando houverem aquisições).	PMI/PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na STI
			Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
			Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação
			Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e comunicar-se com o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos, controlar os SLAs. FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.	Legislação sobre licitações públicas
			Gestão e Fiscalização de Contratos
GERAL	GESTOR	Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos	Competências Gerenciais
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, baseado nas demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, nos conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.	Instrutoria pedagógica
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais. Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades; Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais; Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio; Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação; Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais; Participar de investigações de incidentes de segurança da informação; Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente computacional.	Controles de SI (ABNT NBR 27002)
			Incidentes de Segurança da Informação
			Auditoria e Forense digital
			Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças
			Segurança em Redes
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Participar do planejamento das contratações de TIC	Legislação sobre licitações públicas
			Resolução CNJ 182/2013
SETIC	SERVIDOR SETIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria	Comunicação
			Noções Gerais de Tecnologia da Informação
			Relacionamento interpessoal
			Redação
			Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)
			Inglês técnico
SETIC	SECRETÁRIA	Recepcionar, atender ligações/fax, cuidar das correspondências e demandas administrativas de todas as unidades e servidores da Secretaria; administrar a agenda das salas de reuniões; administrar relatórios de patrimônio da Secretaria e encaminhar para consertos os bens móveis; produzir relatórios diversos; solicitar orçamentos diversos junto a empresas; registro e encaminhamento de documentos para as diversas unidades do TRT; orientar e encaminhar documentação dos cursos realizados pelos servidores da Secretaria; solicitar materiais em geral para o uso da Secretaria como material de almoxarifado e bombonas de água; administrar a Softeca; função de Webmaster da Secretaria de Informática, respondendo e encaminhando solicitações e observações de usuários externos; providenciar e encaminhar a documentação dos Certificados Digitais de Aplicação da ACCAIXA-JUS para equipamentos de rede; responder as caixas eletrônicas dos sistemas PRECAD e NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO e encaminhar as solicitações de usuários externos; verificar diariamente o Malote Digital do TST	Redação
			Comunicação
			Sistemas utilizados no TRT
			Br.Office
			Técnicas de Atendimento ao Público
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do planejamento estratégico e dos indicadores	Governança de TI
			COBIT
			ITIL
			MPS.BR
			Planejamento Estratégico
			Gestão de Riscos
			BI
			Segurança da Informação
Mapeamento de Processos			
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Gestão de TIC	Conceitos de Governança de TI
			Sistema de Gestão de SI (ABNT NBR 27001:2013)
			Controles de SI (ABNT NBR 27002:2013)
			Gestão de Segurança da Informação
			Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
			Gestão de Riscos

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**PERFIS TÉCNICOS**

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CGTIC	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Elaborar proposta do Plano Diretor de Segurança da Informação e gerir políticas, planos de continuidade de negócio e riscos com base nas definições estratégicas estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação; prestar apoio técnico especializado às demais áreas da SETIC e ao Comitê; zelar pela manutenção das ferramentas de gestão da segurança e pelos registros de monitoramento, realizar auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	Gestão de Continuidade de Negócio
			Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças
			Segurança em Redes
			Auditoria e Forense digital
			Noções em Legislações e Regulamentações
			Noções de Computação em Nuvem
			Noções de DevSecOps
			Noções de Desenvolvimento Seguro
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária de TI	Conhecimento em orçamento público e normas associadas
			Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK
CGTIC	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a conformidade destes com os planos aprovados, manter a metodologia de gerenciamento de projetos e garantir sua utilização no planejamento dos projetos, consolidar informações de portfólio para acompanhamento pela Administração do TRT e Direção de TI	Metodologia de gestão de projetos adotada na STI
			Ferramenta de gestão de projetos e portfólios utilizada no Tribunal (TRACE)
			BSC
			SCRUM
			COBIT
			MPS.BR
			Gestão por objetivos e resultados - OKR
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do processo de contratação e gestão de contratos de TI. Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.	Legislação sobre licitações públicas
			Técnicas de Negociação
			IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013
			Gestão e Fiscalização de contratos
CGTIC	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar suporte aos usuários da ferramenta	Noções em PMBOK
			SCRUM
			MPS.BR
			Ferramenta de gestão de Projetos (TRACE)
			Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)
			Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC
CIS	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do planejamento estratégico e dos indicadores	BI
			Teste de Unidade
	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão dos softwares a serem implantados.	Teste de Integração
			Automatização de Testes
	ANALISTA DE NEGÓCIOS	Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com os objetivos estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e eficazes.	Segurança da Informação para profissionais de TI
			Sistema de processo eletrônico
	DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD	Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas áreas de negócio do Tribunal.	BABOK - Business Analysis Body of Knowledge
			Noções de Direito Processual do Trabalho
CAU	SERVIDOR CAU	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Gestão do conhecimento
			Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD
CAU	ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO	Solucionar eventuais paradas do sistema PJE, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento, elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	ITIL
			Ferramenta de HelpDesk
			Técnicas de Atendimento ao Público
CAU	ESPECIALISTA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de procedimentos para utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de certificados novos	Sistema de processo eletrônico
CAU	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT conforme a destinação do equipamento	Tipos de mídias e softwares relacionados
			Sistemas Operacionais Microsoft
			Sistemas Operacionais Linux
			Software envolvido na solução corporativa de comunicação
			Configuração de redes(desktop e servidor)
			LAN
			Software e configurações de dispositivos móveis
			Linguagem de programação
			Ferramentas de monitoramento e segurança
Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais			
Segurança da Informação para profissionais de TI			

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**PERFIS TÉCNICOS**

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CAU	ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES	Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas utilizados no Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das portarias de movimentação de pessoal	Ferramentas de gerência de LDAP
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas de 1º grau
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2ºGRAU	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas de 2º grau
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas Administrativos
CAU	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO	Solucionar dúvidas de usuários	Editor de texto(Writer)
			Ferramenta de e-mail
			Planilha de cálculos (Calc)
			Apresentação (impress)
CAU	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de equipamentos e softwares	Banco de Dados
			Excel
CAU	ESPECIALISTA EM HARDWARE	Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes desses equipamentos	Configuração de Equipamentos
			Manutenção de Equipamentos
			Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware
CIT	SERVIDOR CIT	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Sistemas Operacionais
			Segurança da Informação para profissionais de TI
CIT	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Instalar, clonar, configurar, atualizar e gerenciar políticas de configuração e segurança de sistemas Operacionais Desktop.	Sistemas operacionais Desktop
		Desenvolver e prestar manutenção a programas scripts.	Programação de scripts
CIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	<p>* Administrar bancos de dados: instalação, manutenção, operação, distribuição e gerenciamento de bancos no interior do estado, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados em bancos, usuários. Especialização em Oracle, Postgresql, SqlServer, mysql; replicações avançadas; Oracle Data Guard; Postgresql Standby; clusters Oracle RAC; Oracle ASM; migrações no interior e capital; ferramentas de integração e sincronização; Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management e Grid Control; tuning, metalink; Oracle APEX; etc.</p> <p>* Administrar servidores de aplicações: instalação, manutenção, operação, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados nos servidores; Java, TomCat, WebLogic.</p> <p>* Administrar soluções de backup: instalação e configuração de equipamentos, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, rede de dados, inclusão de novos backups, recuperações de dados, administração de ativos de informações (fitas magnéticas), desenvolvimento de rotidas, schedules e soluções próprias de backup (PJe). Gerenciamento de backups da capital e do interior, bancos de dados, servidores, VMs, sistema de arquivos. TSM, TSM4VE, RMAN, Tape Library, VTL.</p> <p>* Administrar servidores WEB: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos, desempenho, segurança, políticas de acesso, auditorias.</p> <p>* Atender ao Desenvolvimento e a soluções terceirizadas, suportando a criação de novos projetos, novos softwares e manutenção dos sistemas, softwares, configs e ferramentas afins: tuning, performance, Metalink, etc. Auditorias, análises de desempenho, informações e alertas aos desenvolvedores sobre gargalos, pontos críticos e técnicas de boas práticas de desenvolvimento para bancos e servidores de aplicações.</p> <p>* Administrar ou criar aplicações de monitoramentos de banco, servidores de aplicações, rede, sistemas operacionais, entre outros, tanto na capital como no interior. Divulgação de estatísticas e dados estratégicos. Zabbix, Oracle EM, Grid control, Kibana, bloqueios de robôs.</p> <p>* Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de rede, de segurança, de gerenciamento de dados e comunicação banco/storages (powerpath e afins), gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos (eRevista, eGestão, PJeCalc, Processo Digital, PJe). Desenvolvimento e gestão de sistemas próprios ou de terceiros (Siabi, SIF).</p> <p>* Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos ou softwares relativos às atribuições acima descritas.</p> <p>* Devops, infraestrutura como código, entrega contínua, docker, kubernetes, vagrant</p>	Banco de Dados Oracle (básico e avançado)
			Banco de Dados SQLSERVER (básico e avançado)
			Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado)
			Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, percona
			Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tuning, Data Guard, RMAN, Discoverer etc.)
			Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, ADC
			Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries
			Conceitos avançados de segurança de informações
			Gerenciamento e administração básica de Storage
			Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat
			Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento
			Sistemas operacionais para DBAs
			Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, DataGuard, Discoverer, mysql, etc
			Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC)
			Devops
			Noções de Computação em Nuvem
Noções de DevOps			
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)			
Aplicativos e ferramentas de proteção (ANTIVIRUS E ANTISPYWARES)			

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**PERFIS TÉCNICOS**

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CIT	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	Administrar servidores de rede físicos e virtuais, instalação e manutenção de sistemas operacionais, configuração e manutenção dos sistemas e serviços que rodam nos servidores	software envolvido na solução corporativa de comunicação
			Serviços de Diretório (Active Directory e Open LDAP)
			Programação de scripts
			Virtualização de servidores
			Virtualização de aplicações
CIT	ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO	Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Targets(storages, libraries). Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados.	Storage (SCSI, RAID, LUN)
			SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)
			Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)
CIT	ESPECIALISTA EM TELEFONIA	Instalações, configurações e manutenções de sistemas baseados em VOIP, PABX e aplicativos computacionais relacionados à telefonia.	VOIP
			conhecimentos básicos em telefonia e PABX sistemas e aplicativos
CIT	ESPECIALISTA EM REDES	Projetar, implementar e dar suporte a Redes de comunicação de dados do TRT (LAN, MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede. Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e Inventários.	Internet
			LAN
			WAN
			WLAN
			Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, transceivers)
CIT	ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Instalar, configurar e gerenciar ferramentas ligadas a Segurança da Informação, como Firewall, proxy, controle de conteúdo de e-mail e Internet, de prevenção de intrusão, entre outros. Participar do grupo de respostas a incidentes e das auditorias e geração de relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	IPS
			Firewall
			Proxy
CIT	ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO	Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de sistemas de monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal, quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema, tendo em vista a resolução de problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar e orientar o trabalho de consultores contratados pelo tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.	Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)
			ITIL
CIT	ESPECIALISTA EM DATACENTER	<p>a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e cpds.</p> <p>b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador.</p> <p>c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e cpds.</p> <p>d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, sala-cofre e cpds.</p> <p>e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos andares.</p> <p>f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do gerador e shafts de lógica dos andares.</p> <p>g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os ativos existentes na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares.</p> <p>h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados na sala-cofre e cpds.</p> <p>i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da infraestrutura e agir preventivamente.</p> <p>j. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage.</p> <p>k. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN).</p> <p>l. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Targets(storages, libraries).</p> <p>m. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados</p> <p>n. Ambiente Linux, com todos os serviços de um Foro rodando num único servidor</p>	Energia (gerador, quadros, UPS)
			Climatização
			Detecção e combate a incêndio
			Computadores servidores (instalação, manutenção)
			Noções de operação de datacenters
CDS	SERVIDOR CDS	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Processo de Desenvolvimento de Software
			Processo de Sustentação de Software
			Bancos de Dados
			Segurança da Informação para profissionais de TI
			Ferramentas de Controle de Versão
CDS	ANALISTA DE SISTEMAS	Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.	Análise e especificação de requisitos
			Análise e especificação de arquitetura
CDS	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.	Teste de Unidade
			Teste de Integração



**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**PERFIS TÉCNICOS**

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
		Objetivo de assegurar a quantidade e qualidade do software produzido.	Automatização de Testes
CDS	DESIGNER DE INTERFACES	Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade, navegabilidade, acessibilidade e design.	Interfaces de Sistemas
			Regras de usabilidade e navegabilidade
			Design
			Recomendações de Acessibilidade
CDS	DESENVOLVEDOR DELPHI	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Delphi conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Programação em Delphi
CDS	DESENVOLVEDOR WEB	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Servidor de aplicações
			Linguagens e frameworks de Back-end
			Linguagens e frameworks de Front-end
			Linguagens e frameworks Full-Stack
			Ferramenta de integração contínua
			Ferramenta de gestão de dependências
			Ferramenta de apoio ao desenvolvimento
			Tecnologia Google Apps
			Tecnologia Moodle
CDS	DESENVOLVEDOR IA	Implementação (programação) de sistemas que utilizam inteligência artificial / aprendizagem de máquina.	Tecnologias de Inteligência Artificial
CDS	DESENVOLVEDOR BI	Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de Business Intelligence.	Desenho de Universos & ETL
			Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório
CDS	DESENVOLVEDOR PL/SQL	Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Oracle SQL e PL/SQL
			PostgreSQL e PL/SQL.

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CGTIC										RESUMO GERAL			
			SETIC	CGTIC		SAC		ESI		EP		EPROC	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	
			NATACHA M OLIVEIRA	ALBERTO D MULLER	CAROLINE R MOLINA	BEATRIZ E WERNER	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	SIMONE P J GOUART	LUCAS POZZATTI	CHARLES FERREIRA FALCÃO	CINTIA F PETUCCO	DEISE A ALBINHO				RICARDO KURYLENKO
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C	A	I			I	A	C	C	C	A	3	3	2
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C	C	I			A	C	C	C	C	A	5	2	1
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	A	C	I			I	A	A	A	A	A	1	5	2
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	C	C	A			I		A	A	A	A	1	5	1
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	C	A	I			C	C	C	C	C	A	5	2	1
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	C	C	C		C	A	I			A	3	2	1	
		Gestão e Fiscalização de Contratos	A	C	C		C	A	I			A	3	2	1	
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	C	A	I	I		I		I	A	A	0	3	4	
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica											0	0	0	
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 27002)						C	I				1	0	1	
		Incidentes de Segurança da Informação						C	I				1	0	1	
		Auditoria e Forense digital						C	I				1	0	1	
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças						A	I				0	1	1	
		Segurança em Redes						A	I				0	1	1	

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CGTIC											RESUMO GERAL			
			SETIC	CGTIC			SAC		ESI	EP		EPROC		C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	
			NATACHA M OLIVEIRA	ALBERTO D MULLER	CAROLINE R MOLINA	BEATRIZ E WERNER	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	SIMONE P GOULART	LUCAS POZZATTI	CHARLES FERREIRA FALCÃO	CINTIA F PETUCCO	DEISE A KURYLENKO	RICARDO KURYLENKO				REJANE G TELICHEVSKY
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Legislação sobre licitações públicas		C				C	A	I		A	C		3	2	1
		Resolução CNJ 182/2013		C				C				A	C		3	1	0
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	C	C	C	A	C	C	A	A	A	C	C	A	6	5	0
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	A	A	I	A	C	C	C	A	A	A	4	6	1
		Relacionamento interpessoal	C	A	C	A	C	C	C	A	A	A	A	I	4	6	1
		Redação					C	A	A			A			1	3	0
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	C		C	C	A	C	C	C		A	A		5	3	0
		Inglês técnico							C	A					1	1	0
SETIC	SECRETÁRIA	Redação					C							1	0	0	
		Comunicação					C							1	0	0	
		Sistemas utilizados no TRT													0	0	0
		Br.Office					A								0	1	0
		Técnicas de Atendimento ao Público					C								1	0	0
		Governança de TI	A	C	I	I	A			I	A	A	A	1	4	3	
		COBIT	C	A			A			I	C	C	C	3	2	1	
		ITIL	C	A	A	A	A					C	A	1	5	0	

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CGTIC											RESUMO GERAL			
			SETIC	CGTIC			SAC		ESI	EP		EPROC		C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	
			NATACHA	ALBERTO	CAROLINE	BEATRIZ	KAREN	SIMONE	LUCAS	CHARLES	CINTIA	DEISE	RICARDO	REJANE			
			MOLIVEIRA	DUMULLER	RMOLLINER	WERNER	DELMAURO	JGOLMART	POZATTI	FALCÃO	FALCÃO	PETUCCO	ALBINHO	KURYLENSKY			
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	MPS.BR	A	A									C		1	1	0
		Planejamento Estratégico	C	C	I	I	A				I	A	A	I	1	3	4
		Gestão de Riscos	C	C	A	A	A				I		A	I	1	4	2
		BI		I									I	A	0	1	2
		Segurança da Informação	C	A	I	I	I						A	A	0	3	3
		Mapeamento de Processos	A	A	I	I	I				C		A	A	1	3	3
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Conceitos de Governança de TI			A	I	I	A	A	A	A	A	A		0	7	2
CGTIC	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Sistema de Gestão de SI (ABNT NBR 27001:2013)	C						C	A					1	1	0
		Controles de SI (ABNT NBR 27002:2013)	C						C	A					1	1	0
		Gestão de Segurança da Informação							A	I							
		Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	C						A	I					0	1	1
		Gestão de Riscos	C						C	C					2	0	0
		Gestão de Continuidade de Negócio	C						C	I					1	0	1
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	A						I	I					0	0	2
		Auditoria e Forense digital	A						C	I					1	0	1
		Noções em Legislações e Regulamentações							A	A					0	2	0
		Noções de Computação em Nuvem							I	I					0	0	2

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CGTIC											RESUMO GERAL			
			SETIC	CGTIC		SAC			ESI	EP	EPROC		C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação		
			NATACHA M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E D R M O L I N E A	B E A T R I Z E D E L W E R N E R O	K A R E N D E S O U Z A D E L M A U R O	S I M O N E P J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C H A R L E S F E R R E I R A F A L C A O	C I N T I A F P E T U C C O	D E I S E A K U R Y L E N K O				R I C A R D O K K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V S K Y
		Noções de DevSecOps							I	I					0	0	2
		Noções de Desenvolvimento seguro							I	I					0	0	2
		Ferramenta de gestão de Segurança da Informação	C						C	I					1	0	1
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Conhecimento em orçamento público e normas associadas	A	A				A							0	2	0
CGTIC	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	C	A							A	A	A		0	4	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C	C							C	C	C		4	0	0
		Ferramenta de gestão de projetos e portfólios utilizada no Tribunal (TRACE)	C	A							C	C	A		2	2	0
		BSC	C	C							I	C	A		2	1	1
		SCRUM	C	C							A	A	C		2	2	0
		COBIT	C	A							I	C	A		1	2	1
		MPS.BR	C	A							I	C	C		2	1	1
		Gestão por objetivos e resultados - OKR		I							I	I			0	0	3
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	Legislação sobre licitações públicas	C	C	A	A	A	A					A		1	5	0
		Técnicas de Negociação	A	A	I	I	I	I					A		0	2	4
		IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	C	C	C	A	I	C					C		4	1	1

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CGTIC											RESUMO GERAL				
			SETIC	CGTIC	SAC			ESI	EP		EPROC			C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação		
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R V M O L L I N E R	B E A T R I Z E W E R N E R O	K A R E N D E S O U Z A D E L M A U R O	S I M O N E P J G O U L A R T I	L U C A S P O Z A T T I O	C H A R L E S F E R R E I R A F A L C A O	C I N T I A F P E T U C C O	D E I S E A K U R Y L E N K O	R I C A R D O K K U R Y L E N K O				R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	
		Gestão e Fiscalização de contratos	A	C	C	A	I	C					A		3	2	1	
		Noções em PMBOK										C	C	A	A	2	2	0
		SCRUM										A	A	C	I	1	2	1
		MPS.BR										I	C	C		2	0	1
CGTIC	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Ferramenta de gestão de Projetos (TRACE)										C	C	C		3	0	0
		Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS-Assyst)												C	A	1	1	0
		Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC										C	C	C	A	3	1	0

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIT																										RESUMO GERAL								
			SRT										SGBD						SST										CIT	C	A	I					
			ED	ER	JUI	JO	GUI	GU	GU	JUI	LEA	LU	ED	EV	RO	ER	EV	AL	VA	DA	CA	JE	AN	FAY	FE	AN	LE	BF	GL	PAU							
			EDUARDO M ROCHA	ERNANI S KERNE	JULIANO SIEBEL	JÓÃO F ENCARNAÇÃO	GUILHERME WANDER	GUILHERME COSTA MACIEL	GUSTAVO A KELLERMAN	JULIO C Z FERREIRA	LEANDRO A OLIVEIRA	LUI S C PORTO	EDISON LEHR	DIOGO PIREZ GILLI	EVERTON BEERZ	ROBERTO ROSA	ERIC SILVA	RODRIGO ZARTH	EVANDRO BASSANESE	ANDRIANO SIMIONI	VOLNEI C SUSHIN	DAVIC CAMPANHER	CARLOS THENO SCHMIDT	JENER G T JUNIOR	ANDERSON M GOMES	FABIANO MARTINS	YUSEF M GIDRAO	FELIPE B CUNHA	ANDRE L LIVI	LEONARDO DAMIANI	BRUNO S MARQUES	GERMANO ANDERSSON	PAULO MR JUNIOR	C	A	I	
																										C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação									
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK																														C	1	2	0		
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI																														C	2	0	1		
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos																														I	0	1	2		
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação																															I	0	0	3	
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos																															C	2	1	0	
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas		I																												I A	0	1	4		
		Gestão e Fiscalização de Contratos		A																													I I	0	1	4	
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais		A																												A C	1	4	2		
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica																															0	0	0		
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001 Controles de SI (NBR 27002)																															I	1	0	4	
		Incidentes de Segurança da Informação		A																													I I	1	1	3	
		Auditoria e Forense digital		I																														I I	1	0	4
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças		I																														I I	0	0	5
		Segurança em Redes		C																															1	0	0
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Legislação sobre licitações públicas		I	I	I	I		A																								I C	3	2	6	
		Resolução CNJ 182/2013		A	I	I	I		I																									I I	0	3	8
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	C	I	A	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	2	20	7	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	A	A	A	A	A	I	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	4	24	1	
		Relacionamento interpessoal	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	27	2	
		Redação																																	0	0	0
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)																																	0	0	0





**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIT																								RESUMO GERAL													
			SRT						SGBD						SST						CIT						C	A	I											
			ED	ER	JUI	JO	GUI	GUI	GU	JUI	LEA	LU	ED	EV	RO	ER	EV	AL	VA	DA	CA	JEAN	FAY	FE	AN	LE	BF	GR	PAU											
			EDUARDO M	ERNANI S	JULIANO S	JOÃO F M	GUILHERME W	GUILHERME C	GUSTAVO A	JULIO C Z	LEANDRO A	LUIS C P	EDSON E	DIOGO P	EVERTON B	ROBERTO P	ERIC S	RODRIGO Z	EVANDRO B	ANDRIANO S	VOLNEI C	DAVIE C	CAMPANHEIR	JENER G	ANDERSON M	FABIANO M	YUSEF M	FELIPE B	ANDRE L	LEONARDO R	BRUNO S	GERMANO M	PAULO M	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação				
CIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tunning, Data Guard, RMAN, ASM, Discoverer, RAC, PL/SQL, Apex, etc.)										C	I	C	A	A	A	C																3	3	0				
		Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, ADC											A	I	A	A	A	A	A																0	6	0			
		Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries												A	I	A	C	A	I	C																2	3	1		
		Conceitos avançados de segurança de informações												A	I	A	A	A	A																	0	6	0		
		Gerenciamento e administração básica de Storage												C	I	C	C	C	C																	6	0	0		
		Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat													C	I	C	C	A	A	A																3	3	0	
		Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento													A	I	A	C	A	A	A																1	5	0	
		Sistemas operacionais para DBAs													C	I	C	C	C	C																	6	0	0	
		Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, DataGuard, Discoverer, mysql, etc														I																						0	0	0
		Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi														A	I	A	C	A	A	A																1	5	0
Devops, Infraestrutura como serviço, entrega contínua, kubernetes, docker, vagrant														I	I	I	I	I	I																	0	0	6		
Bussiness Inteligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)														A	I	I	A	A	A	A																0	5	1		
CIT	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	Aplicativos e ferramentas de proteção (ANTIVIRUS E ANTISPYWARES)																	A	C	C															2	2	0		
		software envolvido na solução corporativa de comunicação																		C	A			C	A	C											4	2	0	
		Serviços de Diretório (Active Directory e Open LDAP)	I	A	I			I	I	A	I									I	A	C		C	C	C		A	A	A							4	7	6	
		Programação de scripts	A	A	A			A	I	A	I										A	I	A		A	C	C	A	A	A	C	A	C					4	12	3
		Virtualização de servidores	C						I		I									A		A	C															8	2	3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019  
 MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIT																			RESUMO GERAL														
			SRT					SGBD					SST					CIT				C	A	I												
			EDUARDO	ERNESTO	JULIANO	JOÃO	GUI	GUI	GUSTAVO	JULIO	LEANDRO	LUIS	EDUARDO	EDUARDO	ROBERTO	ROBERTO	ERICO	RODRIGO	EVANDRO	ANDRÉ	VOLNEI	DAVID	CARLOS	JEAN	FABIANO	FAY	YUSEF	FELIPE	ANDRE	LEONARDO	BRUNO	GERMANO	PAULO	C	A	I
MACHADO	SILVEIRA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA	ROCHA			
		Virtualização de aplicações						I																									0	3	3	
		Storage (SCSI, RAID, LUN)																															0	4	0	
		SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)																															0	4	0	
		Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)		I																													1	5	1	
		VOIP			I	A																											0	2	2	
		conhecimentos básicos em telefonia e PABX			A	A																											1	2	0	
		sistemas e aplicativos			I	A																											0	2	1	
		Internet	A	A	A	A	C	I	C																								2	4	3	
		LAN	A	A	A	A	A	A	A																								0	7	2	
		WAN	A	A	A	A	A	C	A																								1	7	2	
		WLAN	A	I	A	A	A	I	I	A																							0	5	5	
		Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)	A	A	A	A	A	I	A																								0	7	2	
		IPS																															3	1	0	
		Firewall																															3	1	0	
		Proxy																															2	3	0	
		Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	C	A	A	I	I	I	C	A																							3	9	9	
		ITIL	I	A	I	I	I	I	A	I																								2	6	11
		Energia (gerador, quadros, UPS)	I	A	I	I	I	I	A	I																								0	4	9
		Climatização																																1	1	2
		Detecção e combate a incêndio																																0	3	1
		Computadores servidores (instalação, manutenção)	A	A	A	I	A	I	A	A																								6	7	4
		Noções de operação de datacenters	A	A	I	I	A	I	A	I																								2	7	5

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019  
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CAU																											RESUMO GERAL														
			SM							SGE							SAU.										CAU	C	A	I														
			A	L	F	F	I	S	P	R	D	L	J	C	A	L	M	M	P	A	L	A	N	D	D	J	J	C	G	D	E	L	E	R	C	A	F	L	P	S	I	D	E	N
			ALBERTO	FELICIANO	FRANCISCA	ISMAEL	PAULINA	RICARDO	DINEI	LUCCIANO	JOSÉ	ALEXANDRE	CARLA	JOÃO	ALEXANDRE	MARRIAGEM	PAULO	ANTONIO	ALISSON	DANIEL	DANIEL	JACKSON	JOSÉ	GUILHERME	EVERTON	DAVE	LEANDRO	ROBERTO	ANNARA	FABIANO	LUIS	PAULO	SILVANA	DENILSON	MOREIRA	DUTRA	SILVANA	QUADROS						
		PMI/PMBOK	A													A																							C	1	3	0		
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI																																						0	0	1		
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos																																						0	0	1		
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	A														A																			A				0	4	0		
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	A														A																				C			1	3	0		
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	I														A		A																	A			0	3	2			
GERAL	GESTOR	Gestão e Fiscalização de Contratos	A							A							A		A																		A			0	6	0		
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	A	I													A		A																		A			0	5	2		
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica																																						0	2	1		
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 27002)	I	I																																				0	0	3		
		Incidentes de Segurança da Informação	I	I																																				0	0	3		
		Auditoria e Forense digital																																						0	0	0		
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	I	I																																				0	0	2		
		Segurança em Redes	A	I																																				0	1	2		
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE	Legislação sobre licitações públicas	I															I																				I		0	0	5		

**C=Capacitado**  
**A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento**  
**I=Iniciar Capacitação**

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CAU																							RESUMO GERAL												
			SM					SGE					SAU.										CAU			C	A	I										
			AN	AL	FE	FR	IS	PA	RI	DI	LU	JC	AL	CA	AL	M	M	PA	AL	AN	DA	DA	JA	JC	GI	DI	EV	LE	RO	AN	FA	LU	PA	SI	DEN			
			ALB	FRAN	STAN	SL	PAUL	RHUN	ANDRE	LU	JOS	AL	CARE	ALEX	ANDRE	MARR	MI	PAUL	ANTON	AL	DAN	JAC	JO	GU	DI	EV	LE	RO	AN	FA	LU	PA	SI	DEN				
AN	AL	FRAN	STAN	PAUL	RHUN	ANDRE	JOS	AL	CARE	ALEX	ANDRE	MARR	MI	PAUL	ANTON	AL	DAN	JAC	JO	GU	DI	EV	LE	RO	AN	FA	LU	PA	SI	DEN	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação					
GERAL	DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Resolução CNJ 182/2013	A												A		I														A	0	4	1				
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	C	I	A	I	A	A	A	A	I	C	A	I	A	I	C	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	I	A	I	C	C	5	16	12		
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	32	1	0			
		Relacionamento interpessoal	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	0	32	1		
		Redação											A																					0	1	0		
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	I	A	A	1	28	4		
SETIC	SECRETÁRIA	Inglês técnico																															0	0	0			
		Redação																																0	0	0		
		Comunicação																																0	0	0		
		Sistemas utilizados no TRT																																	0	0	0	
		Br.Office																																	0	0	0	
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Técnicas de Atendimento ao Público																															0	0	0			
		Governança de TI																													A			0	1	0		
		COBIT																																0	0	0		
		ITIL																																	0	0	0	
		MPS.BR																																	0	0	0	
		Planejamento Estratégico																I	I	I								I			I			0	0	5		
		Gestão de Riscos	I	I																														0	0	2		
Segurança da Informação	I	I												I																		0	0	3				
BI														I																		0	0	1				

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019  
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CAU																													RESUMO GERAL																
			SM								SGE								SAU.												CAU	C	A	I														
			A	M	F	F	I	P	R	D	L	J	C	A	A	M	M	P	A	A	N	D	D	J	J	C	D	E	L	R	A				F	L	P	S	D	C A I								
			ANDRE LACROIX	FELICIANO	FELICIANO	ISMAEL PAULINO	RODRIGO CHIERES	DINEI ROLLO	JOSÉ ROBERTO	ALEXANDRE OLIVEIRA	CARELIA FEENHALLER	ANDRÉ GONZALVES	MARCILIO PAULINO	ALISSON MOSSCONEIRO	ANTONIO DANILO	JACKSON GALVÃO	GUILHERME BARRETO	DEIVETON PERALTA	LEANDRO ROBERTO	ANNABELE WEISS	FABIANO MOURA	LUIS CARLOS	PAULO CORREA	SILVANA OLIVEIRA	DENILSON DE QUEIROZ	C	A	I																				
		Mapeamento de Processos																																	I	0	0	1										
CAU	SERVIDOR CAU	ITIL	A	A	C	A	A	C	A	C	I	C	C	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	7	24	2										
		Ferramenta de HelpDesk	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	C	1	27	5										
		Técnicas de Atendimento ao Público	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	1	28	4										
CAU	ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO	Sistema de processo eletrônico																A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	I	C	A	A	C	A	C	A	4	12	1										
CAU	ESPECIALISTA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Tipos de mídias e softwares relacionados			C				C	C								C	A	C	C	I	C	I	A	A	A	I	C	A	I	A	I	C		9	5	5										
CAU	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Sistemas Operacionais Microsoft	A		A	A		A	A	A	C								I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		1	6	12											
		Sistemas Operacionais Linux	C	A																																1	1	0										
		Software envolvido na solução corporativa de comunicação	A		A	A	A	A	A	A																											0	7	0									
		Configuração de redes(desktop e servidor)	C		A	A	A	A	A	A																											1	6	0									
		LAN	A		A	A	A	A	A	A																											0	7	0									
		Software e configurações de dispositivos móveis	I		I	I	I	I	I	I																											0	0	7									
		Linguagem de programação	A		A	A	A	A	A	A	I		I		A	I	A																				0	9	3									
		Ferramentas de monitoramento e segurança	A		I	I	I	I	I	I																												0	1	6								
		Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais	C		A	A	A	A	A	A																												1	6	0								
		Segurança da Informação para profissionais de TI	I							I																												0	0	2								

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CAU																									RESUMO GERAL										
			SM					SGE					SAU.										CAU					C	A	I								
			AL	FL	FR	IS	PA	RI	DI	LU	JC	AL	CA	AL	M	M	PA	AL	AN	DA	DA	JA	JC	DI	GI	DI	EV	LE	RC	AN	FA	LU	PA	SI	DEN			
A	N	F	S	P	R	D	L	J	A	C	A	M	M	P	A	A	D	D	J	J	D	G	D	E	L	R	A	F	L	P	S	D						
CAU	ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES	Ferramentas de gerência de LDAP	C	A	A	A	A	A	A																										1	7	0	
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU	Sistemas de 1º grau															A	A	A	C	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	C			2	10	4		
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2ºGRAU	Sistemas de 2º grau															A	A	A	C	I	I	I	A	A	I	C	A	I	A	I	C		3	7	6		
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Sistemas Administrativos															A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	C	A	I	A	I	C	2	9	5		
CAU	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO	Editor de texto(Writer)															A		A	A	A	A	I			A	I	A	A	I	A			0	8	4		
		Ferramenta de e-mail	A	A	A	A	A	A	A								A		A	A	A	A	I			A	I	A	A	I	A			0	16	4		
		Planilha de cálculos (Calc)								A							I		A	A	A	A	I					A	I	A	A	I	A	0	8	5		
		Apresentação (impress)								A							A											A						0	3	0		
CAU	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	Banco de Dados					C	C	C	I	I	I	A		A	A																		3	3	2		
		Excel					A	A	A	A	A						A																		0	6	0	
CAU	ESPECIALISTA EM HARDWARE	Configuração de Equipamentos						A	I	C	I	A		A	A																		1	4	2			
		Manutenção de Equipamentos						A	I	C	I	A		A	I																		1	3	3			
		Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware						A	I	C	I	A		A	I																		1	3	3			

C=Capacitado

A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento

I=Iniciar Capacitação

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CDS																												RESUMO GERAL												
			CDS	SPE							SPORT				SJUD					SDEC					SADM					C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação											
			MARCO ANTÔNIO REGIL CARLOS LEANDRO FERREIRA JOICEDOR PEDRO VAGGOTTI ALEXANDRE LUCIANA STEFFANO LUIZ FERREIRA ANDRÉS ALAN NORBERTO FELIPE ADEMAR LUZ PAULO CEALSO MICHEL MARCELO FABRÍCIO MARCO MENA RUBILAR DA S	ANDRÉS	NONEN	MA	AR	IP	AB	FR	ANT	REG	CAR	LEA	FER	JOI	PED	ROD	MAR	ALE	LUC	STE	LUI	AND	LEA	NOR	FEL	ADE	LUZ				PAU	CEL	MIC	MAR	FAB	MAR	REN	RUB			
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C																C																		3	3	0				
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C																	C		C															6	0	0				
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	A																	A																	0	6	0				
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	C														A		A									I										1	3	3			
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	C																	C		C																5	1	0			
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	I																I																	0	0	5					
GERAL	GESTOR	Gestão e Fiscalização de Contratos	I																I																	0	0	5					
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	C												A	A	A									I				C							2	5	1				
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica																																				0	0	0			
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 27002)	I																																		0	0	2				
		Incidentes de Segurança da Informação	I																																			0	0	2			
		Auditoria e Forense digital																																					0	0	0		
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	I																																			0	0	2			
		Segurança em Redes																																					0	0	0		
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Legislação sobre licitações públicas	A																I																		0	1	4				
		Resolução CNJ 182/2013	A																	I																	0	1	4				
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	C	C	C	I	I	I	A	A	A	C	A	C	A	A	A	A	C	C	C	A	I	A	A	C	I	C	C	C	C	C	C	I	I	I	I	A	C	17	11	8	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	31	5	0
		Relacionamento interpessoal	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A			2	30	4
		Redação																																						0	0	0	
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)																																						0	0	0	
		Inglês técnico																																						0	0	0	
		Redação																																				0	0	0			

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019  
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CDS																									RESUMO GERAL					
			CDS	SPE					SPORT					SJUD					SDEC					SADM									
				MARCO ANDRE FARIAS	MARCO NONNE FARIAS	FELIPE COSTA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA	FABRICE SILVA		FABRICE SILVA				
SETIC	SECRETÁRIA	Comunicação																										C=Capacitado	0	0	0		
		Sistemas utilizados no TRT																												0	0	0	
		Br.Office																												0	0	0	
		Técnicas de Atendimento ao Público																												0	0	0	
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Governança de TI	A																										0	1	0		
		COBIT	A																											0	1	0	
		ITIL	A	A			A																							0	3	0	
		MPS.BR	C																											1	0	0	
		Planejamento Estratégico	A																											0	1	0	
		Gestão de Riscos	A																											0	1	0	
		BI																												0	0	0	
		Segurança da Informação	I																											0	0	1	
		Mapeamento de Processos	A																											0	1	0	
CDS	SERVIDOR CDS	Processo de Desenvolvimento de Software	C	C	C	A	A	A	C	A	A	C	I	C	C	C	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A	A	C		18	17	1	
		Processo de Sustentação de Software	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	C	A	C	A	C	C	C	C	A	C	A	C	14	22	0
		Bancos de Dados	A	A	A	A	A	A	A	C	I	A	A	A	A		A		I			C	C	C	C	C	C		I		8	14	1
		Segurança da Informação para profissionais de TI	I																												0	0	4
		Ferramentas de Controle de Versão	C	C				C			A	A	C	C	A	A	A	A	A	C	A	C	C	C	C	C	C	A	C		17	10	1
CDS	ANALISTA DE SISTEMAS	Análise e especificação de requisitos	A	A	A	A		C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A		A			4	19	2	
		Análise e especificação de arquitetura	I	A				I		A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	C	C	A	C	A		A	A	A	3	15	3	
CDS	ANALISTA DE TESTES	Teste de Unidade			A	A				A	A	A	A	A	A	C	C		I	A	C	A		A		I	A	I	A	4	16	3	
		Teste de Integração			A	A				A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	C	A	A		A		I	A	I	A	1	18	4
		Automatização de Testes			A	A				A	A	A	A	A	A	I	I	C	I	A		A		A		I	A	I	A	I	1	15	5
CDS	DESIGNER DE INTERFACES	Interfaces de Sistemas			A	A				A	A	I	A	A	A	A	I	A	C		A		C	A	I	A	I	A	A	2	15	2	
		Regras de usabilidade e navegabilidade			A	A				A	A	I	A	A	A	A	I	A	C		A		C	A	I	A	I	A	A	2	15	2	
		Design			A	A				A	A	I	A	A	A	A	I	A	C		A		C	A	I	A	I	A	A	2	15	2	
		Recomendações de Acessibilidade			A	A				A	A	I	A	A	A	A	I	A	C		A		C	A	I	A	I	A	A	2	15	2	
CDS	DESENVOLVEDOR DELPHI	Programação em Delphi																				C	C	C	A			C	11	1	0		
		Servidor de aplicações			A	A		C		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						I	I	I	A	1	15	3



**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CDS																										RESUMO GERAL											
			CDS	SPE						SPORT				SJUD						SDEC						SADM						C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação						
			MARCO S ANDR E S FARI A S	MARCO S NONN E S FARI A S	MARCO S LIPR I C C G O I L V E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S	MARCO S FABR I L P E E S											
CDS	DESENVOLVEDOR WEB	Linguagens e frameworks de Back-end	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	1	15	3				
		Linguagens e frameworks Front-end	A	A	A	A	C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	1	14	4		
		Linguagens e frameworks Full-Stack																																		0	5	3		
		Ferramenta de integração contínua	A	A	A	A	C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	1	14	4		
		Ferramenta de gestão de dependências	C	A	A	A	C	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	3	13	3		
		Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	I	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	1	14	4		
		Tecnologia Google Apps	C	A	A	A	C	C	A	C	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I	I													A	4	7	5		
	Tecnologia Moodle	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	I	I													A	0	10	6				
CDS	DESENVOLVEDOR IA																																		0	1	0			
CDS	DESENVOLVEDOR BI	Tecnologias de Inteligência Artificial																																		0	6	0		
		Desenho de Universos & ETL																																				0	6	0
CDS	DESENVOLVEDOR SQL	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório																																			0	6	0	
		Oracle SQL e PL/SQL																																				0	6	0
		PostgreSQL	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	13	13	0		
																																						1	13	1

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019  
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIS					RESUMO GERAL		
			PAE	THI	ALE	THA	JANINA ALVES FAG	A	I	
			PABLO PAULLO LOPES BARRROS	THIAGO ALEXANDRE DORNELLES	ALEXANDRE RICARDO FAGUNDES	THALES ANTUNES SOFIA TTI	JANINA ALVES FAGUNDES	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento		I=Iniciar Capacitação
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C	C			C	2	0	0
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	A	A			A	0	2	0
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	C	C	A	C	C	3	0	0
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	A		A		C	1	1	0
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	C	A			C	2	0	0
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	A				C	1	1	0
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica	C	C	C	C	C	3	0	0
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	A	A	A	A	A	0	3	0
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	C	C	C	3	0	0
		Relacionamento interpessoal	C	C	C	C	C	3	0	0
		Redação	C	C	C	C	C	3	0	0

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIS					RESUMO GERAL		
			PAE	THI	ALE	THA	JANINA ALVES FAG	A	I	
			PABLO PAULLO LOPES BARRROS	THIAGO ALEXANDRE DORVILLE	ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA	THALES ANTUNES SOFFIATI	JANINA ALVES FAGUNDES	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento		
							C=Capacitado		I=Iniciar Capacitação	
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	C	C	C	A	C	2	1	0
		Inglês técnico	C	C	C	C	C	3	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Redação						0	0	0
		Comunicação						0	0	0
		Sistemas utilizados no TRT	A	A	A	A	A	0	3	0
		Br.Office						0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público	C	C	C	C	C	3	0	0
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Governança de TI	A				I	0	1	1
		COBIT						0	0	0
		ITIL	I				I	0	0	2
		MPS.BR						0	0	0
		Planejamento Estratégico	A				I	0	1	1
		Gestão de Riscos	A				I	0	1	1
		BI	I				I	0	0	2
		Segurança da Informação						0	0	0
		Mapeamento de Processos						0	0	0

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES**

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIS					RESUMO GERAL			
			PAE	THI	ALE	THA	JANINA ALVES FAG	A	I		
			PABLO PAULLO LOPES BARRROS	THIAGO ALEXANDRE DORNELLES	ALEXANDRE RICARDO SOFIA	THALES ANTUNES SOFIA	JANINA ALVES FAGUNDES				
			<b>C=Capacitado</b>					<b>A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento</b>		<b>I=Iniciar Capacitação</b>	
CIS	ANALISTA DE TESTES	Teste de Unidade	C	C	C	C	C	3	0	0	
		Teste de Integração	C	C	C	C	C	3	0	0	
		Automatização de Testes		C			A		0	1	0
		Segurança da Informação para profissionais de TI	I	I	I	I	I	0	0	3	
		Sistema de processo eletrônico	C	C	C	C	C	3	0	0	
CIS	ANALISTA DE NEGÓCIOS	BABOK - Business Analysis Body of Knowledge	C	C	C	C	C	3	0	0	
		Noções de Direito Processual do Trabalho	A	A	A	A	A	0	3	0	
CIS	DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD	Gestão do conhecimento	A	A	A	A	A	0	3	0	
		Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	C	A	C	C	C	3	0	0	

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**RELAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SETIC**

	<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>SEÇÃO</b>	<b>COORDENADORIA</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
1	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	CDS	
2	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	
3	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	
4	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	
5	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	CAU	
6	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	
7	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	
8	ALEXANDRE DIEFENTHALER	TÉCNICO	SGE	CAU	
9	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	
10	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	CAU	
11	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	CAU	
12	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	
13	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	
14	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	
15	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	
16	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	
17	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	CAU	
18	BEATRIZ EVA VIANNA WERNER	ANALISTA	SACTIC	CGTIC	APOSENTADORIA EM 2019
19	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	
20	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	CAU	
21	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	ANALISTA	SPE	CDS	
22	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	CIT	
23	CAROLINE ROCHA MOLINA	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	
24	CELSON MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	
25	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	ESI	CGTIC	
26	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	
27	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	
28	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	CAU	
29	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	CIT	
30	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	
31	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	CAU	
32	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	CAU	
33	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	
34	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SGBD	CIT	
35	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	
36	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	
37	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	
38	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	
39	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	
40	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	
41	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	
42	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	CAU	
43	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	
44	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	
45	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	
46	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	
47	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	
48	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	
49	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	
50	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	
51	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	
52	FRANCISO FLESCHE	TÉCNICO	SM	CAU	
53	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	
54	GUILHERME COSTA MACIEL	TÉCNICO	SRT	CIT	
55	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	CAU	
56	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	
57	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	
58	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	
59	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	CAU	
60	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	
61	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	CIT	
62	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	
63	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNÇÃO	ANALISTA	SRT	CIT	
64	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	TÉCNICO	SAU	CAU	
65	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	CAU	
66	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	
67	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	
68	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	
69	LEANDRO DA SILVA PERACHI	ANALISTA	SAU	CAU	
70	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	
71	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	
72	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	
73	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	
74	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	
75	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019**  
**RELAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SETIC**

	<b>NOME DO SERVIDOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>SEÇÃO</b>	<b>COORDENADORIA</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
76	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	
77	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	CDS	
78	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	TÉCNICO	SAU	CAU	
79	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	
80	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	
81	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	
82	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	
83	MARCILIO MENDES SANTANA	TÉCNICO	SGE	CAU	
84	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	
85	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	
86	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	
87	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	CAU	
88	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	
89	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	
90	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	TÉCNICO	SDEC	CDS	
91	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	
92	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	CAU	
93	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	CIT	
94	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	CAU	
95	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	CAU	
96	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	ANALISTA	SDEC	CDS	
97	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	TÉCNICO	SPORT	CDS	
98	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	
99	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	
100	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	
101	RHUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	CAU	
102	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	CGTIC	
103	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	
104	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	CAU	
105	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	
106	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	
107	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	
108	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	CAU	
109	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	
110	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	
111	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	
112	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	
113	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	
114	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	
115	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	
116	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	

EVERTON LUIS BERZ  
ANTONIO LUCAS NERES DE OLIVEIRA BARROS  
JOICE PAVEK FIGUEIRO

Servidor em licença para tratar de assuntos particulares - Não está lotado da SETIC  
Servidor removido ao CSJT - Não está lotado da SETIC  
Aposentadoria em fevereiro de 2019

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	1	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Workshop de OKR - Gestão por objetivos e resultados	15.300,00	proposta da empresa	Não			15.300,00	160	20	Thomaz Ribas	Turma in company para até 20 gestores	
Plano original	2	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Design Thinking	50.000,00	Proposta da empresa	Não			50.000,00	24	30	Echos	Turma in company para 30 pessoas. Adequado para quem atua com planejamento e concepção de serviços, sistemas e soluções, informatizadas ou não. Poderia ser útil também para todos os gestores da Área Administrativa e unidades como Escola Judicial, Assteco, Segjud, Cejusc.	
Plano original	3	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Design de Serviços para Negócios (Service Design)	50.000,00	Proposta da empresa para treinamento similar	Não			50.000,00	24	30	Echos	Turma in company para 30 pessoas. Adequado para quem atua com planejamento e concepção de serviços, sistemas e soluções, informatizadas ou não. Poderia ser útil também para todos os gestores da Área Administrativa e unidades como Escola Judicial, Assteco, Segjud, Cejusc.	
Plano original	4	1	Segurança da Informação para profissionais de TI	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Fundamentos avançados de segurança da informação para profissionais de TI	17.640,00	proposta da empresa	Não			17.640,00	240	15	DropReal	Turma in company para até 15 pessoas	
Plano original	5	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Comunicação Interpessoal para TI	6.000,00	Contratações do TRT em 2018	Não			6.000,00	225	15	Comunicativa Fonoaudiologia (Debora Brum)	Turma in company para até 15 pessoas	
Plano original	6	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	TURMA IN COMPANY	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Comunicação Assertiva para TI	6.000,00	Contratações do TRT em 2018	Não			6.000,00	180	15	Comunicativa Fonoaudiologia (Debora Brum)	Turma in company para até 15 pessoas	
Plano original	7	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00	<a href="https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-html-css">https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-html-css</a>	Não			900,00	32	1	Alura		
Plano original	8	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00	<a href="https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada">https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada</a>	Não			1.950,00	16	1	Toccatto		
Plano original	9	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Congresso de Gerenciamento de Projetos	800,00	<a href="https://pmirs.org.br/">https://pmirs.org.br/</a>	Não	-	-	800,00	16	1	PMI		
Plano original	10	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00	<a href="https://www.alura.com.br/planos-cursos-online">https://www.alura.com.br/planos-cursos-online</a>	Não	-	-	0,00	16	1	Alura		
Plano original	11	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de maquinas virtuais	0,00	<a href="https://www.alura.com.br/planos-cursos-online">https://www.alura.com.br/planos-cursos-online</a>	Não	-	-	0,00	8	1	Alura		
Plano original	12	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00	<a href="https://www.alura.com.br/planos-cursos-online">https://www.alura.com.br/planos-cursos-online</a>	Não	-	-	0,00	20	1	Alura		
Plano original	13	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Processamento de Linguagem Natural e Reconhecimento de Voz	1.100,00	<a href="https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=processamento-de-linguagem-natural-e-reconhecimento-de-voz">https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=processamento-de-linguagem-natural-e-reconhecimento-de-voz</a>	Não			1.100,00	54	1	Data Science Academy		
Plano original	14	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Análise Estatística para Data Science II	999,00	<a href="https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=analise-estatistica-para-data-science-ii">https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=analise-estatistica-para-data-science-ii</a>	Não			999,00	84	1	Data Science Academy		
Plano original	15	4	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Análise de Grafos em Big Data	599,00	<a href="https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=analise-em-grafos-para-big-data">https://www.datascienceacademy.com.br/course?courseid=analise-em-grafos-para-big-data</a>	Não			599,00	40	1	Data Science Academy		
Plano original	16	1	CGTIC - SERVIDOR CGTIC - Conceitos de Governança de TI	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	5º Fórum IBGP de Governança de TIC	0,00	Sem custo	Sim	1.157,60	495,18	1.356,66	3.009,44	16	1	IBGP	
Plano original	17	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	Gartner Symposium IT Expo	4.425,00	<a href="https://www.gartner.com/pt-br/conferencias/la/symposium-brazil/register">https://www.gartner.com/pt-br/conferencias/la/symposium-brazil/register</a>	Sim	2.315,20	495,18	815,08	8.050,46	32	1	Gartner	
Plano original	18	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	CONIP JUDICIÁRIO	0,00	Sem custo	Sim	1.157,60	495,18	1.356,66	3.009,44	16	1	Conecta LATAM	
Plano original	19	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	CAU	Comunicação Escrita	0,00	Sem custo	Não			0,00	40	1	Fundação Bradesco		
Plano original	20	2	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	CAU	Técnicas de Redação	0,00	Sem custo	Não			0,00	10	1	Fundação Bradesco		
Plano original	21	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Storytelling: contar histórias para se conectar	717,25	<a href="https://www.espm.br/educacao_continuada/storytelling-contar-historias-para-se-conectar/">https://www.espm.br/educacao_continuada/storytelling-contar-historias-para-se-conectar/</a>	Não			717,25	16	1	ESPM		
Plano original	22	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Pitch	149,00	<a href="https://descola.org/curso/pitch">https://descola.org/curso/pitch</a>	Não			149,00	4	1	<a href="https://descola.org">https://descola.org</a>		
Plano original	23	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Track Criatividade	447,00	<a href="https://descola.org/track/criatividade">https://descola.org/track/criatividade</a>	Não			447,00	21	1	<a href="https://descola.org">https://descola.org</a>		
Plano original	24	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não			730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas	
Plano original	25	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Java parte 1: Primeiros passos	900,00		Não			900,00	8	1	Alura		
Plano original	26	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Java parte 2: Introdução à Orientação a Objetos	0,00		Não			0,00	8	1	Alura		
Plano original	27	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Java parte 3: Entendendo herança e interface	0,00		Não			0,00	16	1	Alura		

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	28	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIFENTHALER	TÉCNICO	SGE	CAU	Python 2: Programando com a linguagem	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	29	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIFENTHALER	TÉCNICO	SGE	CAU	Curso PHP e MySQL II: Cookies, sessões e mais recursos	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	30	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIFENTHALER	TÉCNICO	SGE	CAU	Curso PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na Web	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	31	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIFENTHALER	TÉCNICO	SGE	CAU	Go: Iniciando com a linguagem do Google	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	32	1	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Apresentação (impress)	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	PowerPoint 2013 Básico	0,00		Não				0,00	11	1	Fundação Bradesco	
Plano original	33	2	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Apresentação (impress)	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	PowerPoint 2013 Avançado	0,00		Não				0,00	7	1	Fundação Bradesco	
Plano original	34	3	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	Excel 2013 Avançado	0,00		Não				0,00	31	1	Fundação Bradesco	
Plano original	35	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	CAU	M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	36	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	CAU	Design Thinking Experience	0,00	<a href="https://escoladesignthinking.echos.cc/">https://escoladesignthinking.echos.cc/</a>	Não				0,00	24	1	Echos	Treinamento previsto para turma in company
Plano original	37	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	JB248 - Red Hat JBoss Application Administration I	5.175,00		Não				5.175,00	40	1	Fontoura	
Plano original	38	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	CL110 - Red Hat OpenStack Administration I	5.175,00		Não				5.175,00	40	1	Fontoura	
Plano original	39	1	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	The Developer's Conference 2019	1.278,00	PAC 2018	Não				1.278,00	32	1	DEVCONF	
Plano original	40	2	CDS - DESENVOLVEDOR IA - Tecnologias de Inteligência Artificial	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	Machine Learning: Aprendizado supervisionado	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	41	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	0,00	<a href="https://www.alura.com.br/planos-cursos-online">https://www.alura.com.br/planos-cursos-online</a>	Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	42	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	FISL 19	450,00	<a href="http://fis18.softwarelivre.org/index.php/participantes/">http://fis18.softwarelivre.org/index.php/participantes/</a>	Não				450,00	20	1		
Plano original	43	1	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UX: o que é experiência de usuário	900,00		Não				900,00	2	1	Alura	
Plano original	44	2	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UX Strategy: divergindo e afinando ideias	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	45	3	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UX Usability: facilite a vida do seu usuário no mobile	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	46	4	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UX Produto: monitore, mensure e teste o seu projeto	0,00		Não				0,00	2	1	Alura	
Plano original	47	5	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	Revisão UX: ferramentas do briefing ao protótipo	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	48	6	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UX mitos: os erros frequentes de usabilidade e as boas práticas	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	49	7	CDS - DESIGNER DE INTERFACES - Interfaces de Sistemas	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	UI Design Patterns: Usabilidade em interfaces mobile	0,00		Não				0,00	5	1	Alura	
Plano original	50	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00	<a href="https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/data-analytics-brazil">https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/data-analytics-brazil</a>	Sim	1.736,40	495,18	815,08	6.621,66	24	1	Gartner	
Plano original	51		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	Gartner Symposium IT Expo	4.425,00	<a href="https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/symposium-brazil/register">https://www.gartner.com/pt-br/conferences/la/symposium-brazil/register</a>	Sim	2.315,20	495,18	815,08	8.050,46	32	1	Gartner	
Plano original	52	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	CONIP JUDICIÁRIO	0,00	Sem custo	Sim	1.157,60	495,18	1.356,66	3.009,44	16	1	Conecta LATAM	
Plano original	53	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	Silicon Valley Conference	752,40	<a href="https://eventos.startse.com.br/silicon-valley-conference/">https://eventos.startse.com.br/silicon-valley-conference/</a>	Sim	578,80	495,18	815,08	2.641,46	8	1	StarSe	30.03.19
Plano original	54	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Planejamento Estratégico	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	CAU	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107</a>	Não				0,00	40	1	ENAP	
Plano original	55	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	56	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Certificação ITIL Foundation 2: Estratégias e Desenho de Serviços	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	57	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Certificação ITIL Foundation 3: Transição e Operação de Serviço	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	58	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Certificação ITIL Foundation 4: Melhoria Contínua de Serviço	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	59	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	60	1	CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Configuração de Equipamentos	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	CAU	Informática Básica	0,00		Não				0,00	40	1	Prime Cursos	
Plano original	61	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTC	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	62	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTC	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	



## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	63	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTE	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	64	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	65	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	66	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	CAROLINE ROCHA MOLINA	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Treinamento gerencial de TI	0,00		Não				0,00	40	1		Participará da turma in company que será contratada
Plano original	67	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	CELSONO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	68	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	CELSONO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	69	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	CELSONO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	70	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Segurança em Redes	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	ESI	CGTIC	SEG2 - Segurança de Redes e Sistemas de Segurança	1.920,00	<a href="https://esr.mp.br/seg2">https://esr.mp.br/seg2</a>	Não				1.920,00	40	1	ESR/RNP	
Plano original	71	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Auditoria e Forense digital	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Análise Forense de Redes	3.600,00	<a href="https://clavis.com.br/treinamentos/treinamento-presencial-seguranca-da-informacao/analise-forense-de-redes/">https://clavis.com.br/treinamentos/treinamento-presencial-seguranca-da-informacao/analise-forense-de-redes/</a>	Sim	1.398,78	495,18	815,08	6.309,04	24	1	Clavis	
Plano original	72	1	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	14º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança - PMI SP + 02 workshop	1.100,00	<a href="https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca_361402">https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca_361402</a>	Sim	1.736,40	495,18	815,08	4.146,66	24	1	PMI SP	Valor de referência de janeiro/2019
Plano original	73	2	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - SCRUM	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	PMO Ágil	1.170,00	<a href="https://www.sympla.com.br/pmo-agil-com-fabio-cruz_328056#info">https://www.sympla.com.br/pmo-agil-com-fabio-cruz_328056#info</a>	Sim	1.157,60	495,18	815,08	3.637,86	16	1	PMI SP	valor de referência do evento de 2018. Não há ainda turma aberta para 2019.
Plano original	74	3	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	Congresso Gestão de projetos - PMI RS + 1 workshop	800,00	<a href="https://pmirs.org.br/">https://pmirs.org.br/</a>	Não				800,00	16	1	PMI RS	valor estimado na contratação de 2018. Não há data ainda para 2019
Plano original	75	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	HDI SCA	1.235,00	Contratação anterior	Não				1.235,00	16	1	HDI Brasil	
Plano original	76	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	ITIL Foundation	935,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				935,00	12	1	Alfamidia	
Plano original	77	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	Atendimento ao Público com Qualidade - Turma Livre	0,00	<a href="https://ead.tr4.jus.br/enrol/index.php?id=1464">https://ead.tr4.jus.br/enrol/index.php?id=1464</a>	Não				0,00	15	1	EJ - Capacitação	
Plano original	78	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Planejamento Estratégico	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	CAU	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107</a>	Não				0,00	40	1	ENAP	
Plano original	79	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	80	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	81	1	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Gestão por objetivos e resultados - OKR	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	Conferência Gartner Data & Analytics	3.575,00		Sim	1.398,78	495,18	815,08	6.284,04	24	1	Gartner	
Plano original	82	2	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	14º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança - PMI SP + 02 workshop	1.100,00	<a href="https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca_361402">https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca_361402</a>	Sim	1.398,78	495,18	815,08	3.809,04	24	1	PMI SP	Valor de referência de janeiro/2019
Plano original	83	4	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	Congresso Gestão de projetos - PMI RS + 1 workshop	800,00	<a href="https://pmirs.org.br/">https://pmirs.org.br/</a>	Não				800,00	16	1	PMI RS	valor estimado na contratação de 2018. Não há data ainda para 2019
Plano original	84	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	CAU	Conferência e Expo HDI Brasil 2019	1.540,00	<a href="https://hdi brasil.com.br/2019/inscricoes?utm_campaign=conf_2019_-_3o_envio&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=RD+Station">https://hdi brasil.com.br/2019/inscricoes?utm_campaign=conf_2019_-_3o_envio&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=RD+Station</a>	Sim	1.157,60	495,18	815,08	4.007,86	16	1	HDI Brasil	
Plano original	85	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	CAU	Gartner Symposium IT Expo	4.425,00		Sim	2.315,20	495,18	815,08	8.050,46	32	1	Gartner	
Plano original	86	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	CAU	HDI KCS	2.173,00	Contratação anterior	Não				2.173,00	24	1	HDI Brasil	
Plano original	87	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	CAU	Conferência & Expo HDI Brasil 2019	1.540,00	<a href="https://hdi brasil.com.br/2019/inscricoes?utm_campaign=conf_2019_-_3o_envio&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=RD+Station">https://hdi brasil.com.br/2019/inscricoes?utm_campaign=conf_2019_-_3o_envio&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=RD+Station</a>	Sim	1.157,60	495,18	815,08	4.007,86	16	1	HDI Brasil	
Plano original	88	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	900,00		Não				900,00	20	1	Alura	
Plano original	89	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	90	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Maven: Build do zero a web	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	91	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SGBD	CIT	Red Hat JBoss Application Administration I	5.000,00	E-mail empresa	Não				5.000,00	40	1	Fontoura	
Plano original	92	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados PostgreSQL (básico e avançado)	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SGBD	CIT	Administração PostgreSQL com Alta Performance	1.430,00	E-mail empresa	Não				1.430,00	40	1	4Linux	EAD - Turma [6756] 09/04/2019 a 30/04/2019

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	93	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SGBD	CIT	Oracle Database 12c Workshop de Administração	5.026,00	E-mail empresa	Não				5.026,00	40	1	Fontoura	
Plano original	94	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Alura: Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvimento de Software 16h	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	95	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Conceitos avançados de segurança de informações	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Alura: Segurança Web: Vulnerabilidades do seu sistema e OWASP 8h	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	96	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Conceitos avançados de segurança de informações	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Alura: Segurança de Redes: Conheça as vulnerabilidades de servidores e clientes 10h	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	97	4	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI 10h	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	98	1	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	900,00		Não				900,00	20	1	Alura	
Plano original	99	2	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	100	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	101	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	ALURA: Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	102	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	ALURA: Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	103	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	ALURA: Azure: Gerencie Kubernetes com AKS e ACR	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	104	1	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	Git: Controle e compartilhe seu código	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	105	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	DNS: Entenda a resolução de nomes na Internet	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	106	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	CCNA Parte 3: LAN Switching Fundamentals	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	107	4	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WLAN	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes Parte 5: Wifi	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	108	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	ALURA: Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	109	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	ALURA: Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	110	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	ALURA: Azure: Gerencie Kubernetes com AKS e ACR	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	111	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	HDI SCA	1.235,00	Contratação anterior	Não				1.235,00	16	1	HDI Brasil	
Plano original	112	3	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	ITIL Foundation	935,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				935,00	12	1	Alfamidia	
Plano original	113	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	15º Congresso de Gerenciamento de Projetos PMI-RS	800,00	Contratação anterior	Não				800,00	16	1	PMI-RS	
Plano original	114	4	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	14º Seminário de Gestão, Projetos e Liderança da Serra	250,00	Contratação anterior	Não				250,00	6	1	PMI_RS	
Plano original	115	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	DO280 - OpenShift Administration I	3.600,00	<a href="https://drive.google.com/open?id=1qWKHqQcsLugYw330wq6AxBrmFFidv0F">https://drive.google.com/open?id=1qWKHqQcsLugYw330wq6AxBrmFFidv0F</a>	Não				3.600,00	24	1	Fontoura	
Plano original	116	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	DO380 - OpenShift Administration II	4.800,00	<a href="https://drive.google.com/file/d/1NngqJo6JehNk2KC8r2SWwaN10mrkMdOI/view">https://drive.google.com/file/d/1NngqJo6JehNk2KC8r2SWwaN10mrkMdOI/view</a>	Não				4.800,00	32	1	Fontoura	
Plano original	117	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	FISL 19	450,00	<a href="http://fisl18.softwarelivre.org/index.php/participantes/">http://fisl18.softwarelivre.org/index.php/participantes/</a>	Não				450,00	20	1		
Plano original	118	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	CAU	M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	119	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Métodos Ágeis: Introdução	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	120	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Agile na Prática: Técnicas aplicadas para gestão ágil	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	121	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Liderança parte 1: Seja líder no novo mercado	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	122	4	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Liderança parte 2: seja o líder que o mercado procura	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	123	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	124	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	125	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	126	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	127	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	128	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	129	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não	-	-	-	0,00	16	1	Alura	
Plano original	130	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de maquinas virtuais	0,00		Não	-	-	-	0,00	8	1	Alura	
Plano original	131	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	Ansible: Sua infraestrutura como código	0,00		Não	-	-	-	0,00	12	1	Alura	
Plano original	132	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não	-	-	-	0,00	10	1	Alura	
Plano original	133	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não	-	-	-	0,00	8	1	Alura	
Plano original	134	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Git: Controle e compartilhe seu código	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	135	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Chatbot parte 1: Começando com as conversas inteligentes usando o	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	136	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Chatbot parte 2: Avançando e integrando o bot	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	137	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em java	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	138	5	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	139	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00		Não				900,00	32	1	Alura	
Plano original	140	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00		Não				1.950,00	16	1	Toccatto	
Plano original	141	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00		Sim	1.736,40	495,18	815,08	6.621,66	24	1	Gartner	
Plano original	142	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	143	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	144	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	145	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	146	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	147	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	148	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	Jasper Reports: Relatórios com Java	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	149	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	XStream: Consumindo o XML sem esforço	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	150	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	Sass e Compass: Descomplicando o CSS	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	151	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FRANCISO FLESCHE	TÉCNICO	SM	CAU	M10961 - Automating Administration with PowerShell	2.600,00	Mail enviado para a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	152	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FRANCISO FLESCHE	TÉCNICO	SM	CAU	Git: Controle e compartilhe seu código	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	153	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	Elasticsearch: Pesquisando e analisando os seus dados	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	154	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	Elasticsearch 5: Pesquisas avançadas	0,00		Não	-	-	-	0,00	10	1	Alura	

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	155	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não	-	-	-	0,00	10	1	Alura	
Plano original	156	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WLAN	GUILHERME COSTA MACIEL	TÉCNICO	SRT	CIT	WIFUND - Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals	6.400,00	<a href="https://www.multirede.com.br/cursos/multirede/courses/switch/">https://www.multirede.com.br/cursos/multirede/courses/switch/</a>	Sim	2.331,30	495,18	815,08	10.041,56	40	1	Multirede	
Plano original	157	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	CAU	HDI KCS	2.173,00	Contratação anterior	Não				2.173,00	24	1	HDI Brasil	
Plano original	158	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	CAU	M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	159	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 1: Network Fundamentals I	900,00		Não				900,00	8	1	Alura	
Plano original	160	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 2: Network Fundamentals II	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	161	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	ROUTE - Implementing Cisco IP Routing v2.0	6.400,00	<a href="https://www.multirede.com.br/cursos/multirede/courses/route/">https://www.multirede.com.br/cursos/multirede/courses/route/</a>	Sim	2.331,30	495,18	815,08	10.041,56	40	1	Multirede	
Plano original	162	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	900,00		Não				900,00	20	1	Alura	
Plano original	163	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	164	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	165	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	JMS e ActiveMQ: Mensageria com Java	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	166	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	Redis I: Armazenando chaves e valores	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	167	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Planejamento Estratégico	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	CAU	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107</a>	Não				0,00	40	1	ENAP	
Plano original	168	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Design Thinking Experience	0,00	<a href="https://escoladesignthinking.echos.cc/">https://escoladesignthinking.echos.cc/</a>	Não				0,00	24	1	Echos	Treinamento previsto para turma in company
Plano original	169	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	ITIL - CURSO MELHORES PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI	1.500,00	<a href="http://www.sisnema.com.br/">http://www.sisnema.com.br/</a>	Não				1.500,00	32	1	Sisnema	
Plano original	170	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	900,00		Não	-	-	-	900,00	20	1	Alura	
Plano original	171	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	172	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	FISL	450,00	<a href="http://fis18.softwarelivre.org/">http://fis18.softwarelivre.org/</a>	Não				450,00	32	1		
Plano original	173	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	The Developers Conference	1.278,00	<a href="http://www.thedevelopersconference.com.br/">http://www.thedevelopersconference.com.br/</a>	Não				1.278,00	32	1		
Plano original	174	1	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Computadores servidores (instalação, manutenção)	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	ANALISTA	SRT	CIT	Oracle Linux 7: System Administration	5.026,24	<a href="http://www.berlini.com.br/treinamentos/treinamentos-oracle/sistemas-operacionais/">http://www.berlini.com.br/treinamentos/treinamentos-oracle/sistemas-operacionais/</a>	Sim	2.894,00	495,18	815,08	9.230,50	40	1	Bertine do Brasil SA	
Plano original	175	2	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	ANALISTA	SRT	CIT	Treinamento Zabbix Essenciais I - II	1.600,00	<a href="https://treinamentos.uniredenei.com.br/treinamentos/treinamento-zabbix-essenciais-i/">https://treinamentos.uniredenei.com.br/treinamentos/treinamento-zabbix-essenciais-i/</a>	Não				1.600,00	80	1	Uniredenei	
Plano original	176	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Planejamento Estratégico	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	TÉCNICO	SAU	CAU	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107</a>	Não				0,00	40	1	ENAP	
Plano original	177	1	CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Configuração de Equipamentos	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	CAU	Fundamentos de TI: Hardware e Software	0,00		Não				0,00	15	1	Fundação Bradesco	
Plano original	178	2	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e Fiscalização de Contratos	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	CAU	NOÇÕES INTRO. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINIS	0,00		Não				0,00	30	1	ENAP	
Plano original	179	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	Certificação Cisco CCNA parte 6: Infrastructure Maintenance	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	180	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	181	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	182	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	Ansible: Sua infraestrutura como código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	183	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	184	3	CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	Segurança de redes: Crie um firewall com pfSense e iptables	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	185	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	Google Cloud: Deploy de uma aplicação em Spring MVC	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	186	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Contratação de bens e serviços de TIC	2.590,00		Sim	1.398,78	495,18	815,08	5.299,04	21	1	Consultre	
Plano original	187	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Legislação sobre licitações públicas	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos	0,00		Não				0,00	30	1	ENAP	

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	188	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	LEANDRO DA SILVA PERACHI	ANALISTA	SAU	CAU	ITIL Foundation	935,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				935,00	12	1	Alfamidia	
Plano original	189	2	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	LEANDRO DA SILVA PERACHI	ANALISTA	SAU	CAU	Ética e Serviço Público	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4</a>	Não				0,00	20	1	ENAP	
Plano original	190	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	LEANDRO DA SILVA PERACHI	ANALISTA	SAU	CAU	Atendimento ao Público com Qualidade - Turma Livre	0,00	<a href="https://ead.tr4.jus.br/enrol/index.php?id=1464">https://ead.tr4.jus.br/enrol/index.php?id=1464</a>	Não				0,00	15	1	EJ - Capacitação	
Plano original	191	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00	<a href="https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-html-css">https://www.alura.com.br/curso-online-introducao-html-css</a>	Não				900,00	32	1	Alura	
Plano original	192	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00	<a href="https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada">https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada</a>	Não				1.950,00	16	1	Toccatto	
Plano original	193	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	194	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	195	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	196	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	900,00		Não	-	-	-	900,00	20	1	Alura	
Plano original	197	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não	-	-	-	0,00	20	1	Alura	
Plano original	198	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na Web	0,00		Não	-	-	-	0,00	12	1	Alura	
Plano original	199	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	PHP e MySQL II: Cookies, sessões e mais recursos	0,00		Não	-	-	-	0,00	12	1	Alura	
Plano original	200	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da Informação	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	CISM – CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER	3.645,00	<a href="https://daryus.com.br/course/cism-certified-information-security-manager/">https://daryus.com.br/course/cism-certified-information-security-manager/</a>	Sim	2.331,30	495,18	815,08	7.286,56	40	1	Daryus	
Plano original	201	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Segurança da Informação	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco	3.575,00		Sim	932,52	495,18	815,08	5.817,78	16	1	Gartner	
Plano original	202	3	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Noções de Desenvolvimento seguro	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Teste de Invasão de Aplicações Web Segurança	2.560,00	<a href="https://esr.mp.br/seg9">https://esr.mp.br/seg9</a>	Não				2.560,00	40	1	ESR/RNP	
Plano original	203	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	204	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	205	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Java parte 1: Primeiros passos	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	206	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Java parte 2: Introdução à Orientação a Objetos	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	207	5	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Design Thinking parte 1: Utilize uma metodologia de design para solucionar desafios	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	208	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00		Não				900,00	32	1	Alura	
Plano original	209	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00	<a href="https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada">https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada</a>	Não				1.950,00	16	1	Toccatto	
Plano original	210	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	Delphi para iniciantes	680,00	Assinatura para fazer os dois cursos.	Não				680,00	65	1	DEVMIIDIA	
Plano original	211	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	Como manipular XML em Delphi	0,00		Não				0,00	8	1	DEVMIIDIA	
Plano original	212	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	213	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Angular parte 1: Fundamentos	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	214	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	215	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	216	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	TÉCNICO	SAU	CAU	M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	217	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes - Parte 1	900,00		Não				900,00	10	1	Alura	
Plano original	218	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes - Parte 2	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	219	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes - Parte 3	0,00		Não				0,00	5	1	Alura	
Plano original	220	4	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes - Parte 4	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	221	5	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Redes - Segurança em Redes básico	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	222	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	223	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	224	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular parte 4: lapidando o projeto	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	225	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Webpack: Manipulando módulos na sua webapp	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	226	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	227	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	228	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	229	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	900,00		Não				900,00	16	1	Alura	
Plano original	230	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	231	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	232	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	MARCILIO MENDES SANTANA	TÉCNICO	SGE	CAU	Node.js Parte 1: Inovando com JavaScript no backend	900,00		Não				900,00	12	1	Alura	
Plano original	233	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	MARCILIO MENDES SANTANA	TÉCNICO	SGE	CAU	Node.js e HTTP: desenvolvendo uma API seguindo o estilo REST	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	234	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	MARCILIO MENDES SANTANA	TÉCNICO	SGE	CAU	JavaScript: Programando na linguagem da web	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	235	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	14º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 1 workshop	910,00	<a href="https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca__361402">https://www.sympla.com.br/14-congresso-brasileiro-de-gestao-projetos-e-lideranca__361402</a>	Sim	1.736,40	495,18	815,08	3.956,66	20	1	PMI SP	Valor de referência de janeiro/2019
Plano original	236	2	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	237	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 3: upload, build e novos componentes	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	238	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Angular parte 4: lapidando o projeto	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	239	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Webpack: Manipulando módulos na sua webapp	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	240	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	JavaScript Avançado III: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	241	1	CDS - ANALISTA DE TESTES - Recomendações de Acessibilidade	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Acessibilidade web: introdução a designs inclusivos	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	242	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Design Thinking parte 1: Utilize uma metodologia de design para solucionar desafios	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	243	3	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Design Thinking parte 2: Analise suas descobertas	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	244	4	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Design Thinking parte 3: Experimente suas ideias	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	245	5	CDS - ANALISTA DE TESTES - Interfaces de Sistemas	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Gestalt: aplicando princípios em um layout Photoshop	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	246	1	CAU - ESPECIALISTA EM HARDWARE - Configuração de Equipamentos	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	CAU	Introdução a Redes de Computadores	0,00		Não				0,00	15	1	Fundação Bradesco	
Plano original	247	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	CAU	Fundamentos de ITIL	0,00		Não				0,00	16	1	Fundação Bradesco	
Plano original	248	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	CAU	HTML - Básico	0,00		Não				0,00	11	1	Fundação Bradesco	
Plano original	249	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	250	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	251	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	252		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	Silicon Valley Conference	752,40	<a href="https://eventos.startse.com.br/silicon-valley-conference/">https://eventos.startse.com.br/silicon-valley-conference/</a>	Sim	578,80	495,18	815,08	2.641,46	8	1	StarSe	30.03.19
Plano original	253		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	Gartner Symposium IT Expo	0,00	<a href="https://www.gartner.com/pt-br/conferencias/la/symposium-brazil/register">https://www.gartner.com/pt-br/conferencias/la/symposium-brazil/register</a>	Sim	2.315,20	495,18	815,08	3.625,46	32	1	Gartner	Inscrição gratuita em razão do contrato com o Tribunal
Plano original	254		GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	Design Thinking Experience	0,00	<a href="https://escoladesignthinking.echos.cc/">https://escoladesignthinking.echos.cc/</a>	Não				0,00	24	1	Echos	Treinamento previsto para turma in company
Plano original	255	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	TÉCNICO	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00		Não				900,00	32	1	Alura	
Plano original	256	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	TÉCNICO	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00	<a href="https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada">https://site.toccatto.com.br/portfolio/qlik-sense-arquitetura-avancada</a>	Não				1.950,00	16	1	Toccatto	
Plano original	257	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	Design Thinking Experience	0,00	<a href="https://escoladesignthinking.echos.cc/">https://escoladesignthinking.echos.cc/</a>	Não				0,00	24	1	Echos	Treinamento previsto para turma in company
Plano original	258	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	Gartner Symposium IT Expo	4.425,00		Sim	2.315,20	495,18	815,08	8.050,46	32	1	Gartner	
Plano original	259	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	ITIL - CURSO MELHORES PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI	1.500,00	<a href="http://www.sisnema.com.br/">http://www.sisnema.com.br/</a>	Não				1.500,00	32	1	Sisnema	
Plano original	260	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	CAU	Treinamento gerencial de TI	0,00		Não				0,00	40	1		Participará da turma in company que será contratada

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	261	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	CIT	Infraestrutura & Gestão de Operações	3.575,00	E-mail empresa	Sim	1.157,60	195,18	815,08	5.742,86	16	1	Gartner	
Plano original	262	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	CIT	Gartner Symposium IT Expo	4.425,00	E-mail empresa	Sim	2.315,20	495,18	815,08	8.050,46	32	1	Gartner	
Plano original	263	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	CAU	M10982 - SUPPORTING AND TROUBLESHOOTING WINDOWS 10	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	264	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	CAU	M697.2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Service	2.600,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				2.600,00	40	1	Sisnema	
Plano original	265	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	CAU	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting modern	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	266	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARM	ANALISTA	SDEC	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00	<a href="https://www.gartner.com/pt-br/conferences/ia/data-analytics-brazil">https://www.gartner.com/pt-br/conferences/ia/data-analytics-brazil</a>	Sim	1.736,40	495,18	815,08	6.621,66	24	1	Gartner	
Plano original	267	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	QCon	3.000,00	<a href="https://qconsp.com/">https://qconsp.com/</a>	Sim	1.398,78	495,18	815,08	5.709,04	24	1		06, 07 e 08/05/2019
Plano original	268	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	The Developers Conference	1.278,00	<a href="http://www.thedevelopersconference.com.br/">http://www.thedevelopersconference.com.br/</a>	Não				1.278,00	24	1		
Plano original	269	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	FISL	450,00	<a href="http://fisl18.softwarelivre.org/">http://fisl18.softwarelivre.org/</a>	Não				450,00	32	1		
Plano original	270	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Design Thinking parte 1: Utilize uma metodologia de design para solucionar desafios	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	271	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Design Thinking parte 2: Analise suas descobertas	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	272	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso online de Negociação parte 1: Práticas Essenciais	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	273	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso online de Negociação parte 2: Técnicas Avançadas	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	274	1	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - SCRUM	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVSKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	Introdução a Métodos Ágeis: SCRUM	540,00	<a href="http://www.alfamidiaonline.com.br/ead-assinatura/">http://www.alfamidiaonline.com.br/ead-assinatura/</a>	Não				540,00	30	1	Alfamídia	
Plano original	275	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Mapeamento de Processos	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVSKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	Design Thinking	0,00	<a href="http://www.alfamidiaonline.com.br/ead-assinatura/">http://www.alfamidiaonline.com.br/ead-assinatura/</a>	Não				0,00	20	1	Alfamídia	
Plano original	276	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	jQuery: Domine a biblioteca mais popular do mercado	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	277	2	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	278	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	jQuery: Avance na biblioteca mais popular do mercado parte 2	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	279	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	RHJUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	CAU	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting modern	900,00		Não				900,00	20	1	Alura	
Plano original	280	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	RHJUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	CAU	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	281	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	CGTIC	Design Thinking	0,00		Não				0,00	24	1	Echos	Treinamento previsto para turma in company
Plano original	282	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	Redis I: Armazenando chaves e valores	0,00		Não				0,00	20	1	Alura	
Plano original	283	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	Redis II: Estruturas e recursos na sua base NoSQL	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	284	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	MongoDB: uma alternativa aos bancos relacionais tradicionais	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	285	4	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	Amazon VPC: Provisione uma nuvem privada	0,00		Não				0,00	6	1	Alura	
Plano original	286	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	CAU	HDI KCS	2.173,00	Contratação anterior	Não				2.173,00	24	1	HDI Brasil	
Plano original	287	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	CAU	ITIL Foundation	935,00	Contato por e-mail com a empresa	Não				935,00	12	1	Alfamídia	
Plano original	288	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	CAU	Atendimento ao Público com Qualidade - Turma Livre	0,00	<a href="https://ead.trt4.jus.br/enrol/index.php?id=1464">https://ead.trt4.jus.br/enrol/index.php?id=1464</a>	Não				0,00	15	1	EJ - Capacitação	
Plano original	289	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	290	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	Oracle SQL e PL/SQL	0,00		Não				0,00	40	1	Alura	
Plano original	291	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	TCU apex - 20 horas (gratuito)	0,00	<a href="https://contas.tcu.gov.br/ead/course/info.php?id=301&amp;lang=es">https://contas.tcu.gov.br/ead/course/info.php?id=301&amp;lang=es</a>	Não				0,00	20	1	TCU	
Plano original	292	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iQApp)	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	Qlik Sense Administração e Manutenção de Ambientes	1.375,00	Academia Toccatto	Não				1.375,00	16	1	Academia Toccatto	
Plano original	293	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iQApp)	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	Qlik Sense Arquitetura de Ambientes	1.950,00	Academia Toccatto	Não				1.950,00	16	1	Academia Toccatto	
Plano original	294	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iQApp)	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	SAP IQ Advanced Administration	3.750,00	Sybase classroom training	Sim	1.865,04	495,18	815,08	6.925,30	32	1	Sybase Classroom NYC	

## LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

## PLANEJAMENTO

## PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2019

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadoria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Valor total estimado	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações
Plano original	295	4	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de maquinas virtuais - 8h	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	296	8	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers - 8h	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	297	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração continua	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	Ansible: Sua infraestrutura como código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	298	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração continua	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	299	3	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	300	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Planejamento Estratégico	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	CAU	Planejamento Estratégico para Organizações Públicas	0,00	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107</a>	Não				0,00	40	1	ENAP	
Plano original	301	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Conhecimento em orçamento público e normas associadas	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Orçamento Público	0,00		Não				0,00	30	1	ENAP	
Plano original	302	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação	0,00		Não				0,00	30	1	ENAP	
Plano original	303	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	The Developer's Conference 2019	1.278,00	PAC 2018	Não				1.278,00	32	1	DEVCONF	
Plano original	304	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	Flexbox: Posicione elementos na tela	0,00		Não				0,00	9	1	Alura	
Plano original	305	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular parte 2: Autenticação, Forms e lazy loading	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	306	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	Progressive Web Apps: crie apps offline	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	307	1	CIS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Lógica de programação I: Os primeiros programas com Javascript e HTML	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	308	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Curso Lógica de programação II: pratique com desenhos, animações e um jogo	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	309	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	0,00		Não				0,00	14	1	Alura	
Plano original	310	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Excel II: Tabelas dinâmicas, validação e mais funções	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	311	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Storytelling: contar histórias para se conectar	717,25	<a href="https://www.espm.br/educacao_continuada/storytelling-contar-historias-para-se-conectar/">https://www.espm.br/educacao_continuada/storytelling-contar-historias-para-se-conectar/</a>	Não				717,25	16	1	ESPM	
Plano original	312	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Oracle Application Express – APEX 18.1	730,77		Não				730,77	20	1	TargetTrust	Treinamento in company para 13 pessoas
Plano original	313	3	SETIC - SECRETARIA - Sistemas utilizados no TRT	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Business Intelligence: Introdução à inteligência empresarial	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	Não é necessário renovar a assinatura do Alura
Plano original	314	4	SETIC - SERVIDOR SETIC - Comunicação	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Introdução a Pitch: o primeiro passo para apresentações de impacto	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	Não é necessário renovar a assinatura do Alura
Plano original	315	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Congresso de Gerenciamento de Projetos	800,00	<a href="https://pmirs.org.br/">https://pmirs.org.br/</a>	Não				800,00	16	1	PMI	
Plano original	316	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	FISL	450,00	<a href="http://fis18.softwarelivre.org/">http://fis18.softwarelivre.org/</a>	Não				450,00	32	1		
Plano original	317	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	The Developers Conference	1.278,00	<a href="http://www.thedevelopersconference.com.br/">http://www.thedevelopersconference.com.br/</a>	Não				1.278,00	24	1		
Plano original	318	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Introdução a HTML e CSS	900,00		Não				900,00	32	1	Alura	
Plano original	319	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Arquitetura Avançada de QlikSense	1.950,00	<a href="https://site.toccatto.com.br/portofolio/qlik-sense-arquitetura-avancada">https://site.toccatto.com.br/portofolio/qlik-sense-arquitetura-avancada</a>	Não				1.950,00	16	1	Toccatto	
Plano original	320	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				0,00	16	1	Alura	
Plano original	321	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	Vagrant e Puppet: Criação e provisionamento de maquinas virtuais	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	322	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	Ansible: Sua infraestrutura como código	0,00		Não				0,00	12	1	Alura	
Plano original	323	4	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	324	5	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	
Plano original	325	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tom cat	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	JB248 - Red Hat JBoss Application Administration I	5.175,00		Não				5.175,00	40	1	Fontoura	
Plano original	326	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				0,00	10	1	Alura	
Plano original	327	3	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				0,00	8	1	Alura	



**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2019**  
**RESUMO POR SERVIDOR**

Nº	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Valor Estimado		Valor total	Carga Horária Presencial / EAD
					Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento		
0	TURMA IN COMPANY	-	-	125	144.940,00	0,00	144.940,00	853
1	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	SDEC	CDS	2	2.850,00	0,00	2.850,00	48
2	ADRIANO SIMIONI	SST	CIT	4	800,00	0,00	800,00	60
3	ALAN DIEGO DOS SANTOS	SDEC	CDS	3	2.698,00	0,00	2.698,00	178
4	ALBERTO DANIEL MULLER	CGTIC	CGTIC	3	4.425,00	9.644,34	14.069,34	64
5	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	SM	CAU	2	0,00	0,00	0,00	50
6	ALEX RISCATO FAGUNDES	CIS	CIS	3	1.313,25	0,00	1.313,25	41
7	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	SJUD	CDS	4	1.630,77	0,00	1.630,77	52
8	ALEXANDRE DIEFENTHALER	SGE	CAU	4	0,00	0,00	0,00	50
9	ALEXANDRE KUPAC	SGE	CAU	3	0,00	0,00	0,00	49
10	ALISSON MOSCATO LOY	SAU	CAU	1	2.600,00	0,00	2.600,00	40
11	ANA LUCIA MOREIRA	SM	CAU	1	0,00	0,00	0,00	24
12	ANDERSON MEDEIROS GOMES	SST	CIT	2	10.350,00	0,00	10.350,00	80
13	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	SJUD	CDS	2	1.278,00	0,00	1.278,00	40
14	ANDRE LUZ LIVI	SST	CIT	2	450,00	0,00	450,00	40
15	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	SJUD	CDS	7	900,00	0,00	900,00	43
16	ANDRE SOARES FARIAS	CDS	CDS	4	8.752,40	11.570,62	20.323,02	80
17	ANNA KARINA QUEIROZ	SAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
18	BEATRIZ EVA VIANNA WERNER	SACTIC	CGTIC	0	0,00	0,00	0,00	0
19	BRUNO SCHMIDT MARQUES	SST	CIT	5	0,00	0,00	0,00	50
20	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	SGE	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
21	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
22	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	SST	CIT	2	0,00	0,00	0,00	40
23	CAROLINE ROCHA MOLINA	SACTIC	CGTIC	1	0,00	0,00	0,00	40
24	CELSON MUNHOZ SCHMIDT	SADM	CDS	3	730,77	0,00	730,77	44
25	CHARLES FERREIRA FALCÃO	ESI	CGTIC	2	5.520,00	2.709,04	8.229,04	64
26	CINTIA FRIGO PETUCO	EP	CGTIC	3	3.070,00	5.514,52	8.584,52	56
27	DANIEL FRAGA VIEIRA	SAU	CAU	3	2.170,00	0,00	2.170,00	43
28	DANIEL LAZZAROTTO	SAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
29	DAVI CRUZ CAMPANHER	SST	CIT	2	0,00	0,00	0,00	40
30	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	EP	CGTIC	3	5.475,00	5.418,08	10.893,08	64
31	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	CAU	CAU	2	5.965,00	6.093,32	12.058,32	48
32	DIEGO FRAGA CONTESSA	SAU	CAU	2	3.713,00	2.467,86	6.180,86	40
33	DINEI ANDRE ROCKENBACH	SM	CAU	3	900,00	0,00	900,00	42
34	DIOGO PIRES GILI	SGBD	CIT	3	11.456,00	0,00	11.456,00	120
35	EDSON ELNEI LEHR	SGBD	CIT	4	0,00	0,00	0,00	44
36	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	SRT	CIT	3	900,00	0,00	900,00	40
37	ERIC GUATIMOZIN SILVA	SGBD	CIT	3	0,00	0,00	0,00	42
38	ERNANI SOARES KERN	SRT	CIT	4	900,00	0,00	900,00	42
39	EVANDRO BASSANESI	SGBD	CIT	3	0,00	0,00	0,00	42
40	EVERTON RAFAEL POLINA	SAU	CAU	4	3.220,00	0,00	3.220,00	50
41	FABIANO MARTINS	SST	CIT	3	8.850,00	0,00	8.850,00	76
42	FABIANO MOREIRA CORREA	SAU	CAU	1	2.600,00	0,00	2.600,00	40
43	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	SPE	CDS	4	0,00	0,00	0,00	40
44	FABRICIO COSTA DA SILVA	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
45	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	SADM	CDS	3	730,77	0,00	730,77	48
46	FELIPE BOHM DA CUNHA	SST	CIT	5	0,00	0,00	0,00	54
47	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	SM	CAU	5	900,00	0,00	900,00	58
48	FELIPE HOPPE LEVIN	SDEC	CDS	3	6.425,00	3.046,66	9.471,66	72
49	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
50	FELIPE NUNES FLORES	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
51	FERNANDO TREBIEN	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
52	FRANCISO FLESCH	SM	CAU	2	3.500,00	0,00	3.500,00	56
53	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	SST	CIT	3	0,00	0,00	0,00	40
54	GUILHERME COSTA MACIEL	SRT	CIT	1	6.400,00	3.641,56	10.041,56	40
55	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	SAU	CAU	2	4.773,00	0,00	4.773,00	64
56	GUILHERME WOLF WANDER	SRT	CIT	3	7.300,00	3.641,56	10.941,56	56
57	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	SRT	CIT	2	900,00	0,00	900,00	40
58	ISMAEL STANGHERLINI	SM	CAU	3	0,00	0,00	0,00	52
59	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	SAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
60	JANINA ALVES FAGUNDES	CIS	CIS	2	1.500,00	0,00	1.500,00	56
61	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	SST	CIT	2	900,00	0,00	900,00	40
62	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	SPORT	CDS	2	1.728,00	0,00	1.728,00	64
63	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	SRT	CIT	2	6.626,24	4.204,26	10.830,50	120
64	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	SAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
65	JOSE LUIS BORGES	SGE	CAU	2	0,00	0,00	0,00	45
66	JULIANO SIEBEL	SRT	CIT	3	0,00	0,00	0,00	48
67	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	SRT	CIT	4	0,00	0,00	0,00	42
68	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	SACTIC	CGTIC	2	2.590,00	2.709,04	5.299,04	51
69	LEANDRO DA SILVA PERACHI	SAU	CAU	3	935,00	0,00	935,00	47

70	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	SDEC	CDS	2	2.850,00	0,00	2.850,00	48
71	LEANDRO ZULIAN GALLINA	SPE	CDS	3	0,00	0,00	0,00	40
72	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	SST	CIT	4	900,00	0,00	900,00	64
73	LUCAS POZATTI	ESI	CGTIC	3	9.780,00	5.884,34	15.664,34	96
74	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	SJUD	CDS	5	730,77	0,00	730,77	57
75	LUCIANA KARST PASSOS	SDEC	CDS	2	2.850,00	0,00	2.850,00	48
76	LUCIANO CIPRIANI	SGE	CAU	2	680,00	0,00	680,00	73
77	LUCIANO PETTER	SJUD	CDS	4	1.630,77	0,00	1.630,77	60
78	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	SAU	CAU	1	2.600,00	0,00	2.600,00	40
79	LUIS CARLOS PORTO	SRT	CIT	5	900,00	0,00	900,00	43
80	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	SJUD	CDS	4	0,00	0,00	0,00	42
81	MARCELO ZAMBIASI	SADM	CDS	3	1.630,77	0,00	1.630,77	48
82	MARCIA DE LIMA COSTA	SADM	CDS	3	1.630,77	0,00	1.630,77	48
83	MARCILIO MENDES SANTANA	SGE	CAU	3	900,00	0,00	900,00	48
84	MARCIO BYSTRONSKI	SADM	CDS	2	1.640,77	3.046,66	4.687,43	40
85	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	SPE	CDS	4	0,00	0,00	0,00	42
86	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	SPE	CDS	5	0,00	0,00	0,00	41
87	MARINA ANDRE GONZALEZ	SGE	CAU	3	0,00	0,00	0,00	42
88	MICHEL BARRETO DA SILVA	SADM	CDS	3	730,77	0,00	730,77	46
89	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	SETIC	SETIC	3	752,40	5.514,52	6.266,92	64
90	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	SDEC	CDS	2	2.850,00	0,00	2.850,00	48
91	PABLO PAULO LOPES BARROS	CIS	CIS	3	5.925,00	3.625,46	9.550,46	88
92	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	SGE	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
93	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	CIT	CIT	2	8.000,00	5.793,32	13.793,32	48
94	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	SAU	CAU	1	2.600,00	0,00	2.600,00	40
95	PAULO RICARDO RITTER	SM	CAU	2	2.600,00	0,00	2.600,00	60
96	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	SDEC	CDS	1	3.575,00	3.046,66	6.621,66	24
97	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	SPORT	CDS	3	4.728,00	2.709,04	7.437,04	80
98	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	SPE	CDS	4	0,00	0,00	0,00	40
99	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	EPROC	CGTIC	2	540,00	0,00	540,00	50
100	RENATO BATISTA DE MORAES	SADM	CDS	3	730,77	0,00	730,77	44
101	RHUAN PAULO LOPES BARROS	SM	CAU	2	900,00	0,00	900,00	40
102	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	EPROC	CGTIC	1	0,00	0,00	0,00	24
103	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	SGBD	CIT	4	0,00	0,00	0,00	42
104	ROBERTO WEISS	SAU	CAU	3	3.108,00	0,00	3.108,00	51
105	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	SPORT	CDS	3	730,77	0,00	730,77	80
106	RODRIGO ZARTH	SGBD	CIT	5	7.075,00	3.175,30	10.250,30	80
107	RUBILAR DA SILVA JARDIM	SADM	CDS	3	730,77	0,00	730,77	40
108	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	SAU	CAU	1	0,00	0,00	0,00	40
109	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	SACTIC	CGTIC	2	0,00	0,00	0,00	60
110	STEFANO DRIMON KURZ MOR	SJUD	CDS	4	1.278,00	0,00	1.278,00	61
111	THALES ANTUNES SOFFIATTI	CIS	CIS	4	0,00	0,00	0,00	48
112	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	CIS	CIS	4	1.448,02	0,00	1.448,02	56
113	TIAGO DA SILVA SUTILI	SPORT	CDS	3	2.528,00	0,00	2.528,00	72
114	TIAGO GOMES SANTOS	SDEC	CDS	2	2.850,00	0,00	2.850,00	48
115	VOLNEI CESAR SUSIN	SST	CIT	5	0,00	0,00	0,00	54
116	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	SST	CIT	3	5.175,00	0,00	5.175,00	58

**PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2019**  
**RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA**

Secretaria / Coord.	Seção	Nº Servidores	Nº Vagas	PLANEJAMENTO INICIAL					
				Treinamento	Díarias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Valor total	Carga Horária Presencial / EAD		
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SETIC	1	3	752,40	5.514,52	6.266,92	64	
CGTIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	CGTIC	1	3	4.425,00	9.644,34	14.069,34	64	
	Escritório de Processos de TI	EPROC	2	3	540,00	0,00	540,00	74	
	Escritório de Projetos de TIC	EP	2	6	8.545,00	10.932,60	19.477,60	120	
	Escritório de Segurança da Informação	ESI	2	5	15.300,00	8.593,38	23.893,38	160	
	Seção de Apoio a Contratações de TIC	SACTIC	4	5	2.590,00	2.709,04	5.299,04	151	
CIS	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	CIS	5	16	10.186,27	3.625,46	13.811,73	289	
CAU	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	CAU	1	2	5.965,00	6.093,32	12.058,32	48	
	Seção de Atendimento a Usuários	SAU	15	26	28.319,00	2.467,86	30.786,86	655	
	Seção de Gerenciamento de Equipamentos	SGE	8	19	1.580,00	0,00	1.580,00	387	
	Seção de Microinformática	SM	8	20	8.800,00	0,00	8.800,00	382	
CDS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CDS	1	4	8.752,40	11.570,62	20.323,02	80	
	Seção de Sistemas de Apoio à Decisão	SDEC	8	17	26.948,00	6.093,32	33.041,32	514	
	Seção de Sistemas Judiciais	SJUD	7	30	7.448,31	0,00	7.448,31	355	
	Seção de Sistemas de Processo Eletrônico	SPE	10	35	0,00	0,00	0,00	403	
	Seção de Sistemas Administrativos	SADM	8	23	8.556,16	3.046,66	11.602,82	358	
	Seção de Portais Corporativos	SPORT	4	11	9.714,77	2.709,04	12.423,81	296	
CIT	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	CIT	1	2	8.000,00	5.793,32	13.793,32	48	
	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	SGBD	6	22	18.531,00	3.175,30	21.706,30	370	
	Seção de Redes e Telecomunicações	SRT	9	27	23.926,24	11.487,38	35.413,62	471	
	Seção de Suporte Técnico	SST	13	42	27.425,00	0,00	27.425,00	696	
-	TURMA IN COMPANY	A DEFINIR	-	125	144.940,00	0,00	144.940,00	853	
			<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>446</b>	<b>R\$ 371.244,55</b>	<b>R\$ 93.456,16</b>	<b>R\$ 464.700,71</b>	<b>6838</b>
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 464.700,71</b>			
					<b>CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR</b>	<b>58,95</b>			

ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018 - EXECUÇÃO















PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2018  
LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

Table with columns: Origem, ID, Ordem de preferência, Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário, Nome servidor, Cargo, Secao, Coordenadoria, Nome do treinamento, Valor estimado treinamento, Origem Valor Estimado, Fora do Estado?, Valor estimado diárias, Valor estimado adicional deslocamento, Valor estimado passagens, Carga horaria, Vagas, Possível Fornecedor, Observações, Relacionado ao PJe?, Nome do treinamento, Carga-horária, Vagas, Valor treinamento, Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens, PA, Data encerramento, Status.

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC – 2018  
LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

Origem	ID	Ordem de preferência	Coordenadoria - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordenadora	PLANEJAMENTO										EXECUÇÃO									
								Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diárias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens	Carga horária	Vagas	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao PJe? (Eventamento Escola Judicial)	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Data encerramentamento	Status
Incluído	322	1	CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Desenvolvimento de Software	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	0,00		Sim	1.157,80	495,18	1.300,00	16	1	CSJT	Ofício do CSJT somente haverá custos com diárias e passagens - 13 a 15 junho	PJe	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	16	1	RS 0,00	RS 3.497,54	4114-19	06/06/18	Realizado
Incluído	323	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Riscos	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	2.560,00	Site da empresa	Não			40	1	ESRRNP	Treinamento incluído devido mudança de lotação do servidor https://esr.rnp.br/g9i9		OK - Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005	40	1	RS 2.560,00		5177-79	11/07/18	Realizado	
Incluído	324	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATOS	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Gestão e Fiscalização de Contratos	0,00	EAD sem custo	Não			40	1	ENAP	servidora nova		Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	40	1	RS 0,00				Realizado	
Incluído	325	1	SETIC - SECRETARIA - Br Office	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Br Office Calc Básico e Avançado	0,00	EAD sem custo	Não			10	1	ESCOLA JUDICIAL	servidora nova		Br Office Calc Básico e Avançado	10	1	RS 0,00				Realizado	
Incluído	326	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATOS	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Curso Avançado de Licitação TI em conformidade com a IN 04/2014 e a Jurisprudência do TCU	2.590,00	Orçamento por e-mail	SIM	1.398,76	495,18	1.300,00	24	1	One Cursos	servidora nova		Curso Avançado de Licitação TI em conformidade com a IN 04/2014 e a Jurisprudência do TCU	24	1	RS 2.590,00	RS 3.310,21	6717-65	29/08/18	Realizado
Incluído	327	1	CIT - SERVIDOR CIT - Redes conceitos	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna e PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	900,00	e-mail empresa	Não			40	1	Alura	Treinamento incluído em substituição do treinamento na tecnologia Citrix cancelado em função da incerteza de continuidade da solução Citrix		Assinatura anual Alura - Treinamento será realizado em 2019			RS 900,00		8046-15	23/10/18	Não realizado	
Incluído	328	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Língua	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	The Developers Conference	1.216,00		Não			32	1	DEVCONF	Considerando a relevância do evento "The Developers Conference" e a vinculação das atribuições e o interesse técnico de servidores da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, gestor solicita inclusão no Plano de Capacitação		The Developers Conference	32	1	RS 1.278,00		8030-61	05/11/18	Realizado	
Incluído	329	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Língua	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	CDS	The Developer Conference	1.216,00		Não			32	1	DEVCONF	Considerando a relevância do evento "The Developers Conference" e o interesse técnico de servidores da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, gestor solicita inclusão no Plano de Capacitação		The Developers Conference	32	1	RS 1.278,00		8030-61	05/11/18	Realizado	
Incluído	330	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	ANALISTA	SJUD	CDS	The Developer Conference	1.349,00		Não			32	1		E-mail do coordenador autorizando a substituição (Anderson para Alexandre)		The Developers Conference	32	1	RS 1.278,00		8030-61	05/11/18	Realizado	
Incluído	331	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	SAU	Linux I - Conhecendo e utilizando o Terminal - 4 horas Linux II - Programas, processos e pacotes - 8 horas	0,00		Não			12	1		Servidor trocou de lotação		Linux I - Conhecendo e utilizando o Terminal - 4 horas Linux II - Programas, processos e pacotes - 8 horas	12	1	RS 0,00		-	-	Realizado	
Incluído	332	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	SAU	Docker - Criando containers sem dor de cabeça Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não						Servidor trocou de lotação		Docker: Criando containers sem dor de cabeça Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	18	1	RS 0,00				Realizado	
Incluído	333	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	SAU	Oracle sql e pl/sql	0,00		Não			40	1		Servidor trocou de lotação		Oracle sql e pl/sql	40	1	RS 0,00		-	-	Realizado	
Incluído	334	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	0,00		sim			1			Ofício do CSJT somente haverá custos com diárias e passagens - coticar a data e ofício	PJe	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	18	1	RS 0,00	RS 2.980,48	8780-63		Realizado	
Incluído	335	1	CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Desenvolvimento de Software	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	0,00		sim			1			Ofício do CSJT somente haverá custos com diárias e passagens - COLOCAR ADATA	PJe	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	18	1	RS 0,00	RS 2.980,48	8780-63		Realizado	
Incluído	336	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados (PostgreSQL (básico e avançado)	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	0,00		sim			1			Ofício do CSJT somente haverá custos com diárias e passagens - COLOCAR ADATA	PJe	II Encontro de Fomento ao Desenvolvimento do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	18	1	RS 0,00	RS 2.980,48	8780-63		Realizado	
Incluído	337	1	CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	4.000,00		sim	2.894,00	1.300,00	40	1		Treinamento incluído na contratação de Firewall		Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	40	1	RS 4.000,00	RS 3.971,51	5764-38		Realizado	
Incluído	338	1	CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	4.000,00		sim	2.331,30	1.300,00	40	1		Treinamento incluído na contratação de Firewall		Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	40	1	RS 4.000,00	RS 3.971,51	5764-38		Realizado	
Incluído	339	1	CIT - ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Firewall	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	4.000,00		sim	2.894,00	1.300,00	40	1		Treinamento incluído na contratação de Firewall		Course CCSA - Check Point Security Administration R80.10	40	1	RS 4.000,00	RS 4.386,81	5764-38		Realizado	
Incluído	340	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	RS 2.700,00		não			32	1		Treinamento incluído na contratação de Solução de Otimização de Rede WAN		SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	32	1	RS 2.700,00		9647-56		Realizado	
Incluído	341	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	RS 2.700,00		não			32	1		Treinamento incluído na contratação de Solução de Otimização de Rede WAN		SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	32	1	RS 2.700,00		9647-56		Realizado	
Incluído	342	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	RS 2.700,00		não			32	1		Treinamento incluído na contratação de Solução de Otimização de Rede WAN		SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	32	1	RS 2.700,00		9647-56		Realizado	
Incluído	343	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	JOAO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNACAO	ANALISTA	SRT	CIT	SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	RS 2.700,00		não			32	1		Treinamento incluído na contratação de Solução de Otimização de Rede WAN		SOLUÇÃO OTIMIZAÇÃO REDE WAN	32	1	RS 2.700,00		9647-56		Realizado	

TOTAL TREINAMENTOS PLANO ORIGINAL	5.514	326	RS 208.074,07	RS 57.030,20
TOTAL TREINAMENTOS INCLUIDOS REVISÃO	722	29	RS 33.476,00	RS 47.020,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.236</b>	<b>355</b>	<b>RS 241.550,07</b>	<b>RS 104.050,43</b>
				<b>RS 345.609,60</b>

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

RESUMO POR SERVIDOR

Nº	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária Presencial / EAD
					Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
1	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
2	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	4	2.130,00	0,00	44
3	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	4	0,00	0,00	60
4	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	2	3.100,00	2.727,70	32
5	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	2	0,00	0,00	40
6	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	4	2.515,00	0,00	72
7	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	3	0,00	0,00	50
8	ALEXANDRE DIEFENTHALER	TÉCNICO	SGE	3	630,00	0,00	40
9	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	4	0,00	0,00	40
10	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	2	2.173,00	0,00	44
11	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	2	6.743,00	0,00	64
12	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	2	5.430,00	0,00	40
13	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	5	1.846,00	0,00	76
14	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	2	5.430,00	0,00	40
15	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	4	0,00	0,00	60
16	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	2	7.825,00	7.641,96	56
17	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
18	ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS	ANALISTA	SAU	3	960,00	0,00	56
19	BEATRIZ EVA VIANNA WERNER	ANALISTA	SACTIC	1	0,00	0,00	40
20	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
21	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	3	0,00	0,00	40
22	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	48
23	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	1	2.500,00	0,00	40
24	CAROLINE ROCHA MOLINA	TÉCNICO	SACTIC	1	0,00	0,00	42
25	CELSO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	4	630,00	0,00	44
26	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
27	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	2	3.272,00	3.531,58	40
28	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	1	69,90	0,00	40
29	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
30	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	1	8.836,00	4.689,18	40
31	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	2	3.272,00	3.193,96	40
32	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	1	4.250,00	3.661,22	32
33	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	2	2.793,00	0,00	44
34	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	4	2.600,00	0,00	62
35	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	1	500,00	0,00	80
36	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	3	2.730,00	0,00	58
37	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	1	2.600,00	0,00	40
38	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	3	2.730,00	0,00	58
39	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	2	1.750,00	0,00	40
40	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	4	5.830,00	0,00	74
41	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	2	3.273,00	0,00	48
42	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	2	4.870,00	0,00	40
43	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	3	1.235,00	0,00	56
44	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	6	630,00	0,00	32
45	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	4	630,00	0,00	42
46	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	4	630,00	0,00	64
47	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	1	4.680,00	4.689,18	40
48	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	3	2.600,00	0,00	74
49	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	4	6.829,17	3.531,58	72
50	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	45
51	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	3	630,00	0,00	42
52	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	5	3.030,00	3.531,58	74
53	FRANCISO FLESCH	TÉCNICO	SM	1	2.200,00	0,00	40
54	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
55	GUILHERME COSTA MACIEL	TÉCNICO	SRT	1	5.300,00	4.126,48	40
56	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	2	1.080,00	0,00	44
57	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	2	3.560,00	0,00	56
58	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	3	2.630,00	0,00	72
59	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	3	630,00	0,00	48
60	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
61	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	3	5.230,00	0,00	72
62	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	1	3.900,00	0,00	80
63	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	4	1.130,00	0,00	72
64	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNÇÃO	ANALISTA	SRT	1	1.920,00	0,00	40

TREINAMENTOS EXECUTADOS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO INICIAL			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
2	1.304,17	0,00	32
3	1.534,00	0,00	34
4	0,00	0,00	60
3	4.413,14	4.237,61	52
2	0,00	0,00	40
4	2.715,00	0,00	72
3	0,00	0,00	50
3	765,00	0,00	40
4	0,00	0,00	70
2	2.454,99	0,00	40
2	6.743,00	0,00	64
2	5.565,00	0,00	40
4	765,00	0,00	44
2	5.565,00	0,00	40
4	0,00	0,00	60
3	4.238,14	6.316,57	54
1	0,00	0,00	20
2	0,00	0,00	36
1	0,00	0,00	40
2	765,00	0,00	40
1	0,00	0,00	20
4	765,00	0,00	48
0	765,00	0,00	0
1	0,00	0,00	12
4	765,00	0,00	40
0	0,00	0,00	0
2	2.839,00	2.956,07	42
1	0,00	0,00	60
2	0,00	0,00	40
0	0,00	1.588,85	0
1	769,00	0,00	18
2	5.254,81	3.072,37	38
3	3.631,14	0,00	60
4	2.500,00	0,00	62
0	0,00	0,00	0
3	765,00	0,00	58
1	2.300,00	0,00	40
2	765,00	0,00	50
3	2.688,14	0,00	64
4	765,00	0,00	74
2	2.704,99	945,97	34
1	765,00	0,00	8
2	1.693,00	0,00	36
7	1.603,14	0,00	48
4	765,00	0,00	42
3	765,00	0,00	48
0	900,00	951,85	0
3	2.500,00	0,00	74
3	4.704,17	3.244,20	48
4	765,00	0,00	45
3	765,00	0,00	42
5	2.174,00	0,00	77
1	1.800,00	0,00	40
1	1.603,14	0,00	16
1	4.200,00	4.350,43	40
2	1.190,00	0,00	44
2	3.560,00	0,00	56
3	2.700,00	0,00	72
3	765,00	0,00	48
1	0,00	0,00	20
3	5.365,00	0,00	72
1	3.600,00	0,00	80
4	1.215,00	0,00	80
0	0,00	0,00	0

TREINAMENTOS EXECUTADOS INCLUÍDOS POSTERIORMENTE (*)			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
1	1.278,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	1.278,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	4.000,00	3.971,51	40
0	0,00	0,00	0
1	4.000,00	4.386,81	40
0	0,00	0,00	0
2	0,00	6.478,02	34
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	4.000,00	3.971,51	40
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	900,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
2	0,00	4.913,81	29
1	2.700,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	0,00	1.933,33	11
0	0,00	0,00	0
1	0,00	2.980,48	18
1	0,00	3.497,54	16
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	2.700,00	0,00	32
1	2.700,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	2.700,00	0,00	32

(\*) Cabe destacar que a totalidade dos treinamentos incluídos após o planejamento inicial atendem às diretrizes de elaboração do PAC e se vinculam totalmente aos perfis técnicos dos servidores. A maioria desses treinamentos atendem a demandas de ações do CSJT, contratações de soluções de TIC e mudanças de servidores entre as áreas da SETIC.

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

RESUMO POR SERVIDOR

Nº	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária Presencial / EAD
					Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
65	JOICE PAVEK FIGUEIRO	ANALISTA	SPORT	2	1.080,00	0,00	40
66	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	TÉCNICO	SAU	1	69,90	0,00	60
67	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	1	0,00	0,00	40
68	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	2	3.840,00	0,00	80
69	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	2	3.310,00	0,00	80
70	KAREN DE SOUZA DEL MAURO	TÉCNICO	SACTIC	0	0,00	0,00	0
71	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
72	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	48
73	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	1	3.900,00	0,00	80
74	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	2	4.118,30	2.727,70	37
75	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	4	630,00	0,00	41
76	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
77	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	3	0,00	0,00	40
78	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	3	0,00	0,00	48
79	LUCIO BISSO TEIXEIRA	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
80	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
81	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	2	4.000,00	0,00	80
82	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	4	630,00	0,00	44
83	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	2	1.835,80	0,00	80
84	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	2	838,80	0,00	52
85	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	3	0,00	0,00	48
86	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	3	630,00	0,00	52
87	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	7	630,00	0,00	44
88	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	1	0,00	0,00	42
89	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	3	630,00	0,00	45
90	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	3	12.595,00	6.854,18	68
91	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
92	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	4	6.070,00	6.387,92	80
93	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	3	0,00	0,00	66
94	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	2	7.825,00	6.387,92	48
95	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	3	960,00	0,00	56
96	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	2	2.830,00	0,00	45
97	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	ANALISTA	SDEC	1	3.575,00	3.531,58	24
98	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	TÉCNICO	SPORT	3	1.130,00	0,00	76
99	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	7	630,00	0,00	49
100	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	ANALISTA	EPROC	3	990,00	0,00	56
101	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	1	630,00	0,00	20
102	RHUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	1	2.600,00	0,00	40
103	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	1	3.515,00	5.455,40	32
104	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	2	5.830,00	0,00	56
105	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
106	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	3	1.080,00	0,00	49
107	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	1	2.100,00	0,00	40
108	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	2	630,00	0,00	21
109	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	3	1.235,00	0,00	56
110	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	2	0,00	0,00	60
111	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	2	1.846,00	0,00	50
112	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	4	2.720,00	0,00	68
113	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	4	3.250,00	0,00	76
114	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	7	1.630,00	0,00	48
115	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	4	3.889,58	0,00	64
116	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
117	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	2	5.430,00	0,00	40
0	GESTORES	-	-	40	60.000,00	0,00	800
0	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O QLIK	-	-	0	14.814,58	0,00	0

342 332.006,70 72.668,12 6790

TREINAMENTOS EXECUTADOS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO INICIAL			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
2	1.215,00	0,00	40
1	0,00	0,00	10
1	0,00	0,00	40
1	765,00	0,00	40
2	765,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
2	1.304,17	0,00	32
4	765,00	0,00	48
1	3.600,00	0,00	80
1	3.400,00	2.048,19	16
5	1.603,14	0,00	73
2	1.304,17	0,00	32
3	0,00	0,00	40
3	0,00	0,00	30
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	1.980,00	0,00	40
4	765,00	0,00	42
2	838,80	0,00	47
2	838,80	0,00	52
3	0,00	0,00	40
3	765,00	0,00	52
6	765,00	0,00	40
0	0,00	0,00	0
3	765,00	0,00	45
3	2.150,00	6.696,66	54
2	1.304,17	0,00	32
4	6.819,18	4.699,98	84
4	838,14	0,00	56
3	8.829,81	5.039,22	54
3	0,00	0,00	42
2	2.565,00	0,00	45
1	3.400,00	3.244,20	16
3	1.215,00	0,00	72
7	765,00	0,00	49
4	838,14	0,00	56
2	765,00	0,00	36
1	2.500,00	0,00	40
1	838,14	0,00	16
4	765,00	0,00	74
0	0,00	0,00	0
3	1.215,00	0,00	44
1	900,00	0,00	42
3	1.603,14	0,00	37
2	1.693,00	0,00	36
0	0,00	0,00	0
3	2.043,00	0,00	56
3	1.415,00	0,00	36
4	1.415,00	0,00	72
5	2.372,14	0,00	50
3	1.939,59	0,00	48
2	765,00	0,00	40
2	5.565,00	0,00	40
49	9.800,00	7.647,03	692
0	14.814,58	0,00	0

326 208.074,07 57.039,20 5514

(\*) Cabe destacar que a totalidade dos treinamentos incluídos após o planejamento inicial atendem às diretrizes de elaboração do PAC e se vinculam totalmente aos perfis técnicos dos servidores. A maioria desses treinamentos atendem a demandas de ações do CSJT, contratações de soluções de TIC e mudanças de servidores entre as áreas da SETIC.

TREINAMENTOS EXECUTADOS INCLUIDOS POSTERIORMENTE (*)			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	0,00	0,00	20
3	2.590,00	3.310,21	74
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
2	792,00	3.888,18	20
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
1	0,00	4.191,29	30
1	1.278,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0

29 33.476,00 47.020,23 722

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

Secretaria / Coord.	Seção	Nº Servidores	Nº Vagas	PLANEJAMENTO INICIAL			
				Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD	
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SETIC	1	3	12.595,00	6.854,18	68
CGTIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	CGTIC	1	2	3.100,00	2.727,70	32
	Escritório de Processos de TI	EPROC	2	4	4.505,00	5.455,40	88
	Escritório de Projetos de TIC	EP	2	4	6.544,00	6.725,54	80
	Escritório de Segurança da Informação	ESI	1	2	4.118,30	2.727,70	37
	Seção de Apoio a Contratações de TIC	SACTIC	4	4	0,00	0,00	142
CIS	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	CIS	5	19	19.785,00	6.387,92	368
	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	CAU	1	1	4.250,00	3.860,22	32
CAU	Seção de Atendimento a Usuários	SAU	18	34	15.848,80	0,00	984
	Seção de Gerenciamento de Equipamentos	SGE	7	18	630,00	0,00	308
	Seção de Microinformática	SM	8	18	20.203,00	0,00	413
CDS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CDS	1	2	7.825,00	7.641,96	56
	Seção de Sistemas de Apoio à Decisão	SDEC	8	25	27.310,42	7.063,16	412
	Seção de Sistemas Judiciais	SJUD	7	25	4.952,00	0,00	369
	Seção de Sistemas de Processo Eletrônico	SPE	10	47	8.700,00	3.531,58	476
	Seção de Sistemas Administrativos	SADM	8	21	5.824,60	0,00	374
CIT	Seção de Portais Corporativos	SPORT	5	19	6.050,00	0,00	285
	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	CIT	1	2	7.825,00	6.387,92	48
	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	SGBD	5	13	19.220,00	0,00	286
	Seção de Redes e Telecomunicações	SRT	9	16	28.910,00	4.126,48	528
-	Seção de Suporte Técnico	SST	13	23	48.996,00	9.378,36	604
-	GESTORES	GESTORES	-	40	60.000,00	0,00	800
-	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O CLIK	OUTRAS ÁREAS	-	-	14.814,58	0,00	0
<b>TOTAL</b>			<b>117</b>	<b>342</b>	<b>R\$ 332.006,70</b>	<b>R\$ 72.668,12</b>	<b>6790</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 404.674,82</b>		
<b>CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR</b>					<b>58,03</b>		

TREINAMENTOS EXECUTADOS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO INICIAL			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
3	2.150,00	6.696,66	54
3	4.413,14	4.237,61	52
5	1.676,28	0,00	72
3	3.608,00	2.956,07	60
1	3.400,00	2.048,19	16
2	0,00	0,00	52
18	17.729,18	4.699,98	336
2	5.254,81	3.072,37	38
24	13.367,12	945,97	478
16	1.603,14	0,00	266
18	19.373,00	0,00	413
3	4.238,14	6.316,57	54
19	15.260,44	6.488,40	300
26	5.176,14	0,00	355
47	9.897,14	0,00	491
22	6.340,74	0,00	345
17	7.232,14	0,00	286
3	8.829,81	5.039,22	54
14	3.960,00	0,00	298
14	18.958,14	4.350,43	384
17	30.992,14	2.540,70	418
49	9.800,00	7.647,03	692
0	14.814,58	0,00	0
<b>326</b>	<b>R\$ 208.074,07</b>	<b>R\$ 57.039,20</b>	<b>5514</b>
		<b>R\$ 265.113,27</b>	

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 345.609,50

(\*) Cabe destacar que a totalidade dos treinamentos incluídos após o planejamento inicial atendem às diretrizes de elaboração do PAC e se vinculam totalmente aos perfis técnicos dos servidores. A maioria desses treinamentos atendem a demandas de ações do CSJT, contratações de soluções de TIC e mudanças de servidores entre as áreas da SETIC.

TREINAMENTOS EXECUTADOS INCLUIDOS POSTERIORMENTE (*)			
Nº Vagas	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	Carga Horária Presencial / EAD
2	792,00	3.888,18	20
0	0,00	0,00	0
1	0,00	4.191,29	30
0	0,00	0,00	0
1	2.560,00	0,00	40
3	2.590,00	3.310,21	74
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
3	0,00	0,00	70
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
2	0,00	6.478,02	34
1	1.278,00	0,00	32
1	1.278,00	0,00	32
3	0,00	9.975,55	50
1	1.278,00	0,00	32
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
2	0,00	4.913,81	29
5	10.800,00	0,00	148
4	12.900,00	14.263,16	131
0	0,00	0,00	0
0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>R\$ 33.476,00</b>	<b>R\$ 47.020,23</b>	<b>722</b>
		<b>R\$ 80.496,23</b>	

ANEXO III - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS -  
SITUAÇÃO DEZEMBRO 2018




# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Dezembro/2018 v2.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

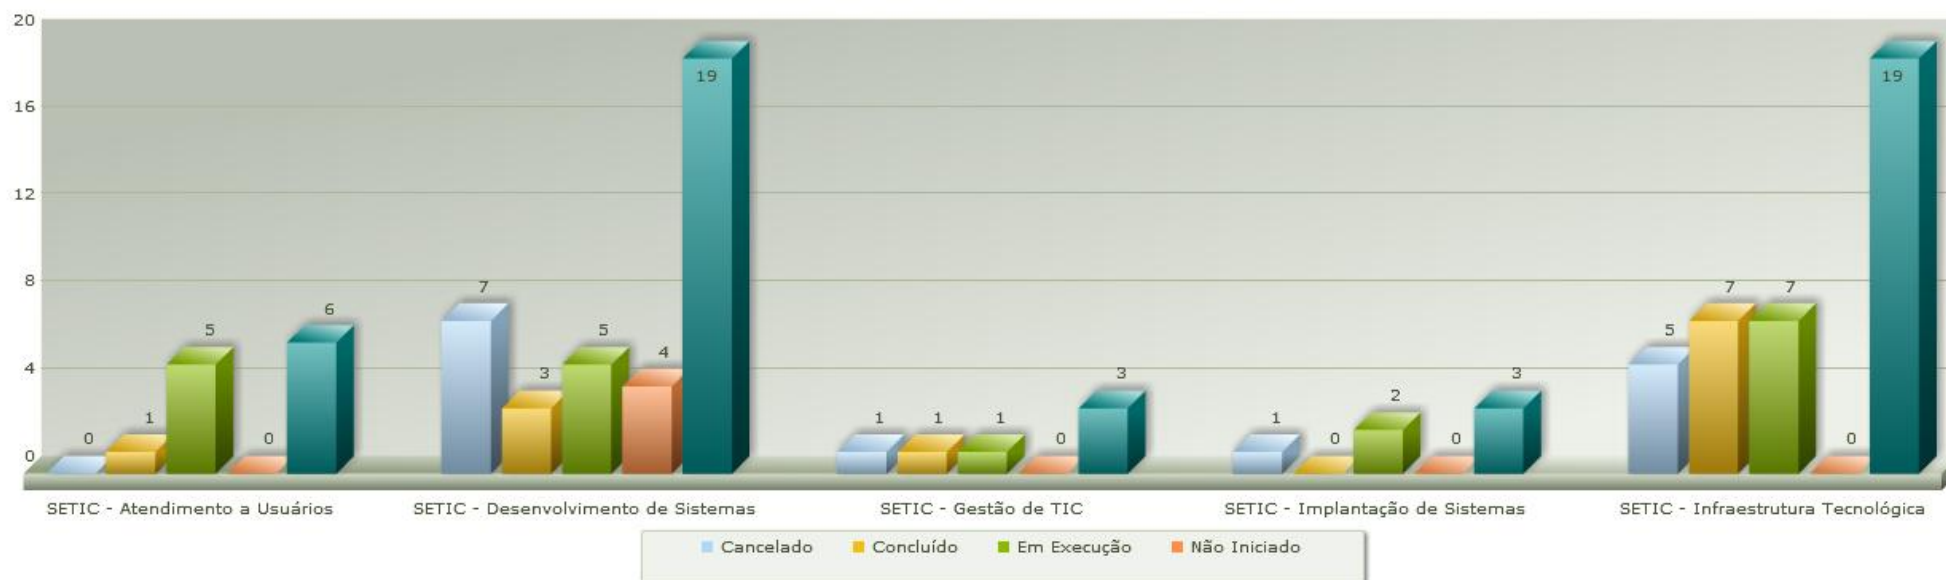


### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b></p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b></p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b></p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b></p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b></p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = \left( \frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100</math></p>	


ATENDIMENTO A USUÁRIOS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

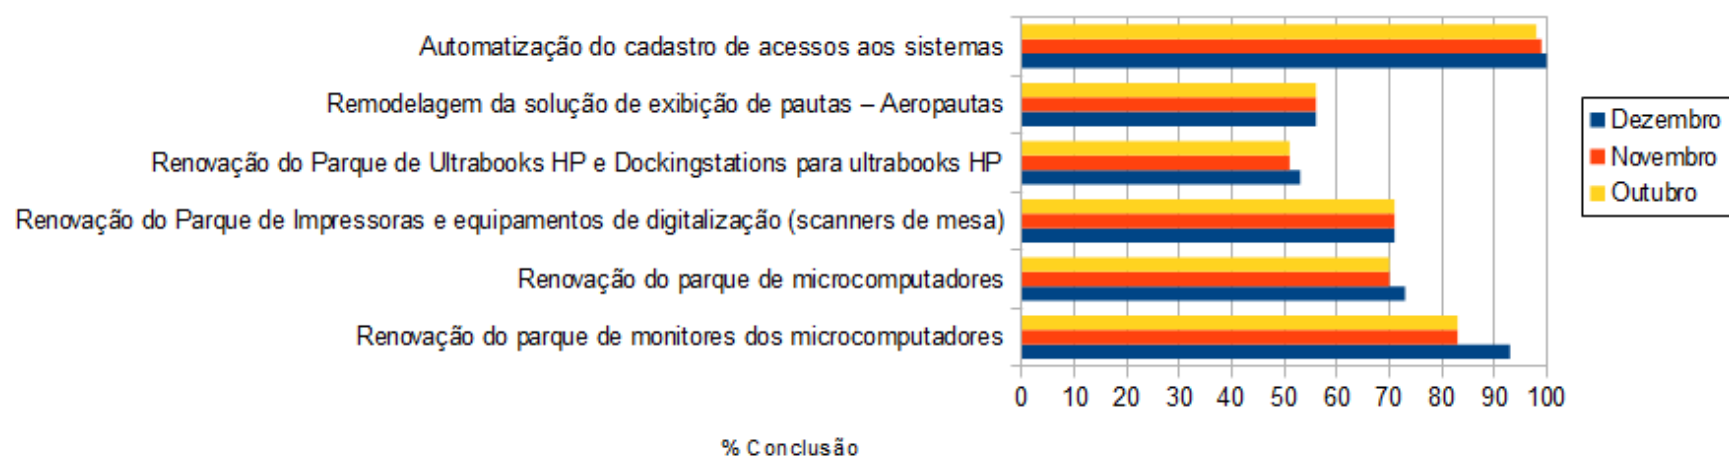

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Todos os 1984 monitores referente a segunda parte da compra foram recebidos. Instalações sendo executadas (em conjunto com os microcomputadores do projeto 479). Mudança enviada, com nova previsão de término em 28/fev/2019. GP encaminhará nova mudança apenas para registrar a nova qtd de monitores (no plano ainda consta a antiga).	Em Execução	03/07/2017	19/03/2019	03/07/2017		92,53	R\$ 5.040.160,00	R\$ 0,00	1	0,99	0	1	62,7	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Concluída; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: todos os micros foram recebidos (1750 no total). Instalações iniciadas. Mudança enviada, com nova previsão de término em 28/fev/2019.	Em Execução	16/03/2018	26/03/2019	10/04/2018		73,05	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	1	0,99	0	1	23,97	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: já instaladas as 518 impressoras. Scanners foram adquiridos e entregues em final de dezembro/2018. GP fazer mudança com o planejamento das instalações e com o novo nro de scanners (passou de 30 para 20). PA 5369-46.	Em Execução	01/06/2017	19/12/2018	26/06/2017		70,84	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,54	0,7	0	0,8	56,59	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em andamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018		4500

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: TRT4 participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks, todos recebidos. Entrega iniciada em julho (entregue até o momento aprox 63% do total). GP fazer gestão de mudança justificando novo prazo (conforme email Dr Cassou sobre data limite da retirada) e excluindo do escopo o reaproveitamento dos notes dos assistentes.	Em Execução	01/06/2017	14/01/2019	26/06/2017		52,63	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	0,66	0,52	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Equipamentos patrimonializados (MARCO)-Concluída; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega do Notebooks HP Elitebook 8460 para as unidades judiciárias (MARCO)-Designada	14/01/2019		4250
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: Escopo inicial contemplava o estudo da solução. Aprovado em 31/agosto/18 pelo Comitê de Governança a compra da solução (aprovaada proposta 2, que contempla 112 Televisores de R\$1800,00 cada + 115 placas raspberry Pi, de R\$440,00 cada). DOD e análise de viabilidade aguardando encaminhamento na CGTIC (compra será em 2019). GP replanejar projeto.	Em Execução	15/05/2018	04/09/2018	28/05/2018		56,25			0,8	0,56	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)-Concluída; Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)-Concluída; Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)-Concluída	13/08/2018		3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Sistemas administrativos e o PJe foram retirados do escopo. Integração realizada com INFOR e NovaJus4. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	24/03/2017	05/11/2018	03/04/2017	19/11/2018	100			1	1	0	1	351,16		17/10/2018	03/10/2018	2250

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

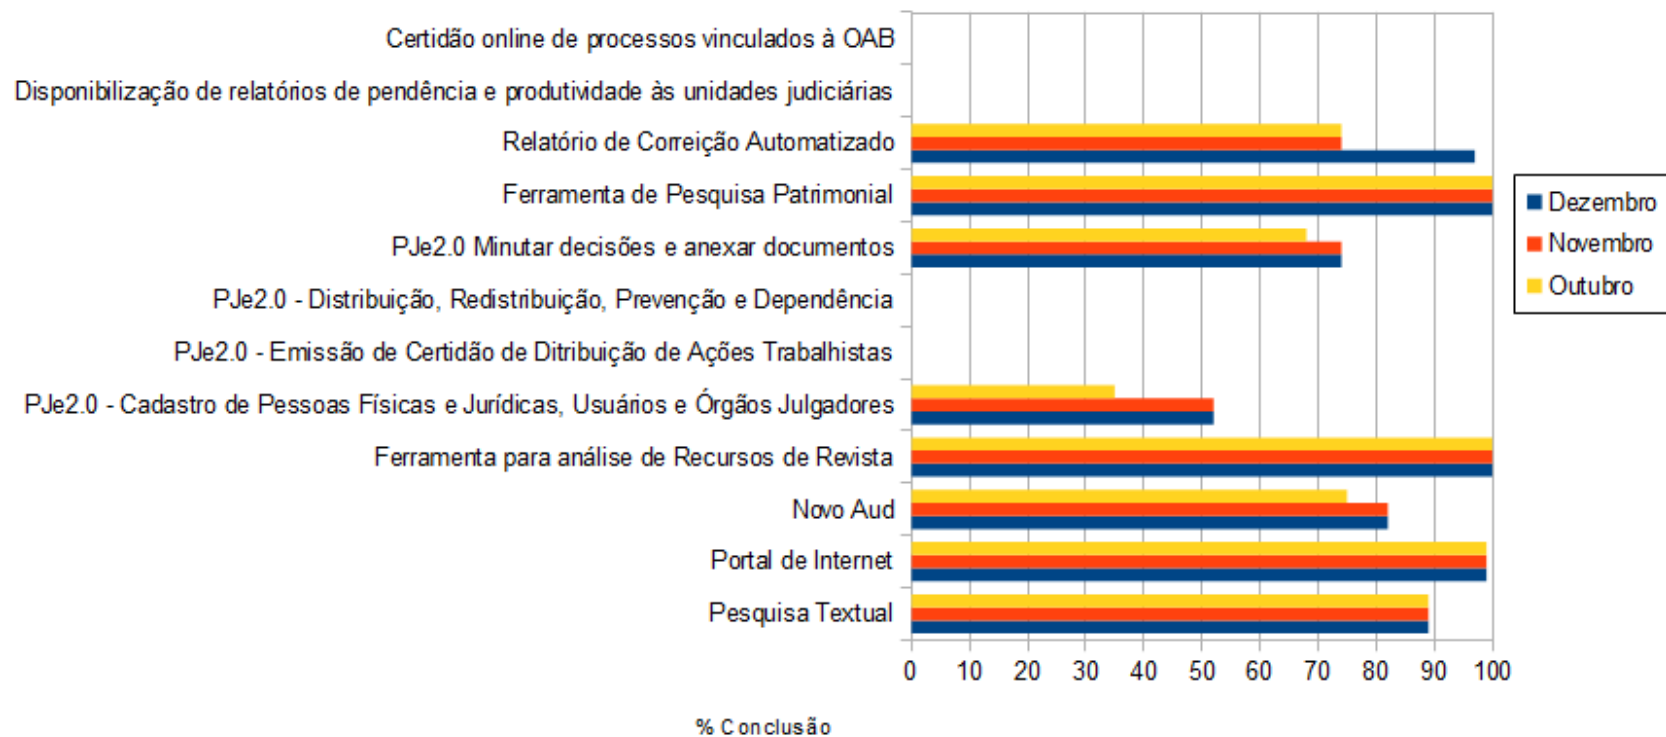


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/18: dia 29/maio/18 a pesquisa de acórdãos ampla entrou em produção para o público externo. Itens pendentes: dissídios coletivos; biblioteca virtual; consulta de despachos da Corregedoria e pesquisa no portal de internet. O projeto está parado, sem data para retomada. No momento, recurso trabalhando no projeto Novo Aud (475).	Em Execução	20/03/2017	13/07/2018	20/03/2017		89,1			0,55	0,89	0	1	74,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Concluída; Publicação da Pesquisa ampla na internet-Concluída; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018		5500
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/18: pendente a liberação das súmulas. Projeto parado. No momento, recurso trabalhando no desenvolvimento do novo VOX.	Em Execução	20/03/2017	02/07/2018	20/03/2017		99,09			0,57	0,99	0	1	175,22	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programação Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programação Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018		5000
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/18: Entrega1 (MVP) e 2 (disponibilização de textos padronizados) realizadas. Última entrega (manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica) estava prevista para 10/jan e será reprogramada. Disponibilização para o CSJT prevista para 18/03/19, a ser replanejada. Houve afastamento de integrante da equipe (líder técnico/desenvolvedor), devido a licença saúde. Consequências minimizadas por meio de acréscimo de novo integrante no projeto.	Em Execução	02/10/2017	09/04/2019	02/10/2017		82,11			0,57	0,84	0	1	3,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Levantamento de requisitos-Concluída; Entrega 1 - Mínimo Produto Viável (MVP)-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em andamento; Entrega 2 - Disponibilização de textos padronizados (autotextos) e envio dos dados ao PJe-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 3 - Manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica-Em andamento; IMPLANTAR-Designada; Manual de Implantação-Em planejamento; Treinamento SAU-Em planejamento; Homologação pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Homologação em Unidades Piloto da 4ª Região-Em planejamento; Disponibilização do sistema para o CSJT-Em planejamento; Documentação do projeto-Designada	18/03/2019		4750
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	*** CONCLUÍDO *** (produto final entregue em 13/04/2018). Mapa de benefícios enviado.	Concluído	22/09/2017	17/04/2018	22/09/2017	27/04/2018	100			1	1	0	1	0,81		13/04/2018	13/04/2018	4750

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
485	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO CANCELAMENTO: O escopo desse projeto foi incorporado ao 486 - PJe Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, usuários e órgãos julgadores. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	16/03/2018	17/04/2018			0					0							4625
502	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ)	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO DO CANCELAMENTO: O escopo deste projeto será atendido junto com o escopo do 486 (PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas, Usuários e Órgão Julgador). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).	Cancelado	23/03/2018	24/04/2018			0					0							4625
486	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/2018: contempla escopo do 485 (pessoas jurídicas e entes públicos). Em finalização da entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) e em andamento entrega 2 (cadastro de usuários externos) e entrega 3 (cadastro de PJ, órgão de representação e unificação). Atraso na primeira entrega devido a criação de codificação padrão para o módulo, o que por outro lado, vai facilitar as próximas entregas, sem impacto na data final do projeto.	Em Execução	11/04/2018	02/04/2019	16/04/2018		51,6			0,5	0,65	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Concluída; Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos-Em andamento; Entrega 2: Cadastro de usuários externos-Em andamento; Entrega 3: Cadastro de PJ, Órgão de Representação e Unificação-Em andamento; Entrega 4: Cadastro de Órgão Julgador e Órgão Julgador Colegiado-Designada	22/03/2019			4375
487	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe).	Não Iniciado					0					0							4375
489	PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe).	Não Iniciado					0					0							4375
488	PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/18: Alterado nome do projeto de "Pje 2.0 - Componente para edição de textos" para "Pje 2.0 Minutar decisões e anexar documentos". Realizada entrega 1 (componente para edição de textos) e entrega 2 (componente para edição de textos customizado). Em andamento entrega 3 (minutar/revisar decisão), prevista para 01/fev/19.	Em Execução	09/04/2018	21/02/2019	09/04/2018		73,9			0,75	0,81	0	1	2,45	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Em andamento; Entrega 1: Componente para edição de textos-Concluída; Entrega 2: Componente para edição de textos customizado-Concluída; Entrega 3: Minutar/revisar decisão-Em andamento	08/02/2019			4250
463	(CANCELADO) Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	MOTIVO CANCELAMENTO: Grandes demandas atuais da SETIC e confirmação que o sistema SIGEO-JT providenciará o envio das informações da EFD-REINF. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	10/04/2017	28/04/2017			0					0							4000
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	***CONCLUÍDO*** Liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez/18. Entrega do produto final realizada dia 04/abril/18. Benefícios sendo medidos (contato Romy AGE).	Concluído	14/08/2017	04/04/2018	14/08/2017	21/05/2018	100			1	1	0	1	71,95		04/04/2018	04/04/2018		3625
482	Relatório de Correição Automatizado	TIAGO GOMES SANTOS	***CONCLUÍDO***. Última entrega realizada dia 19/dez/2018. Necessário realizar reunião de Aceite.	Concluído	07/02/2017	19/12/2018	06/12/2016		97,1			0,66	0,97	0	0,75	1,6		19/12/2018	19/12/2018		3500






GESTÃO DE TIC  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

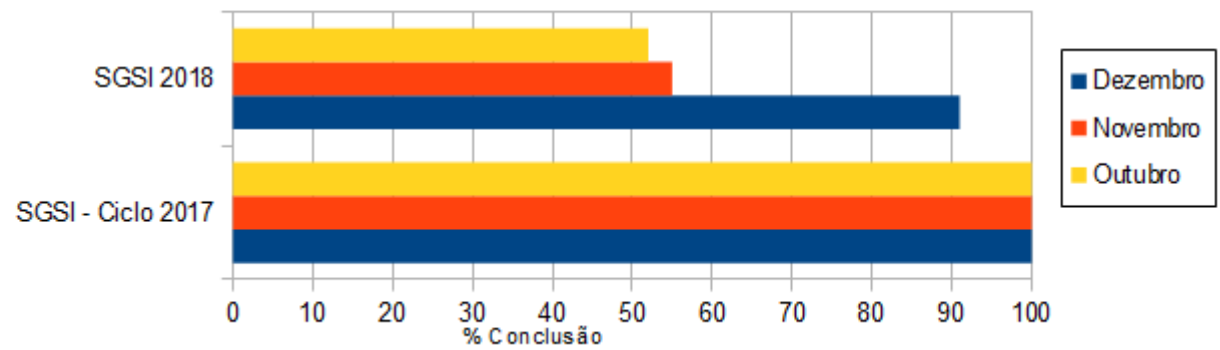


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		30/04/2018	23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição dez/18: concluída a análise e avaliação de riscos, a declaração de aplicabilidade e a fase de Plano de Tratamento de Riscos. Em definição dos indicadores e metas para 2019.	Em Execução	18/06/2018	22/03/2019	18/06/2018		91,03			1	1,01	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em planejamento	15/03/2019		2875
490	(CANCELADO) Estudo de ferramentas gratuitas para Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	MOTIVO CANCELAMENTO: Devido à característica do resultado do novo escopo do projeto, o estudo será feito como atividade da equipe, sem necessidade de projeto específico. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/01/2018	11/12/2018	19/01/2018		100					0				11/12/2018		2625

### IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

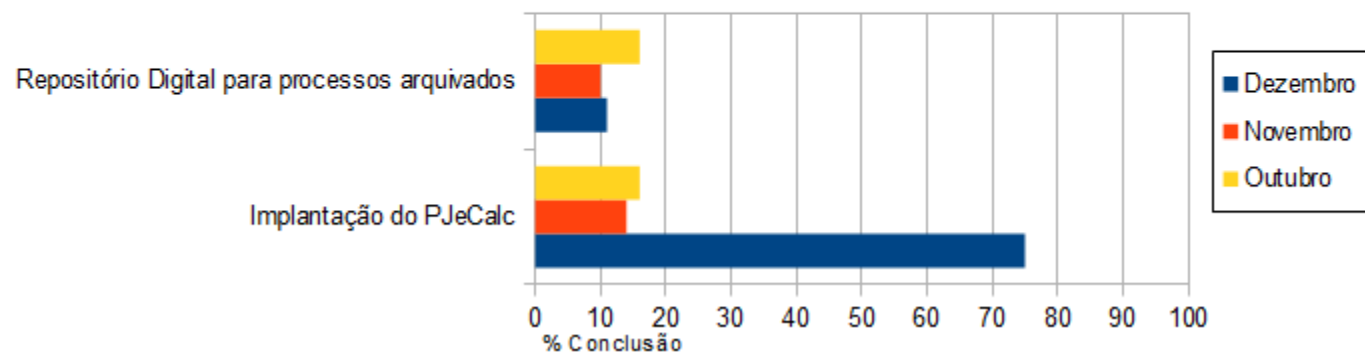

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
491	Implantação do PJeCalc	PABLO PAULO LOPES BARROS	Posição dez/18: sistema instalado em produção. Kickoff realizado em 04/out. Plano de projeto em ajustes, para envio. GP validar e registrar no Plano se realmente a utilização do PJeCalc será obrigatória a partir de março/2019, com a versão 2.4 do Pje (implantação em todas as VTs deve acontecer antes da obrigatoriedade). Em realização a capacitação para magistrados, servidores, peritos e advogados.	Em Execução	14/02/2018	14/12/2018	19/02/2018		74,92			0	0,74	0		0	Planejamento-Em andamento; Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em andamento; Eventos de capacitação para magistrados e servidores-Em andamento; Evento de capacitação para peritos-Em andamento; Disponibilização do PJe-CALC corporativo-Em andamento; Disponibilização do PJe-CALC CIDADÃO-Em andamento; Divulgação de notícias sobre o PJe-CALC-Em andamento			4750
470	(CANCELADO) Automação de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS	MOTIVO CANCELAMENTO: CSJT iniciou projeto nacional similar (projeto de testes). Acompanhar as atividades do projeto nacional como ação estratégica.CANCELAMENTO aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		100					0				30/11/2017		3625
484	Repositório Digital para processos arquivados	PABLO PAULO LOPES BARROS	Posição dez/18: Treinamento da ferramenta ATOM realizado início de agosto. Kick-off realizado dia 24/set, GP enviar Plano de Projeto (em ajustes quanto ao responsável técnico pelo sistema e a possibilidade do uso de consultoria para a importação dos processos).	Em Execução	24/01/2017	08/07/2019	21/09/2018		11,48			0,5	0,19	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Treinamento sobre o sistema AtOM-Concluída; Instalação da infraestrutura do sistema AtOM-Concluída; Cadastramento manual de processos no AtOM-Em andamento; Importação de processos eletrônicos do PJe para o AtOM-Em andamento			3250

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA Andamento dos projetos - últimos 3 meses

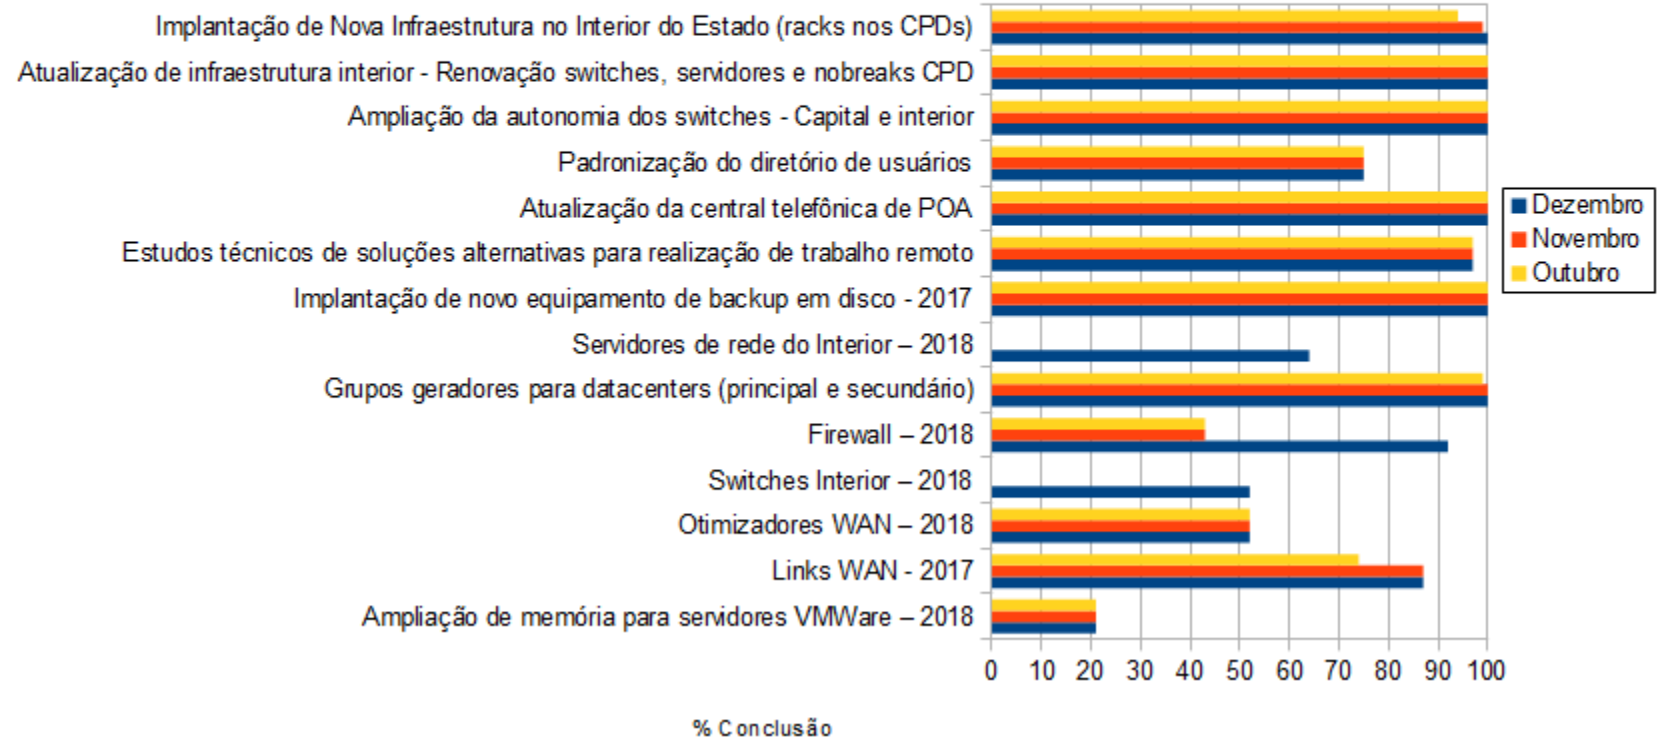

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priori Zação
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: realizada a realocação das memórias atual, pela equipe da SETIC. Quanto à aquisição, pregão planejado para ser realizado dia 22/jan.	Em Execução	19/03/2018	19/12/2018	22/06/2018		21,43	R\$ 392.000,00	R\$ 0,00	0,14	0,21	0	0,5	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo técnico dos equipamentos RT30-Em planejamento; Especificação técnica detalhada-Designada; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Aplicação em produção-Em planejamento	12/12/2018		5000
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Fornecedor (Claro) tinha prazo de 23/07 para conclusão, com mais 90 dias até inexecução. Todos links instalados (dia 05/dez/18, dado recebimento provisório). Em avaliação do serviço para aceite definitivo.	Em Execução	10/01/2017	21/09/2018	09/03/2017		86,62	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,57	0,86	0	0,8	86,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Em planejamento	14/09/2018		4750
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Projeto com alto risco. Garantia venceu em 28/11. 80% da maior parte dos otimizadores foi entregue e pago em 2018. Prazo contratual para finalização das instalações é 05/fev, com possibilidade de atraso devido a problemas na importação.	Em Execução	19/03/2018	11/02/2019	03/05/2018		52,16	R\$ 2.857.295,48	R\$ 1.686.296,65	1	0,73	0	1	14,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	05/02/2019		4750
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Adesão à ata do TRT8. Em instalação dos equipamentos. Previsão de conclusão até 12/04.	Em Execução	19/03/2018	09/05/2019	18/09/2018		52,49	R\$ 1.777.160,00	R\$ 0,00	0,75	1,03	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Documentação TRT08-Concluída; Recebimento Provisório-Concluída; Recebimento Definitivo-Em andamento; Transição para a Produção-Em andamento	12/04/2019		4750
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Realizada adesão à Ata de Registro de Preços do TRT12. Projeto concluído em 18/dez/2018. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	19/03/2018	18/12/2018	11/05/2018		92,03	R\$ 1.000.000,00	R\$ 767.000,00	0,66	0,92	0,76	1	0		18/12/2018	18/12/2018	4750
496	(CANCELADO) Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0						4375
497	(CANCELADO) Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Devido às características do projeto, passar para Ação Estratégica. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0						4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Conclusão da instalação dos itens de segurança em 04/07/2018. Mapa benefícios enviado.	Concluído	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015	24/08/2018	100	R\$ 797.085,61	R\$ 680.000,00	1	1	0,85	1	240,34		24/11/2017	04/07/2018	4000

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: parte da garantia dos servidores vence em maio, outra, em novembro/2019. PA 7740-48/2018. Previsão para recebimento dos equipamentos até 09/abril. Avaliar replanejamento do projeto caso ocorra o recebimento em separado para os servidores que vencem em nov/19.	Em Execução	19/03/2018	04/07/2019	26/06/2018		64,14	R\$ 2.162.000,00	R\$ 0,00	1	0,97	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Especificação-Concluída; Pesquisa-Concluída; Implantação-Em planejamento	11/06/2019		3875	
499	(CANCELADO) Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Entrega do produto final realizada em 15/06/18. Mapa benefícios enviado.	Concluído	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017	30/07/2018	100	R\$ 1.071.124,10	R\$ 1.071.124,10	1	1	1	0,8	40,1		30/04/2018	15/06/2018	3500	
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: criado novo ambiente (GV4). Novos ultrabooks que estão sendo entregues para os magistrados (projeto 459), já estão com o GV4. Projeto foi replanejado em relação ao prazo e custo (houve a necessidade de compra de 678 licenças de Microsoft RDS-registro de preço). Determinado pelo Comitê Gestor de TIC que até fev/19 todos os usuários devem estar no GV4.	Em Execução	02/03/2015	30/04/2019	14/08/2015		97,15	R\$ 231.549,06	R\$ 0,00	1	1,01	0	1	298,78	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	22/04/2019		3375	
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Atualização da central realizada dia 22/12/2017. Produto final entregue dia 04/04/2018. Medir Benefícios dia 30/agosto (Marlene e Madison).	Concluído	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	08/06/2018	100	R\$ 500.000,00	R\$ 593.000,00	1	1	1,18	1	0		19/12/2017	04/04/2018	3125	
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição dez/18: cada Vara ou CCDF é considerada 1 unidade. Realizada a migração de 28 unidades (em 15 cidades) de um total de 136 unidades.	Em Execução	28/08/2014	18/12/2018	28/08/2014		75,35			0,66	0,75	0	1	195,62	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em andamento	10/12/2018		2750	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue 30/04/2018. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	15/06/2018	100	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	1	1	1	103,77		31/10/2017	30/04/2018	2750	
500	(CANCELADO) Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							2750
501	(CANCELADO) Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO*** Produto final entregue em 19/jan/18. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	21/05/2018	100	R\$ 1.479.559,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	1	1	4,94		19/12/2017	19/01/2018	2000	
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO*** Racks instalados em 68 localidades. Ficaram fora do escopo: Arroio Grande, Gramado e Lagoa Vermelha, que serão tratados posteriormente. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	09/01/2012	31/07/2019	19/04/2012	19/11/2018	100	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1,28	1	1	1	257,37		31/07/2019	06/11/2018	1375	



**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018**

ID	Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS DEZEMBRO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
<b>ATENDIMENTO A USUÁRIOS</b>							
01/ 2018	Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Primeiro boletim informativo publicado dia 10/julho/2018. Segundo, publicado dia 03/agosto.	CONCLUÍDA em Julho/2018  Publicações sendo publicadas periodicamente.  Benefícios: -Maior agilidade e autonomia para solução de questões simples e rotineiras, que possam ser resolvidas pelo próprio usuário, a partir das orientações divulgadas nos Boletins Informativos. -Provável diminuição de abertura de chamados para a SETIC, referente a essas questões divulgadas.
02/ 2018	SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Previsão de início no primeiro semestre/2019.	
<b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>							
<b>SADM (Seção de Sistemas Administrativos)</b>							
03/ 2018	Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT. Integrações devem estar concluídas até que o sistema de RH seja desligado (data provável março/19).	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
04/ 2018	Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Consta em atas do projeto SIGEP (05/fev/2018 e 19/fev/2018) que a instalação do sistema eletrônico de remoção deve ser suspensa, a fim de aguardar o sistema de autoatendimento da 15ª região, o qual conterá essa funcionalidade.	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região, que será incorporado no SIGEP (projeto estratégico). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
<b>SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)</b>							
05/ 2018	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	CARLOS DA SILVEIRA	Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais	Alterações no sistema infor utilizado pelo arquivo	Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Assyst R90655 (InforArquivo Cargas Múltiplas): 1)Incluir um checkbox chamado "Manter dados", no final da tela de Carga/Consulta de Processo Arquivado e 2)Incluir a opção "terceiro interessado" no campo parte, nas cargas de advogado. Assyst R93660 (InforArquivo Devolução de várias cargas ao mesmo tempo): 3) Alterar a tela de Carga/Consulta atual, de forma que seja possível devolver processos múltiplos.	CONCLUÍDA em dez/2018.  Em produção a implementação dos três itens acordados.  Benefícios: -Agilidade em rotinas repetitivas; -Diminuição do trabalho; -Diminuição de erros de digitação, por reutilização dos dados; -Fidelidade nos registros.
<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS</b>							
06/ 2018	Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria (processos encaminhados a partir dessa área já tramitam via PROAD para áreas específicas do TRT4). Demais processos administrativos serão implantados em 2019, conforme liberação da DG. EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS. Integração com o SIGEP liberada e homologada pela CIS.	Depende de definição pela DG
<b>INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>							
07/ 2018	Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		SM e SST iniciaram debate para entender a necessidade e as possíveis alternativas. Natacha sugeriu consultar empresas terceirizadas para proporem solução. Máquinas atuais possuem apenas versão 1.6.1 do Portable.	Sem previsão
08/ 2018	Estudo da centralização de processamento do interior			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado. Natacha informou que não há problemas com licenças Oracle.	
09/ 2018	Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Suspender, pois há estudos para que o PJe não utilize mais certificado.	CANCELADA. Motivo: Estão sendo realizados estudos para que o PJe não utilize mais certificado. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018**

ID	Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS DEZEMBRO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
<b>INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>							
<b>10/2018</b>	Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo começaria estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	CANCELADA. Motivo: Estudos sendo realizados como tarefa rotineira da equipe e após resultados será proposta projeto. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
<b>11/2018</b>	Racks de CPD para o Interior - 2018			Inicialmente contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. Caso a SEMPRO formalize a necessidade de mais racks novos, será tratado posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)	Registro de preço de 5 racks, com compra imediata de 2. Pregão realizado, mas sem vencedor, deve ser refeito.	
<b>12/2018</b>	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas			Durante a construção do prédio garagem ao lado do TRT4, houve rompimento de um cabo com diversas fibras ópticas, as quais permitem a redundância da comunicação entre os dois CPD's. O objetivo dessa ação é realizar/encaminhar o reparo e manutenção desse anel de fibras ópticas, garantindo a redundância na comunicação entre os data centers.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 497 (o qual foi cancelado)	Trâmite do PA entre SETIC/Presidência determinou que a SETIC avalie a possibilidade de contratar laudo pericial que aponte o local exato e a extensão dos danos, bem como levantar o custo para solução. PA 1973-61/2017.	


ANEXO IV - RELATÓRIO DE PROJETOS MARÇO 2019

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Março/2019 v1.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

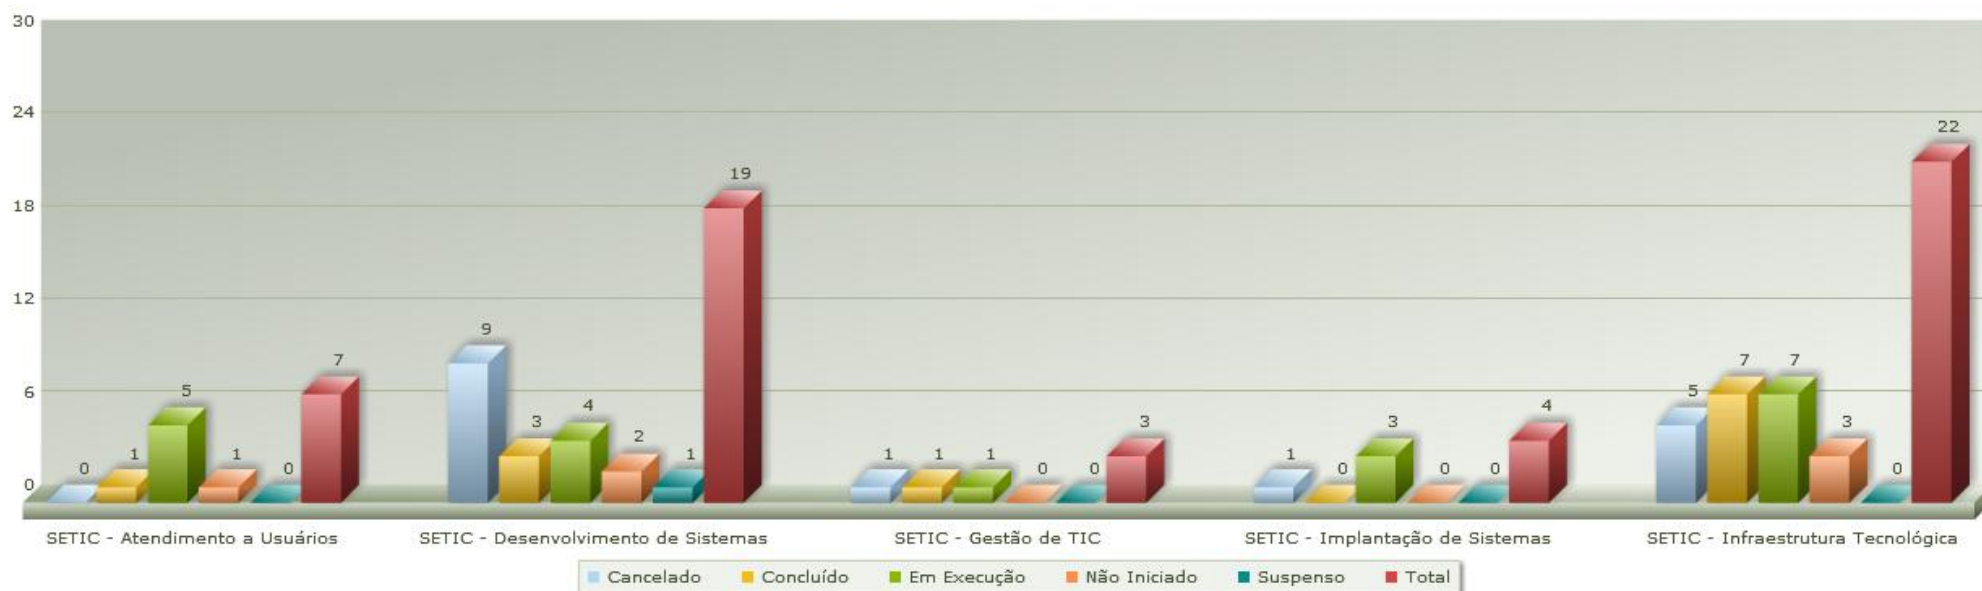


### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b></p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b></p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b></p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b></p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b></p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = \left( \frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100</math></p>	

## ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

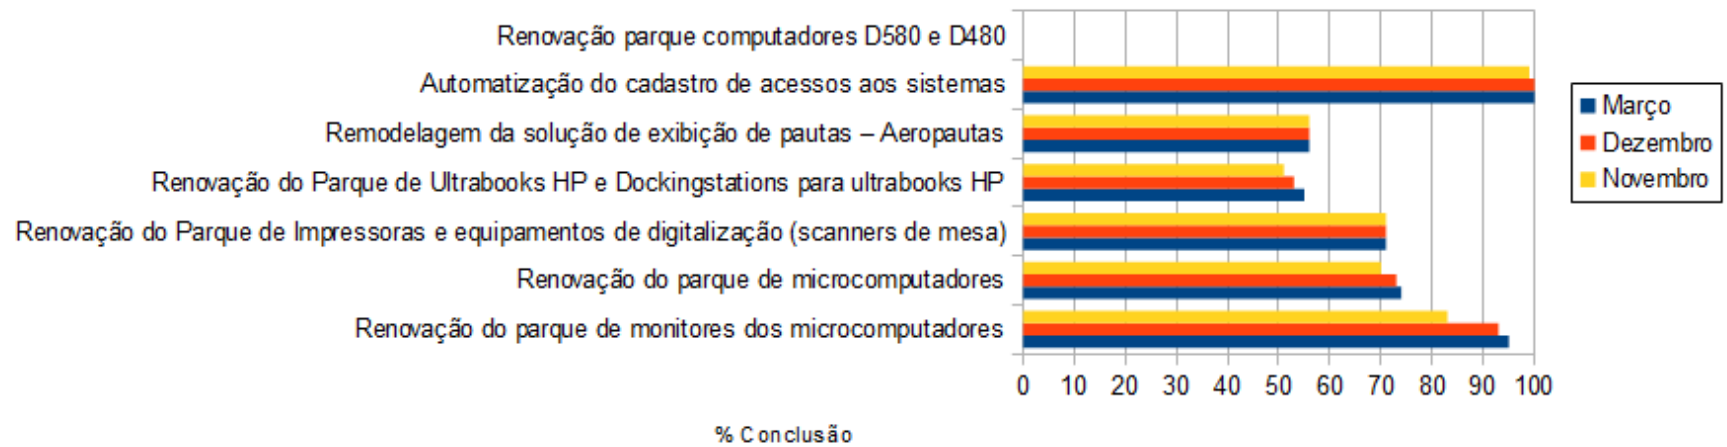


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição mar/19: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Todos os 1984 monitores referente a segunda parte da compra foram recebidos. Instalações sendo executadas (em conjunto com os microcomputadores do projeto 479). Conclusão vai atrasar (instalações serão feitas até 20/março).	Em Execução	03/07/2017	19/03/2019	03/07/2017		95,37	R\$ 4.605.504,00	R\$ 0,00	0,8	0,96		1	62,7	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Concluída; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição mar/19: todos os micros foram recebidos (1750 no total). Instalações em andamento (conclusão vai atrasar, até 20/março).	Em Execução	16/03/2018	26/03/2019	10/04/2018		74,05	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	0,8	0,94		1	23,97	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição mar/19: já instaladas as 518 impressoras. Scanners foram adquiridos e entregues em final de dezembro/2018 (PA 5369-46). Instalados os 20 scanners dia 08/março. Projeto pode ser encerrado. GP registrar no Termo de Aceite a mudança na quantidade de scanners (passou de 30 para 20) e a justificativa para atraso no prazo.	Em Execução	01/06/2017	19/12/2018	26/06/2017		70,84	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,54	0,7		1	56,59	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em andamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018		4500
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição mar/19: TRT4 participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks, todos recebidos. Entrega iniciada em julho (entregue até o momento aprox 68% do total, 246 unidades). GP fazer gestão de mudança justificando novo prazo e as decisões sobre a distribuição e reaproveitamento dos notes.	Em Execução	01/06/2017	29/04/2019	26/06/2017		55,13	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	1	0,71		0,8	18,71	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Concluída; Preparação e entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento	14/01/2019		4250





## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

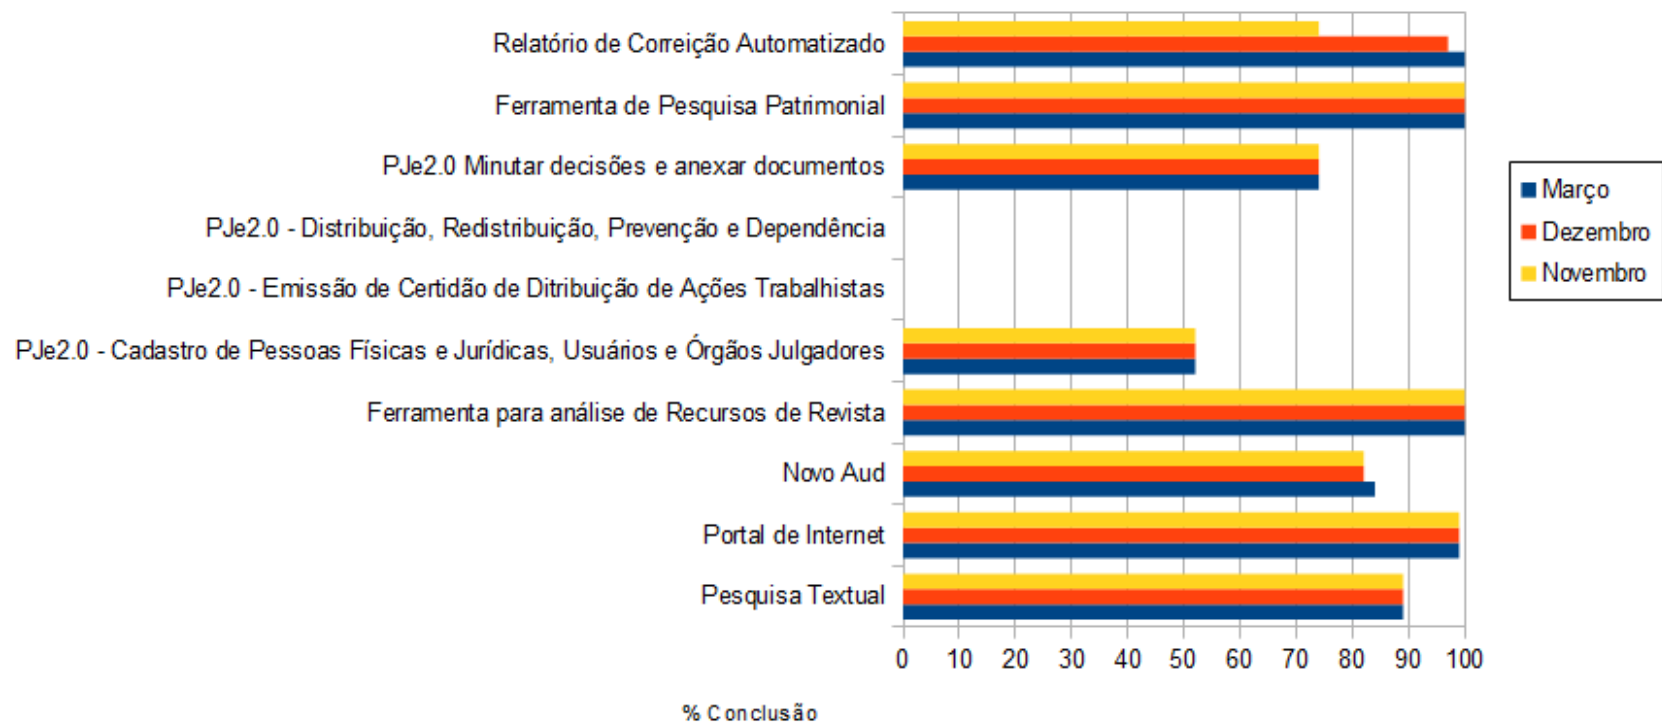


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
457	Pesquisa Textual	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Dia 29/maio/18 a pesquisa de acórdãos ampla entrou em produção para o público externo. Itens pendentes: dissídios coletivos; biblioteca virtual; consulta de despachos da Corregedoria e pesquisa no portal de internet. Projeto suspenso: recurso trabalhando no projeto Novo Aud (475). Projeto deverá ser retomado em Outubro/19 e ser concluído pela equipe SJUD. Encaminhar para a Natacha o número de acessos às opções que ainda não foram migradas.	Suspensão	20/03/2017	13/07/2018	20/03/2017		89,1			0,55	0,89		1	74,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Concluída; Publicação da Pesquisa ampla na internet-Concluída; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018		5500
458	Portal de Internet	TIAGO DA SILVA SUTILI	Posição mar/19: pendente a liberação das súmulas. Projeto parado. No momento, recurso trabalhando no desenvolvimento do novo VOX. Retomar o mais rápido possível (informar data para Natacha).	Em Execução	20/03/2017	29/06/2018	20/03/2017		99,09			0,57	0,99		1	174,31	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programacao Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programacao Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018		5000
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição mar/19: Entrega1 (MVP) e 2 (disponibilização de textos padronizados) realizadas. Última entrega (manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica) e disponibilização para o CSJT replanejada para ser dia 29/março. Replanejamento encaminhado para o CSJT. GP realizar gestão de mudança local.	Em Execução	02/10/2017	09/04/2019	02/10/2017		83,9			0,4	0,85		0,8	3,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Levantamento de requisitos-Concluída; Entrega 1 - Mínimo Produto Viável (MVP)-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em andamento; Entrega 2 - Disponibilização de textos padronizados (autotextos) e envio dos dados ao PJe-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 3 - Manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica-Em andamento; IMPLANTAR-Designada; Manual de Implantação-Em planejamento; Treinamento SAU-Em planejamento; Homologação pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Homologação em Unidades Piloto da 4ª Região-Em planejamento; Disponibilização do sistema para o CSJT-Em planejamento; Documentação do projeto-Designada	18/03/2019		4750
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	*** CONCLUÍDO *** (produto final entregue em 13/04/2018). Mapa de benefícios enviado.	Concluído	22/09/2017	17/04/2018	22/09/2017	27/04/2018	100			1	1	0	1	0,81		13/04/2018	13/04/2018	4750

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
485	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO CANCELAMENTO: O escopo desse projeto foi incorporado ao 486 - PJe Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, usuários e órgãos julgadores. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	16/03/2018	17/04/2018			0												4625
502	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ)	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO DO CANCELAMENTO: O escopo deste projeto será atendido junto com o escopo do 486 (PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas, Usuários e Órgão Julgador). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (reunião 04/mayo/2018).	Cancelado	23/03/2018	24/04/2018			0												4625
486	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição mar/2019: contempla escopo do 485 (pessoas jurídicas e entes públicos). Entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) realizada em dezembro e está em ajustes para atender solicitações de padrão de código do CSJT (versão 2.4). GP encaminhou proposta de replanejamento do projeto para o CSJT, com previsão de conclusão para a versão 2.5 (setembro/2019). Aguardando retorno.	Em Execução	11/04/2018	02/04/2019	16/04/2018		51,6			0,4	0,52		1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Concluída; Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos-Em andamento; Entrega 2: Cadastro de usuários externos-Em andamento; Entrega 3: Cadastro de PJ, Órgão de Representação e Unificação-Em andamento; Entrega 4: Cadastro de Órgão Julgador e Órgão Julgador Colegiado-Designada	22/03/2019		4375	
487	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe). OBS.: Incluir nesse projeto o escopo do 464, que foi cancelado.	Não Iniciado					0												4375
489	PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe).	Não Iniciado					0												4375
488	PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição mar/19: Alterado nome do projeto de "Pje 2.0 - Componente para edição de textos" para "Pje 2.0 Minutar decisões e anexar documentos". Aguardando retorno do CSJT sobre entrega 1 (componente para edição de textos) e entrega 2 (componente para edição de textos customizado), ambas da versão 2.4. Entrega 3 (minutar/revisar decisão) está em desenvolvimento e precisará ser replanejada para a versão 2.5 (setembro/2019).	Em Execução	09/04/2018	21/02/2019	09/04/2018		73,9			0,5	0,73		1	2,45	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Em andamento; Entrega 1: Componente para edição de textos-Concluída; Entrega 2: Componente para edição de textos customizado-Concluída; Entrega 3: Minutar/revisar decisão-Em andamento	08/02/2019		4250	
463	(CANCELADO) Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	MOTIVO CANCELAMENTO: Grandes demandas atuais da SETIC e confirmação que o sistema SIGEO-JT providenciará o envio das informações da EFD-REINF. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	10/04/2017	28/04/2017			0												4000
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	***CONCLUÍDO*** Liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez/18. Entrega do produto final realizada dia 04/abril/18. Benefícios sendo medidos (contato Romy AGE).	Concluído	14/08/2017	04/04/2018	14/08/2017	21/05/2018	100			1	1	0	1	71,95		04/04/2018	04/04/2018		3625
482	Relatório de Correição Automatizado	TIAGO GOMES SANTOS	***CONCLUÍDO***. Última entrega realizada dia 19/dez/2018. Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	07/02/2017	19/12/2018	06/12/2016	19/02/2019	100			1	1	0	0,75	1,6		19/12/2018	19/12/2018		3500




GESTÃO DE TIC  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

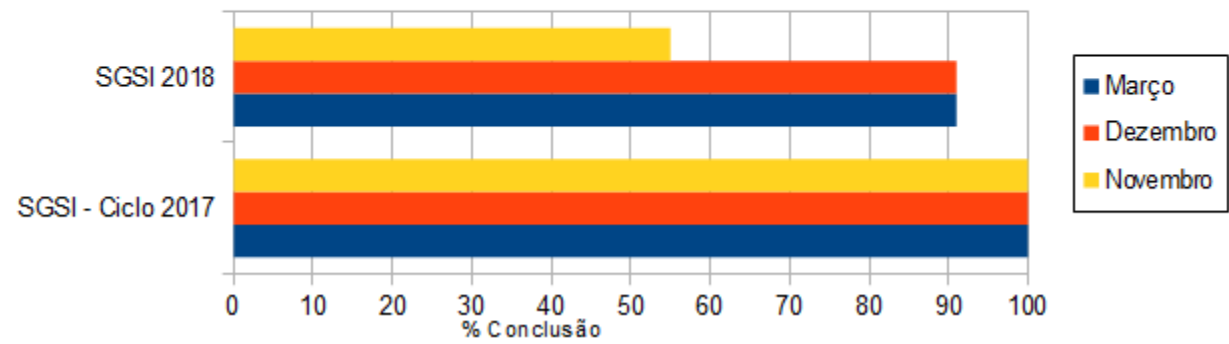

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		30/04/2018	23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição mar/19: em andamento a última etapa do projeto, de aprovação dos indicadores e metas 2019 para gestão da segurança da informação e aprovação do relatório final de implementação do SGSI (aguardando aprovação do Comitê de Segurança da Informação para encaminhamento à Presidência).	Em Execução	18/06/2018	22/03/2019	18/06/2018		97,01			0,85	0,98		1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em andamento	15/03/2019		2875
490	(CANCELADO) Estudo de ferramentas gratuitas para Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	MOTIVO CANCELAMENTO: Devido à característica do resultado do novo escopo do projeto, o estudo será feito como atividade da equipe, sem necessidade de projeto específico. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/01/2018	11/12/2018	19/01/2018	23/08/2018	100									11/12/2018		2625

## IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

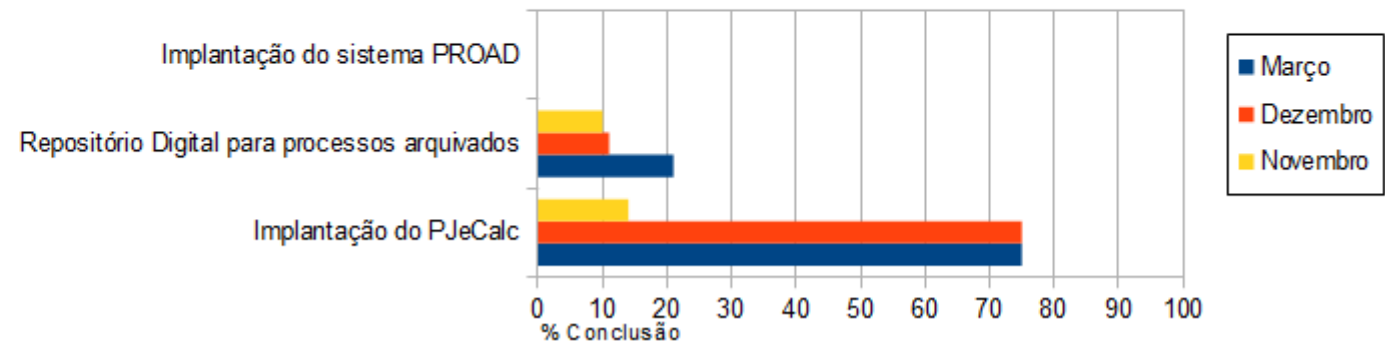






## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses

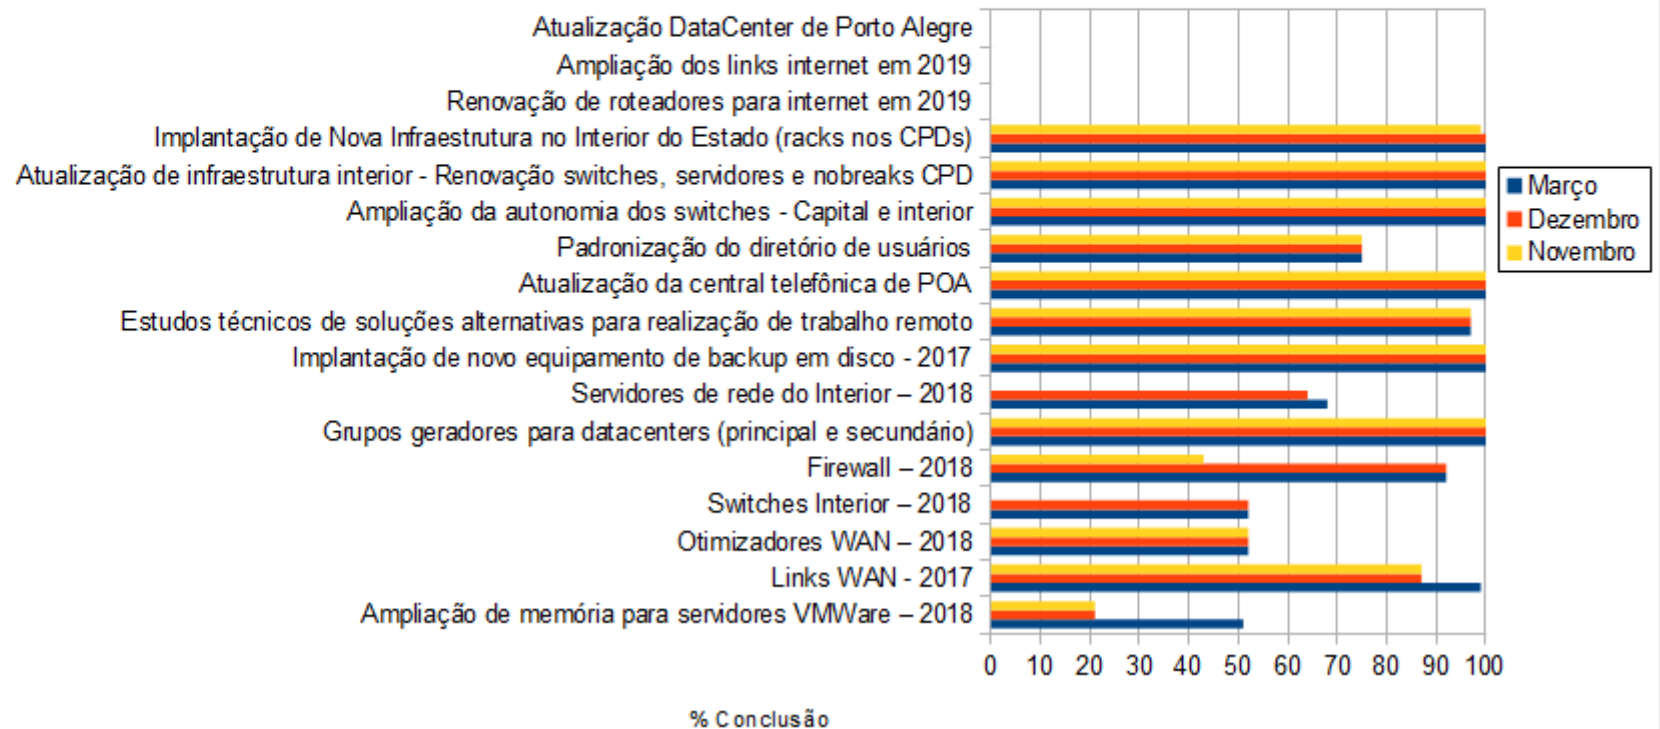

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição mar/19: realizada a realocação das memórias atual, pela equipe da SETIC. Quanto à aquisição, contrato em elaboração. Mudança encaminhada pelo GP.	Em Execução	19/03/2018	15/04/2019	22/06/2018		50,96	R\$ 65.088,00	R\$ 0,00	0,25	0,72		1	36,89	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo técnico dos equipamentos R730-Em planejamento; Especificação técnica detalhada-Designada; Contratação-Em andamento; Execução-Em andamento; Aplicação em produção-Em planejamento	08/04/2019		5000	
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição mar/19: Todos links foram instalados. Realizado aceite definitivo. Encaminhar encerramento do projeto (GP justificar no Termo de Aceite o atraso no projeto).	Em Execução	10/01/2017	21/09/2018	09/03/2017		98,66	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,85	0,96		0,8	86,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Concluída; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Concluída	14/09/2018		4750	
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição mar/19: Projeto com alto risco. Garantia venceu em 28/11. 80% da maior parte dos otimizadores foi entregue e paga em 2018. TRT4 autorizou mais 30 dias de prazo para recebimento, por causa de atraso na importação. Recebimento realizado, mas parte dos equipamentos vieram trocados. Sem nova data para recebimento. Ainda, equipamentos não estão funcionando com PDFs do P.Je. O projeto deve obrigatoriamente atender a esse item, fornecedor deve ser notificado. Teste em Canoas irá definir o futuro do projeto.	Em Execução	19/03/2018	11/02/2019	03/05/2018		52,16	R\$ 2.857.295,48	R\$ 1.686.296,65	0,42	0,52		1	14,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	05/02/2019		4750	
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição mar/19: Adesão à ata do TRT8. Em instalação dos equipamentos. Previsão de conclusão até 12/04.	Em Execução	19/03/2018	09/05/2019	18/09/2018		52,81	R\$ 1.777.160,00	R\$ 0,00	0,8	0,67			0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Documentação TRT08-Concluída; Recebimento Provisório-Concluída; Recebimento Definitivo-Em andamento; Instalações-Em andamento	12/04/2019		4750	
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO***. Realizada adesão à Ata de Registro de Preços do TRT12. Projeto concluído em 18/dez/2018. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	19/03/2018	18/12/2018	11/05/2018		92,03	R\$ 1.000.000,00	R\$ 767.000,00	0,66	0,92	0,76	1	0			18/12/2018	18/12/2018	4750
496	(CANCELADO) Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												4375
497	(CANCELADO) Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Devido às características do projeto, passar para Ação Estratégica. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO***. Geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Conclusão da instalação dos itens de segurança em 04/07/2018. Mapa benefícios enviado.	Concluído	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015	24/08/2018	100	R\$ 797.085,61	R\$ 680.000,00	1	1	0,85	1	240,34		24/11/2017	04/07/2018	4000	





**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018/2019**

ID	Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS MARÇO/2019	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
<b>ATENDIMENTO A USUÁRIOS</b>							
01/2018	Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Primeiro boletim informativo publicado dia 10/julho/2018. Segundo, publicado dia 03/agosto.	CONCLUÍDA em Julho/2018  Publicações sendo publicadas periodicamente.  Benefícios: -Maior agilidade e autonomia para solução de questões simples e rotineiras, que possam ser resolvidas pelo próprio usuário, a partir das orientações divulgadas nos Boletins Informativos. -Provável diminuição de abertura de chamados para a SETIC, referente a essas questões divulgadas.
02/2018	SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Previsão de início no primeiro semestre/2019. Dia 07/março houve reunião de planejamento com Diretora SETIC e Coordenadores.	
13/2019	Agente SETIC	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Criação de um programa "agente" a ser instalado em todos os computadores do TRT. Este agente seria capaz de se comunicar com um servidor da SETIC e disparar tarefas como administrador do computador. Entre as funcionalidades que podem ser adicionadas nele quando pronto, se incluem: - envio de informações para o inventário de hardware e software; - o agente pode servir para outras equipes desenvolverem seus pacotes de instalação; - caso seja viável uma estrutura de acesso externo, fornecida pela Infra, este agente pode ser usado para implementação da "Loja da SETIC", onde o usuário pede a instalação de um programa e, caso ela seja autorizada, automaticamente ele é instalado em seu computador.		Previsão de início em Maio/2019	Previsão conclusão em Julho/2019
14/2019	Portal de Acesso para diretores de Varas e Gabinetes	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Configurar o portal de acessos da SM (EPA) para que os diretores das Varas do Trabalho e assessores e chefes de gabinete dos gabinetes do TRT possam manter os cadastros no Infor e NJ4 de forma autônoma e de acordo com as suas necessidades.		Previsão de início em Abril/2019	Previsão conclusão em Dezembro/2019
15/2019	Alerta de falhas em serviços de TI	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Mudança na página inicial a ser aberta pelo Ícone "TI" e pelo Vox, no link do AssystNet. A ideia seria abrir uma página onde apareça uma tabela com status de sistemas e mensagens importantes para o usuário (e possivelmente alguma solução de contorno temporária). Na parte inferior, será disponibilizado o logon do Assyst, normalmente.		Previsão de início em Agosto/2019	Previsão conclusão em Outubro/2019
<b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>							
<b>SADM (Seção de Sistemas Administrativos)</b>							
03/2018	Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAN DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações do sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT. Integrações devem estar concluídas até que o sistema de RH seja desligado (data provável março/19).	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
04/2018	Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Consta em atas do projeto SIGEP (05/fev/2018 e 19/fev/2018) que a instalação do sistema eletrônico de remoção deve ser suspensa, a fim de aguardar o sistema de autoatendimento da 15ª região, o qual conterá essa funcionalidade.	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região, que será incorporado no SIGEP (projeto estratégico). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
<b>SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)</b>							
05/2018	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	CARLOS DA SILVEIRA	Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais	Alterações no sistema infor utilizado pelo arquivo	Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Assyst R90655 (InforArquivo Cargas Múltiplas): 1)Incluir um checkbox chamado "Manter dados", no final da tela de Carga/Consulta de Processo Arquivado e 2)Incluir a opção "terceiro interessado" no campo parte, nas cargas de advogado. Assyst R93660 (InforArquivo Devolução de várias cargas ao mesmo tempo): 3) Alterar a tela de Carga/Consulta atual, de forma que seja possível devolver processos múltiplos.	CONCLUÍDA em dez/2018.  Em produção a implementação dos três itens acordados.  Benefícios: -Agilidade em rotinas repetitivas; -Diminuição do trabalho; -Diminuição de erros de digitação, por reutilização dos dados; -Fidelidade nos registros.
16/2019	Melhorias Arquivo x Depósito			Melhorias no sistema e disponibilização de funcionalidade que envia processos do ARQUIVO para o DEPÓSITO CENTRAL. Sistema atual não possui essa funcionalidade, que será necessária daqui a algum tempo, qdo chegar o prazo de envio.	Abrir solicitação. Ação aprovada pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.		

SDEC (Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 2o Grau)							
17/2019	Migração BI SAP para Click					Abrir solicitação. Ação aprovada pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.	
18/2019	Painel para Cejusc 1º grau			Painel para análise de dados das conciliações realizadas e por realizar pelo CEJUSC do 1º Grau		Abrir solicitação. Ação aprovada pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.	
19/2019	Conciliômetro			Página no Portal de Internet apresentando volume de conciliações realizadas no 1º Grau e no 2º Grau		Abrir solicitação. Ação aprovada pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.	
SPORT (Seção de Desenvolvimento de Internet e Intranet)							
20/2019	Nova Extranet					Abrir solicitação. Ação aprovada pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 15/março/2019.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS							
06/2018	Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria (processos encaminhados a partir dessa área já tramitam via PROAD para áreas específicas do TRT4). Demais processos administrativos serão implantados em 2019, conforme liberação da DG. EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS. Integração com o SIGEP liberada e homologada pela CIS.	Aguardando definições/posicionamento da DG, para planejamento da implantação. Previsão de conclusão Junho/2019.  <b>OBS.: Criado projeto 506 para acompanhamento.</b>
21/2019	Implantação do Sistema NUGEP	JANINE SCHARLAU STOEVER	Secretaria Processual	Implantar o sistema NUGEP (do CSJT), desenvolvido para realização da gestão de processos que aguardam o julgamento de precedentes.		Natacha solicitou a Edson (Banco de Dados) instalar o sistema na semana que acaba em 08/março.	Instalado até 08/março. Início da utilização deve acontecer até 25/março. No entanto, problemas na comunicação com o PJe (sendo tratado pela CIS/SGBD). Necessário atividades de operação assistida após o início da utilização, para considerar o sistema como implantado. Previsão de conclusão até 30/abril/2019.
22/2019	Implantação de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER/OJS) para Escola Judicial)	LEANDRO KREBS GONÇALVES	Juiz Vara do Trabalho	Disponibilizar um sistema de editoração eletrônica para viabilizar a criação de periódico (Revista da Escola Judicial) que vise à cientificidade como característica principal.	Instalar o sistema. Após, avaliar se será Ação ou Projeto. Link: <a href="https://pkp.sfu.ca/ojs/">https://pkp.sfu.ca/ojs/</a>	Encaminhar a implantação	
23/2019	Implantação do Sistema de Gerenciamento de Precatórios	MARCIA JAQUELINE LEAL VARGAS	Juízo Auxiliar de Execução de Precatórios	Adequar-se ao padrão nacional de gerenciamento de processos de precatórios (exclusivamente processos eletrônicos) com a implantação do sistema satélite do PJe, que está em desenvolvimento no TRT8.	Sistema satélite do PJe, disponibilizado pelo TRT8.	Encaminhar a implantação	Previsão de início em julho e conclusão em novembro/2019
24/2019	Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ)	JEFERSON ANDRADE	Secretaria da Corregedoria	Permitir a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil.	Natacha solicitou a Edson (Banco de Dados) instalar o sistema após ter instalado o NUGEP. Pablo encaminhar para CGTIC demanda de compra de certificado digital para acesso ao Banco do Brasil.	Encaminhar a implantação	Previsão de início em março e conclusão em junho/2019
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA							
07/2018	Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		SM e SST iniciaram debate para entender a necessidade e as possíveis alternativas. Natacha sugeriu consultar empresas terceirizadas para proporem solução. Máquinas atuais possuem apenas versão 1.6.1 do Portable.	Sem previsão
08/2018	Estudo da centralização de processamento do interior	NATACHA MORAES	SETIC	Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado. Natacha informou que não há problemas com licenças oracle.	
09/2018	Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	NATACHA MORAES	SETIC	Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Suspender, pois há estudos para que o PJe não utilize mais certificado.	CANCELADA. Motivo: Estão sendo realizados estudos para que o PJe não utilize mais certificado digital. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
10/2018	Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	NATACHA MORAES	SETIC	Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo começaria estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	CANCELADA. Motivo: Estudos sendo realizados como tarefa rotineira da equipe e após resultados será proposta projeto. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
11/2018	Racks de CPD para o Interior - 2018	NATACHA MORAES	SETIC	Inicialmente contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. Caso a SEMPRO formalize a necessidade de mais racks novos, será tratado posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)		CONCLUÍDA.  Recebimento final realizado em Dez/2018.  Benefício: Dar continuidade ao Projeto 52 (nova infraestrutura no interior), provendo racks de TIC para duas localidades que tinham racks mais antigos, acompanhando o cronograma de obras da SEMPRO (São Borja e Triunfo).

<b>12/2018</b>	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	NATACHA MORAES	SETIC	Durante a construção do prédio garagem ao lado do TRT4, houve rompimento de um cabo com diversas fibras ópticas, as quais permitem a redundância da comunicação entre os dois CPD's. O objetivo dessa ação é realizar/encaminhar o reparo e manutenção desse anel de fibras ópticas, garantindo a redundância na comunicação entre os data centers.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 497 (o qual foi cancelado)	Trâmite do PA entre SETIC/Presidência determinou que a SETIC avalie a possibilidade de contratar laudo pericial que aponte o local exato e a extensão dos danos, bem como levantar o custo para solução. PA 1973-61/2017.	
<b>25/2019</b>	Nobreaks de médio porte para salas de sessão e plenário	NATACHA MORAES	SETIC	Renovar os no-breaks de médio porte das 06 salas de sessões e equipar o Plenário do TRT com nobreaks capazes de atender a todos equipamentos da sala principal e da sala de controle.			Previsão de início em março e conclusão em dezembro/2019
<b>26/2019</b>	Computador para treinamento de modelos de inteligência artificial	ANDRÉ FARIAS	Coordenadoria de Desenvolvimento	Encaminhar a aquisição de um computador com uma placa GPU, a ser instalado no datacenter principal, para realização de treinamento de modelos de inteligência artificial. Alternativamente, pode-se adquirir somente a placa GPU para instalação num dos equipamentos existentes no TRT4. Essa alternativa depende da disponibilidade de um equipamentos compatível.			
<b>27/2019</b>	Nova solução para o reconhecimento óptico de caracteres (OCR)	PAULO MENDES	Coordenadoria de Infraestrutura	Manter uma solução de OCR com garantia de atualizações de versões e suporte técnico pelo fabricante. Aquisição de uma ferramenta comercial ou a implantação de uma versão livre.		Não está no plano orçamentário ainda.	

ANEXO V – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2019





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PDTC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DOO/ Estudos Preliminares	Termo de Referência			
1	Suprimento de Fundos	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Despesas de pequeno valor (economia processual)	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	800,00	Redução comensal por suprimento de fundos	30.11.18 - Reunião Comitê				800,00	PEI-Objetivo 3 Aprimorar a gestão orçamentária	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SUPRIMENTOS DE FUNDOS				sob demanda	sob demanda	sob demanda	sob demanda			Em Andamento
2	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC. - Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.546,28	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				11.546,28	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	UNIREDE	53/2017	16/04/19	dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019			Em Andamento
2	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC. - Contrato 53/2017 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.546,28	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				11.546,28	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	UNIREDE	53/2017	16/04/20	dezembro/2018	janeiro/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
3	Consultoria Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção de bancos de dados do Pje (PostgreSQL). - Contrato 89/2014 - vencimento 18/08/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	56.580,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				56.580,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	CONSTAT	89/2014	18/11/19	junho/2019	julho/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
4	Consultoria PostgreSQL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio especializado para administração da plataforma de bancos de dados do Pje (PostgreSQL). - Contrato 89/2014 - vencimento 18/08/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	31.740,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				31.740,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	CONSTAT	89/2014	18/11/19	junho/2019	julho/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
5	Consultoria Linux	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	- Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – sistema operacional Linux - Contrato 95/2016 - vencimento 24/07/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	17.520,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				17.520,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	CONSTAT	95/2016	24/07/18	junho/2019	julho/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
6	Consultoria Microsoft	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server. - Contrato 90/2014 - vencimento 18/08/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	22.398,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				22.398,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	SUPERINTEROP	90/2014	18/11/19	julho/2019	agosto/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
7	Consultoria TSM	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção do sistema de backup de dados utilizado no Tribunal. Serviço continuado de extrema importância em caso de incidente, especialmente. Foram encaminhadas licitações em 2018, mas elas não obtiveram sucesso, sendo, então, realizada compra direta. - Pregão 30/2016 - exclusivo ME e EPP - não houve apresentação de proposta. - Pregão 45/2016 - Service orçou valores acima do estimado - Pregão 24/2017 - exclusivo ME e EPP - unica empresa que apresentou proposta não apresentou documentos de habilitação - Pregão 59/2017 - Não houve apresentação de proposta - Compra Direta 0200/18-4	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.000,00	Serviço essencial, considerando que se trata do backup de todos os dados do Tribunal. Pregão foi repetido 4 vezes sem sucesso, de modo que foi realizada compra direta para garantia do serviço, caso necessário.	30.11.18 - Reunião Comitê				8.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	SERVICE	0200/18-4	ATE ACABAR HORAS	sob demanda	sob demanda	sob demanda	sob demanda			Em Andamento
8	Consultoria Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização utilizada nas instâncias de Pje e sistemas locais. - Contrato 117/17 - vencimento 28/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.270,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				6.270,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	SUPERINTEROP	117/2017	28/07/19	março/2019	abril/2019	abril/2019	abril/2019			Em Andamento
8	Consultoria Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização utilizada nas instâncias de Pje e sistemas locais. - Contrato 117/17 - vencimento 28/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.270,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				6.270,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	SUPERINTEROP	117/2017	28/01/20	março/2019	abril/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento
9	Consultoria Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual. - Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.340,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				11.340,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	SUPERINTEROP	46/2015	16/04/19	dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019			Em Andamento
9	Consultoria Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual. - Contrato 46/2015 - vencimento 16/04/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	11.340,00	Valor reduzido em 50% do valor mensal estimado do contrato vigente. A utilização desse recurso se dá sob demanda, que vem caindo em decorrência do conhecimento adquirido sobre os ambientes.	30.11.18 - Reunião Comitê				11.340,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	SUPERINTEROP	46/2015	16/04/20	dezembro/2018	janeiro/2019	maio/2019	julho/2019			Em Andamento



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual TOTAL	Vínculo com o PD/TIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DDI/ Estudos Preliminares	Termo de Referência			
10	Consultoria Google	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Apoio técnico especializado em desenvolvimento de serviços sobre a plataforma da nuvem utilizada no Tribunal. Estima-se demanda para migração da plataforma google para plataforma de portais do tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	17.500,00	Estima-se a contratação de horas de consultoria por compra direta, caso efetivamente necessário.	30.11.18 - Reunião Comitê	17.500,00			17.500,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	IMEDIATE	42248	26/11/2018	sob demanda	sob demanda	sob demanda	sob demanda			Em Andamento
11	Consultoria TraceGP	Secretaria de Apoio Administrativo	Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de gestão de demandas e projetos. - Contratação em andamento - Serviços continuados	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	35.000,00	Valor estimado com base em contratações anteriores, utilizado para desenvolvimento de adaptações no TraceGP, sob demandas aprovadas pontualmente pelo Comitê de Governança de TIC.	30.11.18 - Reunião Comitê	35.000,00			35.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	INEXIGIBILIDADE			março/2019	abril/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento	
12	Consultoria Gartner	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado. - Contrato 110/15 - vencimento 06/01/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	283.129,04	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses. Contrato amplamente utilizado para apoiar especificações técnicas de produtos a serem licitados, capacitação continuada dos gestores da Setic, avaliação de contratos para redução de valores. Em decorrência de Acórdão do TCU, específico sobre contratações de TIC, todos os contratos a serem renovados em 2018 serão submetidos à avaliação do Gartner, empresa que pesquisa e conhece as políticas de licenciamento e prestação de serviços de todas as grandes empresas de tecnologia.	30.11.18 - Reunião Comitê	283.129,04			283.129,04	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	GARTNER	110/15	06/01/20	outubro/2018	novembro/2018	agosto/2019	setembro/2019			Em Andamento
13	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados utilizado em todos os sistemas legados do TRT, sistemas administrativos nacionais e alguns sistemas satélites do PJe. - Contrato 27/2016 - vencimento 17/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	409.014,54	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	409.014,54			409.014,54	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ORACLE	27/2016	17/03/19	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019	fev-19		Encaminhada
13	Manutenção de softwares Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados utilizado em todos os sistemas legados do TRT, sistemas administrativos nacionais e alguns sistemas satélites do PJe. - Contrato 27/2016 - vencimento 17/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato. Consta em duplicidade, pois parte do mesmo contrato é subsidiado pelo TST.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	208.999,96	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	208.999,96			208.999,96	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ORACLE	27/2016	17/03/19	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019	fev-19		Encaminhada
14	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de TIC - Contrato 26/2017 - vencimento 29/11/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	81.433,04	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	81.433,04			81.433,04	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ACTIVE	26/2017	29/11/18	outubro/2018	novembro/2018	Contratação encaminhada em 2018	Contratação encaminhada em 2018			Contratação anos anteriores
15	Manutenção Software SIABI	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	Biblioteca - Atualização e suporte do fabricante para o software de automação de bibliotecas - Contrato 101/2015 - vencimento 29/05/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	15.406,08	Valor estimado para renovação contratual em andamento a ser encaminhada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	15.406,08			15.406,08	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	-	WJ	101/2015	29/10/20	Contrato vigente até outubro de 2020	Contrato vigente até outubro de 2020	Contrato vigente até outubro de 2020	Contrato vigente até outubro de 2020			Contratação anos anteriores
16	Manutenção do Software de gestão de Projetos	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios - Contrato 59/2016 - vencimento 30/01/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	79.185,88	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	79.185,88			79.185,88	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	TRACE	59/2016	30/01/20	setembro/2019	outubro/2019	agosto/2019	setembro/2019			Em Andamento
17	Manutenção Software BI (SAP)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence utilizado para o e-Gestão. - Contrato 135/2017 - vencimento 13/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	96.360,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	96.360,00			96.360,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	FIRST	135/2017	13/03/19	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019	fev-19		Encaminhada
18	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de descoberta de dados utilizado pelo TRT. - Contrato 139/2017 - vencimento 25/12/18 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	102.666,70	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	102.666,70			102.666,70	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	TOCATTO	139/2017	25/12/19	outubro/2018	novembro/2018	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
19	Manutenção Solução de Seg.da Informação – Risk Manager	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico presencial para solução de segurança da informação deste Tribunal fornecida pelo CS&T. - Contrato 11/2015 - vencimento 30/03/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	45.733,64	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	45.733,64			45.733,64	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	MODULO	42309	30/03/19	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019	jan-19		Encaminhada



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DOD/ Estudos Preliminares	Termo de Referência			
20	Manutenção Citrix - Gabinete Virtual	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juízo e assistentes de desembargadores para trabalho remoto. - Compra 0030/17-8 - vencimento 02/06/18. Não foi renovado no prazo, pois o serviço não estava funcionando a contento. Considerando ajustes recentes e a não identificação de ferramenta mais adequada e de melhor performance, Setic sugere nova contratação.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	485.981,29	Valor estimado com base em orçamento preliminar para 3 anos, de modo a garantir a manutenção até meados de 2022.	30.11.18 - Reunião Comitê	485.981,29			485.981,29	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários. PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	3A SOLUÇÕES	0030/17-8	02/06/18	abril/2019	maio/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
21	Manutenção Software de Auditoria de Acessos ( Trauma Zero )	Coordenadoria de Gestão de TIC	Sistema de controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário nas investigações de incidentes de segurança da informação - Contrato 129/17 - vencimento 05/08/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	52.905,60	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	52.905,60			52.905,60	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC. PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Gestão de TIC	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	GPG	129/2017	05/08/19	abril/2019	maio/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
22	Subscrições de software Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta parte do site do Tribunal e o PJe. - Contrato 49/2018 - vencimento 18/07/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	243.301,61	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	243.301,61			243.301,61	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	TECNISYS	49/2018	18/07/19	março/2019	abril/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
23	Subscrições de software VMware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões do software de virtualização responsável por 87% do parque de equipamentos servidores do Tribunal. - Contrato 102/16 - vencimento 27/12/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	587.971,58	Valor contratação anterior ocorrida em 2016, corrigido pela variação do dólar	30.11.18 - Reunião Comitê	587.971,58	15.03.19 Reunião Comitê	600.000,00	600.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	MEMORA	102/2016	27/12/2019	junho/2019	julho/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
24	Subscrições de software IBM Spectrum Protect (TSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões do software utilizado para gerar cópias de segurança (backup) dos dados do Tribunal. - Contrato 101/16 - vencimento em 30/11/19 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	265.572,95	Valor contratação anterior ocorrida em 2016, corrigido pela variação do dólar	30.11.18 - Reunião Comitê	265.572,95			265.572,95	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	INGRAM	101/2016	30/11/19	junho/2019	julho/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
25	Manutenção Software Netscaler	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juízo e assistentes de desembargadores para trabalho remoto. Serviços continuados, pretende-se realizar nova contratação em 2019.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.214,74	Valor contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	6.214,74			6.214,74	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	TDEC	0153/18-4	30/03/19	janeiro/2019	fevereiro/2019	janeiro/2019	fevereiro/2019	fev-19		Encaminhada
26	Manutenção Software PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal. Serviços continuados, pretende-se renovar contrato ao final do exercício, caso a assinatura eletrônica seja mantida nos moldes atuais.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	43.385,76	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	43.385,76			43.385,76	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	BRY	95/2015	10/12/20	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020			Contratação anos anteriores
27	Terceirização helpdesk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de serviço. Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	203.207,40	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	203.207,40			203.207,40	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	WYNTECH	22/1018	23/07/19	março/2019	abril/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
28	Manutenção Hardware PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal. Serviços continuados, pretende-se renovar contrato ao final do exercício, caso a assinatura eletrônica seja mantida nos moldes atuais.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	13.200,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	13.200,00			13.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários. PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	BRY	95/2015	10/12/20	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020	Contrato vigente até dezembro de 2020			Contratação anos anteriores
29	Manutenção dos grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva - Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário. Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.415,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	8.415,00			8.415,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	GENSET	67/2016	23/03/19	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019	jan-19		Encaminhada
29	Manutenção dos grupos geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva - Renovação da manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário. Serviços continuados, pretende-se renovar contrato.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.415,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	8.415,00			8.415,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	GENSET	67/2016	29/06/19	dezembro/2018	janeiro/2019	abril/2019	abril/2019			Em Andamento
30	Manutenção datacenters de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7).	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	528.131,87	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	528.131,87			528.131,87	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	ACECO	43313	11/08/20	Contrato vigente até agosto de 2020	Contrato vigente até agosto de 2020	Contrato vigente até agosto de 2020	Contrato vigente até agosto de 2020			Contratação anos anteriores
31	Manutenção Blade	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção dos equipamentos servidores onde estão instalados o PJe e outros sistemas. Parte foi fornecida pelo CST. Os serviços de manutenção foram prorrogados até que os equipamentos sejam substituídos. TRT foi parte de licitação realizada pelo TST, cuja ata de registro de preços ainda não foi publicada.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	177.722,95	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	177.722,95			177.722,95	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	COMPWIRE	24/2017 90/2016	30/12/19	novembro/2018	dezembro/2018	junho/2019	julho/2019			Suspensa
32	Manutenção Centrais Telefônicas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de manutenção corretiva para as centrais telefônicas do interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em uso.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	254.616,00	Valor estimado com base na média dos 2 menores orçamentos recebidos durante os estudos técnicos preliminares da contratação, ser encaminhada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	254.616,00			254.616,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	GITEL	60/2018 102/2014	02/04/21 14/04/19	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021			Contratação anos anteriores



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PD/TIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status		
								Forma	Valor					Forma	Valor	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDIOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO			DDI/ Estudos Preliminares	Termo de Referência
33	Manutenção Equipamento Proxy	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos. Equipamento fornecido pelo CSIT.	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	71.420,71	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	71.420,71	71.420,71	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	NETSAFE	44/2018	2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021			Contratação anos anteriores		
34	Link Internet 200 Mbps (300 ou 400 Mbps)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), contrato vigente.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.233,00	Valor mensal contratado atualmente por 6 meses (tempo em que o contrato será renovado), mais 6 meses de valor reduzido pela metade (valor estimado na nova contratação)	30.11.18 - Reunião Comitê	40.233,00	15.03.19 Reunião Comitê	50.823,00	50.823,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	LEVEL	49/2016	10/07/19	novembro/2018	dezembro/2018	março/2019	abril/2019		Em Andamento
35	Link Internet Redundante 200 Mbps (300 ou 400 Mbps)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), contrato vigente.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.233,00	Valor mensal contratado atualmente por 6 meses (tempo em que o contrato será renovado), mais 6 meses de valor	30.11.18 - Reunião Comitê	40.233,00	15.03.19 Reunião Comitê	50.823,00	50.823,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	ÁVATO	48/2016	10/07/19	novembro/2018	dezembro/2018	abril/2019	abril/2019		Em Andamento
36	Ampliação Link Internet (PTT)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão redundante com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (PJe), novo contrato a ser feito em 2019.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	13.410,00	Valor estimado para nova contratação com base em contratos recentes de outros órgãos públicos por 6 meses	30.11.18 - Reunião Comitê	13.410,00	15.03.19 Reunião Comitê	36.000,00	36.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO			fevereiro/2019	março/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento	
37	Acesso à Internet para notebook	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	135.176,98	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	135.176,98		135.176,98	135.176,98	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	CLARO	95/2014	16/12/19	julho/2019	agosto/2019	junho/2019	julho/2019		Em Andamento
38	Link WAN João Telles	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede em o prédio do arquivo e memorial do Tribunal	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	27.720,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL E PREGÃO	BRASIL DIGITAL	50/2016	14/04/19	dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019		Em Andamento
39	Link ADSL SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de testes de funcionamento dos serviços do site do Tribunal, bem como acesso alternativo em caso de problemas com a internet corporativa	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	5.953,20	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	5.953,20	5.953,20	5.953,20	5.953,20	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	CLARO	409/18-4	12/12/21	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores	
40	Link interligação prédios Santa Rosa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.391,02	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	1.391,02	1.391,02	1.391,02	1.391,02	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ZILIONET	0541/17-4	18/10/19	julho/2019	agosto/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento
41	Rede WAN principal (CLARO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema PJe	Despesa Corrente	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	798.896,34	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	798.896,34	798.896,34	798.896,34	798.896,34	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	CLARO	17/2018	26/09/20	Contrato vigente até setembro de 2020	Contrato vigente até setembro de 2020	Contrato vigente até setembro de 2020		Contratação anos anteriores	
42	Rede WAN redundante (ÁVATO)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema PJe que depende essencialmente da comunicação para operar	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	773.863,20	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses. Além disso, foi aplicado um redutor de 40% no valor da mensalidade em função do reequilíbrio de preços para compatibilização dos valores com o contrato da operadora CLARO.	30.11.18 - Reunião Comitê	773.863,20	773.863,20	773.863,20	773.863,20	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	-	ÁVATO	42491	13/01/21	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021		Contratação anos anteriores	
43	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos serviços de computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensagens, colaboração, sites internos). Serviços continuados, pretende-se renovar contrato e avaliar realização de pregão para contratação de contas com serviços adicionais de segurança.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	526.284,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	526.284,00	526.284,00	526.284,00	526.284,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL e/ou PREGÃO	RJR	106/2017	08/05/20	novembro/2019	dezembro/2019	setembro/2019	outubro/2019		Em Andamento
44	Serviços SERPRO – Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO - Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	Sistema utilizado para validação e consulta do CNPJ/CPF e endereço visando assegurar o sucesso nas intimações judiciais que ocorrem no âmbito do processo trabalhista, especialmente para a efetividade na fase de execução.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	178.200,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	178.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	SERPRO	26/2016	26/04/19	dezembro/2019	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019		Em Andamento
44	Serviços SERPRO – Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ, por meio da tecnologia Web Service – InfoConv-V5	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	O serviço INFOCONV-V5 é utilizado em 3 sistemas do Tribunal: serviço de petição eletrônico em processos físicos; sistema de acompanhamento de processos de 1ª grau (INFOR) para registro no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT); e o sistema de precatórios.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	6.600,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	SERPRO	52/2016	18/07/19	março/2019	abril/2019	abril/2019	maio/2019		Em Andamento



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ DE AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DDI/ Estudos Preliminares	Termo de Referência			
45	Acesso GID – DETRAN	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	Serviço utilizado pelas varas para execução trabalhista	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	3.271,75	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê				3.271,75	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários		PROGERGS	63/2017	08/08/22	Contrato vigente até 2022	Contrato vigente até 2022	Contrato vigente até 2022	Contrato vigente até 2022			Contratação anos anteriores
46	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para as quais o custo operacional do Tribunal seria superior. Serviço essencial para prestação dos serviços de TI que atingirá seu prazo máximo em 2019, quando precisará ser novamente licitado.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	407.000,00	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê				407.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	CDS	22/2014	01/04/19	novembro/2018	dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	fev-19		Encaminhada
47	Certificado Digital Sistema PJ-e	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Certificados utilizados para o estabelecimento de sessões criptografadas (SSL ou TLS) entre serviços disponíveis na Internet e usuários que desejam acessá-los. CONTRATAÇÃO CANCELADA, certificado foi substituído por um gratuito.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	0,00	CONTRATAÇÃO CANCELADA, certificado foi substituído por lets encrypt	30.11.18 - Reunião Comitê				0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	CERTISIGN	0190/17-4	09/05/19			janeiro/2019	janeiro/2019			Suspensa
48	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Estimativa das quantidades realizadas pela SEGESP com base nos valores da ARP do CNJ	15.03.19 Reunião Comitê				44.326,28	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO						abril/2019	abril/2019			Em Andamento
48	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	104.826,00	Estimativa das quantidades realizadas pela SEGESP com base nos valores da ARP do CNJ	30.11.18 - Reunião Comitê				104.826,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	CERTISIGN	14/2017	até o término da emissão dos certificados		sob demanda	abril/2019	abril/2019	jan-19		Encaminhada
49	Licenças IBM Spectrum Protect (TSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software utilizado para gerenciar as cópias de segurança (backup) dos dados do Tribunal - Contrato 101/16 - vence em 30/11/19	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	336.617,65	Valor contratação anterior ocorrida em 2016, corrigido pela variação do dólar	30.11.18 - Reunião Comitê				336.617,65	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	INGRAM	101/2016	30/11/19	maio/2019	julho/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
50	Software de Monitoramento Pje	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Solução de monitoramento de performance de aplicações web referente ao sistema PJ-e - Contrato 81/15 - vence em 20/11/19	Despesa de Capital	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	41.962,36	Encaminhada solicitação de aditivo contratual para supressão de 25% do contrato, sendo devido apenas 2 mensalidades em 2019. Esta secretaria irá encaminhar parecer para que este serviço seja retirado do rol de itens obrigatórios para este Regional	30.11.18 - Reunião Comitê				41.962,36	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO DE 25%	VECTRA	81/2015	20/11/19	dezembro/2018	janeiro/2019	Aditivo encaminhado em nov/18	Aditivo encaminhado em nov/18			Contratação anos anteriores
51	Antivírus - Contrato 19/2017 - vencimento 09/05/21 - Por se tratar de serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução de Antivírus - Contrato 19/2017 - vencimento 09/05/21 - Serviços continuados, pretende-se renovar contrato	Despesa de Capital	Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI	143.329,30	Valor mensal contratado mais reajuste de 10%, estimado com base no IGP-DI acumulado dos últimos 12 meses.	30.11.18 - Reunião Comitê				143.329,30	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica		NETSAFE	19/2017	09/05/21	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021	Contrato vigente até 2021			Contratação anos anteriores
52	Softwares diversos para atualização do parque	Diversas Áreas	Atualização de softwares já utilizados na infraestrutura do Tribunal e aquisição de demandas específicas de softwares de novo valor, incluindo Licença Software	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	100.000,00	Demandas de atualizações e expansões de softwares utilizados	30.11.18 - Reunião Comitê				100.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO				abril/2019	maio/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
53	Renovação e expansão do parque de microcomputadores	Comitê de Governança de TIC	Renovação e expansão do parque de micros. - Contrato 112/14: 390 unidades vencem em 25/02/19 350 unidades vencem em 29/02/19 350 unidades vencem em 28/04/19 350 unidades vencem em 28/06/19 10 unidades para expansão do parque	Despesa de Capital	Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	5.022.000,00	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste para renovação de 1674 computadores Positivo D580 que saem de garantia entre fevereiro e junho de 2015.	30.11.18 - Reunião Comitê				5.022.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	POSITIVO	112/2014		390 unidades vencem em 25/02/19 350 unidades vencem em 29/02/19 350 unidades vencem em 28/04/19 350 unidades vencem em 28/05/19 350 unidades vencem em 28/06/19	abril/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
54	Renovação e expansão do parque de micros utilizados por áreas que demandam características especiais	Comitê de Governança de TIC	Renovação e expansão do parque de micros utilizados por áreas que demandam características especiais como SETIC, SECOM, Escola Judicial Núcleo de Educação à Distância, Memorial, Perícias, em decorrência dos softwares utilizados. - Compra mediante ARP 0015/16-9: 92 unidades vencem em 18/12/19 - Compra 0007/13-9: 1 unidade vence em 14/05/19 (EJ)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	452.200,00	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste.	30.11.18 - Reunião Comitê				452.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	POSITIVO	ARP 0015/16-9	18/12/19	março/2019	abril/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
55	Renovação do parque de impressoras multifuncionais	Comitê de Governança de TIC	Renovação do parque de impressoras multifuncionais - Contrato 109/15: 468 unidades vencem em 20/01/19 - Contrato 132/12: 5 unidades que venceram em 07/04/16	Despesa de Capital	Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação	1.645.000,00	Valor estimado com base na última contratação para 470 impressoras multifuncionais	30.11.18 - Reunião Comitê				1.645.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	FAGUNDES MR COMPUTER	109/2015 132/2012	20/01/19 07/04/16	abril/2019	maio/2019	junho/2019	julho/2019			Em Andamento



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho da 4ª Região

Última Atualização: 15/03/2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PDTC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status		
								Forma	Valor					Forma	Valor	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO			DDI/ Estudos Preliminares	Termo de Referência
56	Renovação e Expansão do parque de projetores multimídia	Diversas Áreas	Renovação do parque de projetores multimídia - Contrato 89/2015: 13 unidades vencem em 12/10/19 2 unidades vencem em 12/09/20 - Novas demandas: 2 unidades para EJ 1 unidade Foro de Santa Maria (JÁ APROVADO PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	40.000,00	Valor estimado com base na última contratação mais possível reajuste para 16 unidades. Pretende-se fazer ARP para unidades que vencem em 2020	30.11.18 - Reunião Comitê	40.000,00	40.000,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO OU COMPRA DIRETA	MDD	89/2015	12/10/19	março/2019	abril/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento		
57	Renovação Workstations CFTV	Coordenadoria de Segurança Institucional	Renovação Workstations CFTV CONTRATAÇÃO CANCELADA, A PARTIR DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018. DEMANDA SERÁ ATENDIDA EM OUTRA CONTRATAÇÃO. O armazenamento das imagens de CFTV que antes era feito em Workstations passará a ser realizado nos equipamentos servidores do interior do estado. Portanto, esta contratação foi incluída no item 61. - Compra 0011/14-9: 19 unidades vencem em 20/10/19	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	0,00	O armazenamento das imagens de CFTV que antes era feito em Workstations passará a ser realizado nos equipamentos servidores do interior do estado. Portanto, esta contratação foi incluída no item 61.	30.11.18 - Reunião Comitê	0,00	0,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	SEPROL	0011/14-9	20/10/19							Suspensa	
58	Nobreaks 3 kva	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	6 nobreaks 3 kva - substituição dos nobreaks que estão em uso e com garantia vencida desde 2015 nas 04 salas de sessões de julgamento do 9º andar e na sala do 6º andar. 4 unidades (Lacerda Trib 3kva) venceram em 17/07/2015 (PA 0008841-65.2011.5.04.0000) 2 unidades (Lacerda Probesa 3kva) venceram em 03/09/2017 (PA 0004747-06.2013.5.04.0000)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	42.000,00	Valor estimado com base em orçamento preliminar.	30.11.18 - Reunião Comitê	42.000,00	42.000,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU ADESAO REGISTRO DE PREÇOS	LACERDA	163/11	17/07/15	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento		
59	Nobreaks 10 kva	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	1 nobreaks 10 kva - Expansão do parque para colocar nobreak no Plenário do TRT.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	16.000,00	Valor estimado com base em orçamento preliminar.	30.11.18 - Reunião Comitê	16.000,00	16.000,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC. PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO			maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento			
60	Renovação impressora ecotank	Gráfica	Renovação impressora ecotank A3 L1300 Epson jato de tinta utilizada pela gráfica. - 1 unidade venceu em 15/03/18 (PA 0007959-30.2015.5.04.0000)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.600,00	Valor estimado com base na última contratação	30.11.18 - Reunião Comitê	2.600,00	2.600,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	KALUNGA	0117/17-4	15/03/18	fevereiro/2019	março/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento		
61	Renovação dos Servidores de Rede do Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Servidores para atender aos sistemas locais do interior e armazenar as imagens do CFTV  Contratos Servidores: - Contrato 110/2013: 20 unidades vencem em 21/03/2019 - Contrato 73/2014: 25 unidades vencem em 16/12/2019 5 unidades vencem em 27/01/2020  Contratos Workstations CFTV: - Compra 0011/14-9: 19 unidades vencem em 20/10/19 CONTRATAÇÃO JÁ APROVADA PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.000.000,00	Valor estimado com base nos estudos preliminares da contratação encaminhada em 2018 para 50 unidades com 7 anos de garantia	30.11.18 - Reunião Comitê	2.000.000,00	2.000.000,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2-Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4	LTA LTA SEPROL	110/2013 73/2014 0011/14-9	21/03/19 16/12/19 20/10/19	setembro/2018	outubro/2018	maio/2019	junho/2019		Em Andamento		
62	Renovação de Roteadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Roteadores utilizados para acesso à Internet - Contrato 103/2013: 2 unidades vencem em 22/05/19 Equipamentos essenciais para balanceamento de link Internet e alta disponibilidade desse serviço.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	567.800,00	Valor última contratação atualizado pela variação do dólar do período	30.11.18 - Reunião Comitê	567.800,00	567.800,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	TELETEX	103/2013	22/05/19	janeiro/2019	fevereiro/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento		
62	Renovação de Roteadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação do parque dos Roteadores utilizados para acesso à Internet - Contrato 103/2013: 2 unidades vencem em 22/05/19 Equipamentos essenciais para balanceamento de link Internet e alta disponibilidade desse serviço.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho		Valor última contratação atualizado pela variação do dólar do período	30.11.18 - Reunião Comitê	17.000,00	17.000,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	TELETEX	103/2013	22/05/19	janeiro/2019	fevereiro/2019	abril/2019	abril/2019		Em Andamento		
63	Renovação Servidores de Rede para Racks com 2 processadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Servidores de Rede para Racks com 2 processadores - Servidor rack novo 2 sockets 768GB: 15 unidades - Servidor rack novo 2 sockets 192GB: 4 unidades (aprovados em 15.03.19)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.210.000,00	Valor estimado com base no PE 86/2018 do TST (licitação em andamento, valores informados no comprasinet em 27/11/2018)	30.11.18 - Reunião Comitê	1.210.000,00	15.03.19 - Reunião Comitê	2.063.240,00	2.063.240,00	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	LTA	118/2014 13/2015	29/04/20 27/05/20	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento
64	Renovação Servidores de Rede para Racks com 4 processadores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação Servidores de Rede para Racks com 4 processadores - Servidor rack novo 2 sockets 384GB: 9 unidades (aprovados em 15.03.19)	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.142.288,00	Valor estimado com base no PE 86/2018 do TST (licitação em andamento, valores informados no comprasinet em 27/11/2018) - 9 unidades item 15; - 2 unidades item 15; - 1 unidade não será renovada, será utilizada para desenvolvimento e homologação.	30.11.18 - Reunião Comitê	1.142.288,00	15.03.19 - Reunião Comitê	900.296,91	900.296,91	PEI-Objetivo 2-Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do PJe	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	LTA	118/2014 13/2015	29/04/20 27/05/20	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado Atual TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status		
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DOD/ Estudos Preliminares	Termo de Referência				
65	Renovação Servidores de Rede em Lâmina (blade)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação Servidores de Rede em Lâmina (blade) - Contrato 13/2015 1 unidade vence em 27/05/2020	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	640.000,00	Valor estimado com base no PE 86/2018 do TST licitação em andamento, valores informados no comprasnet em 27/11/2018) Itens que serão renovados: - 2 unidades item 1; - 5 unidades item5. Os demais servidores não serão renovados, serão utilizados para desenvolvimento e homologação.	30.11.18 - Reunião Comitê	640.000,00	15.03.19 - Reunião Comitê	0,00	0,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM ARP	LTA	13/2015	27/05/20	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019			Suspensa	
66	Aquisição de Servidores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de Servidores visando centralizar os bancos de dados atualmente contidos em equipamentos servidores nas varas do interior, no datcenter em Porto Alegre. Expansão da solução de armazenamento para novos projetos que envolvem geração de arquivos de áudio e vídeo, que não requerem tanto desempenho. Os estudos técnicos preliminares da contratação deverão avaliar sobre a vantagem de investir em nova solução de menor custo/TB ou expandir a atual, que já está consolidada. Projeto envolve a construção de estúdio de gravação no TRT, para o qual foram adquiridos equipamentos em 2018.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	414.000,00	Orçamento preliminar	30.11.18 - Reunião Comitê	414.000,00			414.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	-	-	-	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019			Suspensa	
67	Expansão da solução de armazenamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução de Armazenamento de Certificados Digitais (HSM). Melhorar a gestão dos certificados digitais emitidos no âmbito do TRT da 4ª Região, de modo que os certificados dos magistrados e servidores sejam armazenados centralizadamente sem necessidade de tokens. CONTRATAÇÃO CANCELADA CONSIDERANDO POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADOTADOS ATUALMENTE, POR OUTRA TECNOLOGIA.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	2.382.600,00	Valor estimado com base na expansão da contratação anterior corrigido pelo dólar do período mais 10%.	30.11.18 - Reunião Comitê	2.382.600,00			2.382.600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	SERCOMPE	91/2016	16/03/22	abril/2019	maio/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento	
68	Solução de Armazenamento de Certificados Digitais (HSM)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Solução de Armazenamento de Certificados Digitais (HSM). Melhorar a gestão dos certificados digitais emitidos no âmbito do TRT da 4ª Região, de modo que os certificados dos magistrados e servidores sejam armazenados centralizadamente sem necessidade de tokens. CONTRATAÇÃO CANCELADA CONSIDERANDO POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADOTADOS ATUALMENTE, POR OUTRA TECNOLOGIA.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	0,00	Orçamento preliminar - CANCELADO	30.11.18 - Reunião Comitê	0,00			0,00	PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica												Cancelada
69	Licença do Software Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição de apenas uma licença desse tipo, o que garante acesso à base de conhecimentos da ferramenta que é utilizada como sistema operacional do Pje e outros.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	6.500,00	Estimado com base no valor da contratação anterior por 5 anos	30.11.18 - Reunião Comitê	6.500,00			6.500,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	SYSTEM MANAGER	0342/18-4	18/08/19	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento	
70	Fitas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Fitas utilizadas para realização de backup de dados do Tribunal.	Despesa Corrente	Causas na Justiça do Trabalho	40.000,00	Estimado com base na última compra mais possível reajuste	30.11.18 - Reunião Comitê	40.000,00			40.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	DISKET	0037/17-0	05/03/19	sob demanda	sob demanda	junho/2019	junho/2019			Em Andamento	
71	Registro Anual da Base de Roteamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço necessário em função do Tribunal ser uma AS, que gerencia seus próprios endereços de rede CONTRATAÇÃO JÁ APROVADA PELO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC EM 2018.	Despesa Corrente	Causas na Justiça do Trabalho	15.000,00	Orçamentos de mercado obtidos em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	15.000,00			15.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA	TELETEX	042/15-4	05/08/18	dezembro/2018	janeiro/2019	dezembro/2018	janeiro/2019			Suspensa	
72	Licenças Microsoft Server	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão do parque de servidores virtuais - 40 licenças Server Aquisição de licenças Remote Desktop exigidas para uso do Gabinete Virtual.- APROVADA EM 2018, 678 licenças RMS.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	326.425,06	Estimado com base da ARP do TRT1	30.11.18 - Reunião Comitê	326.425,06			326.425,06	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS				abril/2019	maio/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento	
73	Memórias para Servidores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	APROVADO EM 2018, LICITAÇÃO EM ANDAMENTO. Ampliação da capacidade dos servidores físicos que formam a infraestrutura de virtualização de Tribunal, visando melhorar o desempenho das dos servidores virtuais que sustentam diversos serviços.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	52.710,00	Estimado com base nos estudos técnicos preliminares da contratação em andamento encaminhada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	52.710,00			52.710,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO				setembro/2018	outubro/2018	Contratação encaminhada em out/2018	Contratação encaminhada em out/2018			Contratação anos anteriores	
74	Licença Software Powershell Studio 2018	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Software utilizado para automatização de rotinas a serem executadas nos microcomputadores que são necessárias sempre que os usuários realizam logon na rede do Tribunal.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	4.500,00	Estimado com base em orçamentos obtidos no mercado em 2018 mais possível reajuste	30.11.18 - Reunião Comitê	4.500,00			4.500,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA				dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019			Em Andamento	
75	Renovação Parque de Notebooks	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovação do parque de notebooks - Compra 0018/16-9 226 unidades vencem em 06/12/19 - Compra 0027/16-9 10 unidades vencem em 20/12/19 - Todas essas máquinas são usadas pelas Varas do Trabalho e Escola Judicial.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	944.000,00	Valor estimado com base em valor de mercado, considerando modelo semelhante ao utilizado, com 5 anos de garantia.	30.11.18 - Reunião Comitê	944.000,00			944.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO OU ADESAO REGISTRO DE PREÇOS	POSITIVO	0018/16-9 0027/16-9	06/12/19 20/12/19	maio/2019	junho/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento	
76	Renovação parque de TVs Aeropauta e expansão para EJ	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Renovação de TVs que apresentam o acompanhamento de pautas nas Varas do Trabalho.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	197.200,00	Valor estimado para 116 TVs (112 antigas e 4 expansões) com base em contratações similares no Painel de Preços.	30.11.18 - Reunião Comitê	197.200,00			197.200,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO OU ADESAO REGISTRO DE PREÇOS	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019	abril/2019			Em Andamento	
77	Raspberrys para Aeropauta	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Equipamento a ser acoplado nas TVs para o serviço de Aeropauta. Empresa vencedora do certame conduzido pelo TRT18 não aceitou adesões. Será preciso realizar nova licitação.	Despesa de Capital	Causas na Justiça do Trabalho	46.000,00	Valor estimado com base no registro de preços realizado pelo TRT18, considerando valor do equipamento e fonte para 115 unidades	30.11.18 - Reunião Comitê	46.000,00			46.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO				janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019	abril/2019			Em Andamento	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ AUTORIZAÇÃO		GOVERNANÇA DE TIC RETIFICAÇÃO		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PD TIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor	Forma	Valor					EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	DDI/ Estudos Preliminares	Termo de Referência			
78	Impressoras Coloridas A4	Diversas Áreas	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Renovação das impressoras laser coloridas A4 utilizadas nos seguintes setores do TRT: - 1 para Secretaria-Geral da Presidência; - 1 para Corregedoria; - 1 para Secretaria de Apoio aos Magistrados; - 2 para Escola Judicial; - 1 para Seção de Perícias; - 1 para SEGESP; - 1 para Memorial; - 1 para Assessoria de Gestão Estratégica; - 1 para Gráfica; - 1 para Direção do Foro de Porto Alegre. Aquisição de impressoras laser coloridas para os seguintes setores do TRT: - 1 para Vice-Presidência.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	62.628,00	Valor estimado com base em orçamentos e pesquisa no Painel de Preços durante os estudos técnicos preliminares da contratação realizada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	62.628,00	15.03.19 - Reunião Comitê	26.095,00	26.095,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	dezembro/2018	janeiro/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
79	Impressoras Coloridas A3	Diversas Áreas	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. - Renovação da impressora laser colorida A3 de grande porte utilizada na Gráfica. - Renovação da impressora colorida A3 de pequeno porte utilizada na SEMPRO. - Substituição de impressora laser colorida A4 utilizada na Secretaria de Comunicação Social por uma impressora colorida A3 de pequeno porte.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	41.835,24	Valor estimado com base em orçamentos e pesquisa no Painel de Preços durante os estudos técnicos preliminares da contratação realizada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	41.835,24	15.03.19 - Reunião Comitê	41.835,24	41.835,24	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	dezembro/2018	janeiro/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
80	Impressoras Plotter	Secretaria de Manutenção e Projetos	APROVADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. PLOTTERS COM VALOR MUITO SUPERIOR AO ESTIMADO. - Renovação de 1 impressora Plotter e 1 impressora Plotter Multifuncional utilizadas pela SEMPRO.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	205.744,08	Valor estimado com base em orçamentos e pesquisa no Painel de Preços durante os estudos técnicos preliminares da contratação realizada em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	205.744,08	15.03.19 - Reunião Comitê	205.744,08	205.744,08	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	dezembro/2018	janeiro/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
81	Roletas de scanners	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Suprimento para scanners utilizados na seção de classificação e autuação e memorial	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	8.175,00	Valor estimado com base em orçamentos.	30.11.18 - Reunião Comitê	8.175,00		8.175,00	8.175,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	-	-	-	janeiro/2019	fevereiro/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
82	Teclados e mouses	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Renovar os teclados e mouses dos computadores substituídos em 2018, pois houve revesão na entrega dos mouses e teclados adquiridos junto do lote de microcomputadores adquiridos em 2018.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	140.000,00	300 com base no numero de chamados de 2018 (58)	30.11.18 - Reunião Comitê	140.000,00		140.000,00	140.000,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS	-	-	-	fevereiro/2019	março/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
83	Docking Station para Notebooks	Comitê de Governança de TIC	Para os magistrados que solicitam o recurso para conexão direta do notebook aos periféricos utilizados em casa.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	21.000,00	Valor estimado com base na última compra de docks, considerando que todos os 30 magistrados solicitem.	30.11.18 - Reunião Comitê	21.000,00		21.000,00	21.000,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	-	-	-	janeiro/2019	fevereiro/2019	janeiro/2019	fevereiro/2019			Suspensa
84	Leitores externos de CD/DVD	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	AUTORIZADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Em função da aquisição dos novos modelos de computadores com gabinete mini, que não possuem drives de CD/DVD, é necessária a aquisição de leitores externos de CD/DVD para as unidades judiciais de 1º grau poderem ler ou copiar mídias com provas que são juntadas aos processos.	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	19.760,00	Orçamento preliminar	30.11.18 - Reunião Comitê	19.760,00		19.760,00	19.760,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	-	-	-	janeiro/2019	fevereiro/2019	maio/2019	junho/2019			Em Andamento
85	Máquina para treinamento de modelos de aprendizagem	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Servidor com características especiais de processamento, necessário para o projeto de inteligência artificial do Tribunal	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	90.636,00	Menor composição de orçamentos (cotações do site do fabricante Dell em separado para servidor: R\$61.237 + placa GPU: R\$29.399)	30.11.18 - Reunião Comitê	90.636,00		90.636,00	90.636,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO	-	-	-	fevereiro/2019	março/2019	abril/2019	maio/2019			Em Andamento
86	Consultoria solução de indexação de conteúdo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	AUTORIZADO EM 2018, MAS NÃO EXECUTADO. Atualmente, a pesquisa de jurisprudência do Tribunal é oferecida através de uma nova implementação baseada em Elastic Search. Apesar de ser uma solução livre, sem necessidade de aquisição, é necessária a contratação de suporte à solução visando a segurança do serviço de pesquisa de jurisprudência oferecido a todas unidades judiciais do Tribunal e ao público externo.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	60.000,00	Orçamento preliminar	30.11.18 - Reunião Comitê	60.000,00		60.000,00	60.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	COMPRA DIRETA	-	-	-	junho/2019	julho/2019	junho/2019	julho/2019			Em Andamento
87	SUCESU - Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Anuidade 2018 da associação do TRT junto a SUCESU-RS	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	2.300,00	Valor estimado com base na contratação anterior mais possível reajuste	30.11.18 - Reunião Comitê	2.300,00		2.300,00	2.300,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Aperfeiçoar a gestão de TIC PETIC-Objetivo 7-Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal.	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	COMPRA DIRETA	SUCESO	0277/18-4	31/12/18	dezembro/2018	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019			Em Andamento
88	Software Monitoramento de Alarmes	Coordenadoria de Segurança Institucional	Software utilizado na Central de Monitoramento da Segurança Institucional para monitorar os alarmes de intrusão nas unidades da Justiça do Trabalho RS incluindo prédios administrativos e judiciais da Capital e do Interior do Estado	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	18.000,00	Valor estimado com base nos estudos técnicos preliminares da licitação em andamento em 2018	30.11.18 - Reunião Comitê	18.000,00		18.000,00	18.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Assegurar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	MONI	0538/17-4 0532/18-4	31/12/18	Contratação encaminhada em 2018	Contratação encaminhada em 2018	março/2019	março/2019			Em Andamento
89	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA	Presidência	Software utilizado por magistrados e servidores para elaboração de sentenças líquidas	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.300,00	Valor estimado com base na contratação anterior mais possível reajuste	30.11.18 - Reunião Comitê	1.300,00		1.300,00	1.300,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PEI-Objetivo 4 Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	DEBIT	0342/17-4 0488/18-4	29/10/19	julho/2019	agosto/2019	julho/2019	agosto/2019			Em Andamento





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC – 2019

Item	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA PRELIMINAR (R\$) 30.11.18	ORIGEM VALOR ESTIMADO ATUAL	DELIBERAÇÕES COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC		Valor Estimado ATUAL TOTAL	Vínculo com o PDTIC, PETIC ou PEI	Unidade Técnica	Forma Contratação	DADOS CONTRATOS ATUAIS			PRAZO DE ENTREGA ORIGINAL		PRAZO DE ENTREGA ATUAL		Data Encaminhamento	Status	
								Forma	Valor					Forma	Valor	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO			DDI/ Estudos Preliminares
90	Manutenção Software AUTOCAD	Secretaria de Manutenção e Projetos	O software AUTOCAD é utilizado pela SEMPRO para realizar tarefas diversas de projeto e documentação das edificações ocupadas por este Tribunal. Tal software é amplamente utilizado por arquitetos, engenheiros e empresas da construção civil. O serviço de suporte técnico com o fornecimento de atualizações é necessário para manter o conjunto de licenças atualizado, evitando a defasagem do software e a emissão de correções disponibilizadas pelo fabricante.	Despesa Corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	200.000,00	Valor estimado com base na contratação anterior mais possível reajuste	30.11.18 - Reunião Comitê		200.000,00	PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO	BEST SUL	0039/16-8	04/12/19	julho/2019	agosto/2019	junho/2019	julho/2019		Em Andamento	
91	Software PLEO	Secretaria de Manutenção e Projetos	Planilha eletrônica de orçamento utilizada pela SEMPRO para orçamentos de obras civis com atualização mensal de insumos	Despesa de Capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	1.586,00	Contratação 2018	30.11.18 - Reunião Comitê		1.586,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA	FLANARIN	0037/17-4	05/03/19			fevereiro/2019	março/2019		Em Andamento	
92	Webcams	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Webcams	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	30.000,00	Orçamento preliminar	30.11.18 - Reunião Comitê		30.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO OU ADESAO REGISTRO DE PREÇOS				janeiro/2019	fevereiro/2019	maio/2019	junho/2019		Em Andamento	
93	Controle de Acesso Integrado de Pessoas e Veículos para o Foro Trabalhista de Porto Alegre e para o Complexo do Prédio-Sede	Coordenadoria de Segurança Institucional	Controle necessário para elevar o nível de proteção das pessoas que circulam pelo Foro Trabalhista de Porto Alegre e, também, gerenciar o acesso de veículos aos estacionamentos daquela unidade judiciária. O Tribunal utiliza geradores a diesel para assegurar a continuidade de funcionamento dos datacenters em caso de falta de energia da concessionária.	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Orçamento preliminar	15.03.19 Reunião Comitê		244.385,65	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	PREGÃO						março/2019	abril/2019		Em Andamento	
94	Abastecimento diesel geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Switches SAN do TRT saem de garantia em setembro/2020, porém não será mais possível renovar o serviço porque os equipamentos estão em End Of Support, o que demanda a aquisição de novos equipamentos	Despesa corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Orçamento preliminar	15.03.19 Reunião Comitê		17.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA							abril/2019	maio/2019		Em Andamento
95	SWITCHES SAN	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Switches SAN do TRT saem de garantia em setembro/2020, porém não será mais possível renovar o serviço porque os equipamentos estão em End Of Support, o que demanda a aquisição de novos equipamentos	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Valores da compra dos equipamentos (2011) e expansão de portas (2016) atualizados pela variação cambial	15.03.19 Reunião Comitê		752.400,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PREGÃO							maio/2019	junho/2019		Em Andamento
96	Rack de telecomunicação	SEMPRO	Os racks são utilizados na infraestrutura de rede lógica, telefonia e afins e permitem a instalação do cabeamento estruturado nas edificações. Localidades com obras em andamento que necessitam de rack: Estrela, Vacaria e Arroio Grande	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Contrato atual	15.03.19 Reunião Comitê		10.526,79	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4							abril/2019	abril/2019		Em Andamento
97	Certificados Digitais ICP Brasil para SISCONDJ e Infoconv	Corregedoria e Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	- Certificado necessário para implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (Siscondj). Este sistema permite a emissão de alvarás eletrônicos pelas Varas do Trabalho através de sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil. - Certificado ICP Brasil para sistema Infoconv	Despesa corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Orçamento preliminar	15.03.19 Reunião Comitê		600,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 3-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários PETIC-Objetivo 2- Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho. PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	ADITIVO CONTRATUAL							abril/2019	maio/2019		Em Andamento
98	Certificado Digital E-CNPJ A3	SECOF	Reemissão do certificado emitido em out/18 e que não foi encontrado pela Presidência. Certificado é obrigatório para envio das informações da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Despesa corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Orçamento preliminar	Autorizado pela Secretaria Geral da Presidência		435,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	COMPRA DIRETA							abril/2019	abril/2019		Em Andamento
99	Servidores interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Servidores interior cenário 1 reunião 15.03.19	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Contrato atual	15.03.19 Reunião Comitê		148.750,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 5-Melhorar a Disponibilidade do Pje	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA MEDIANTE ARP TRT4							maio/2019	junho/2019		Em Andamento
100	Certificado E-CNPJ A1	Secretaria de Orçamento e Finanças	É obrigatório para envio das informações para o eSocial, sistema público de escrituração digital, que unifica todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, das empresas e órgãos públicos. Quando da entrega da 1ª versão de testes do conector de envio de dados ao Sistema do eSocial, por parte do TRT da 11ª Região, constatou-se que há a necessidade de uso do certificado digital do tipo A1.	Despesa corrente	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Orçamento preliminar	08.02.19 - E-mail		410,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 4-Aprimorar a segurança da informação	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COMPRA DIRETA							fevereiro/2019	fevereiro/2019	fev-19	Encaminhada
101	Licenças Windows 10 para servidores CTV	Coordenadoria de Segurança Institucional	A aquisição de licenças para sistema operacional Windows 10 é necessária para que os softwares VMS que farão a gravação das imagens dos circuitos fechados de televisão do Tribunal sejam instalados nos novos servidores virtualizados. Dessa forma, será abandonado o uso dos DVRs do tipo workstation e as imagens das câmeras de vigilância serão geradas pelos novos computadores-servidores. Sistema CTV não é compatível com Linux. 43 localidades	Despesa de capital	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	-	Estimado com base da ARP do TRT1	15.03.19 Reunião Comitê		43.000,00	PEI-Objetivo 2 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC PETIC-Objetivo 1-Promover a contínua melhoria dos serviços com foco na satisfação dos usuários	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS							abril/2019	maio/2019		Em Andamento

Despesa total em Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho (Orçamento TRT4)	R\$17.624.520,40
Despesa total em Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação (Orçamento CSJT)	R\$5.375.301,61
Despesa total em Manutenção e Gestão dos Sistemas de TI (Itens obrigatórios - Orçamento CSJT)	R\$3.051.523,12
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO</b>	<b>R\$26.051.345,13</b>
