




Monitoramento do Portfólio de Serviços, Programas e Projetos de TIC


AGOSTO – 2023





Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores



Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021
 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706




Resumo dos Programas e Projetos de TIC




Números dos Projetos do DTI/CNJ

Distribuição dos Projetos por Unidade

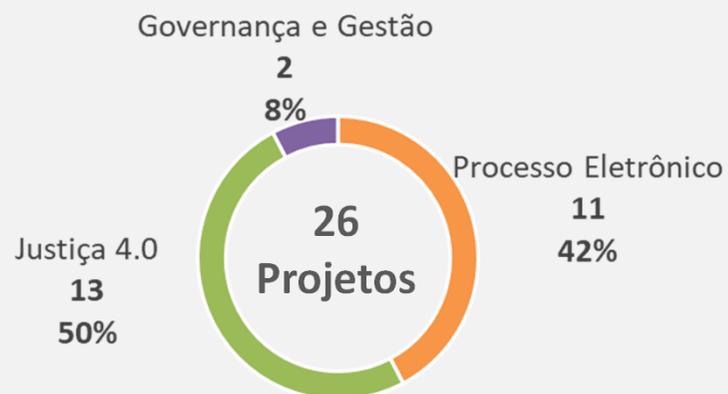


Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026



*Projetos de impacto nacional.

Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

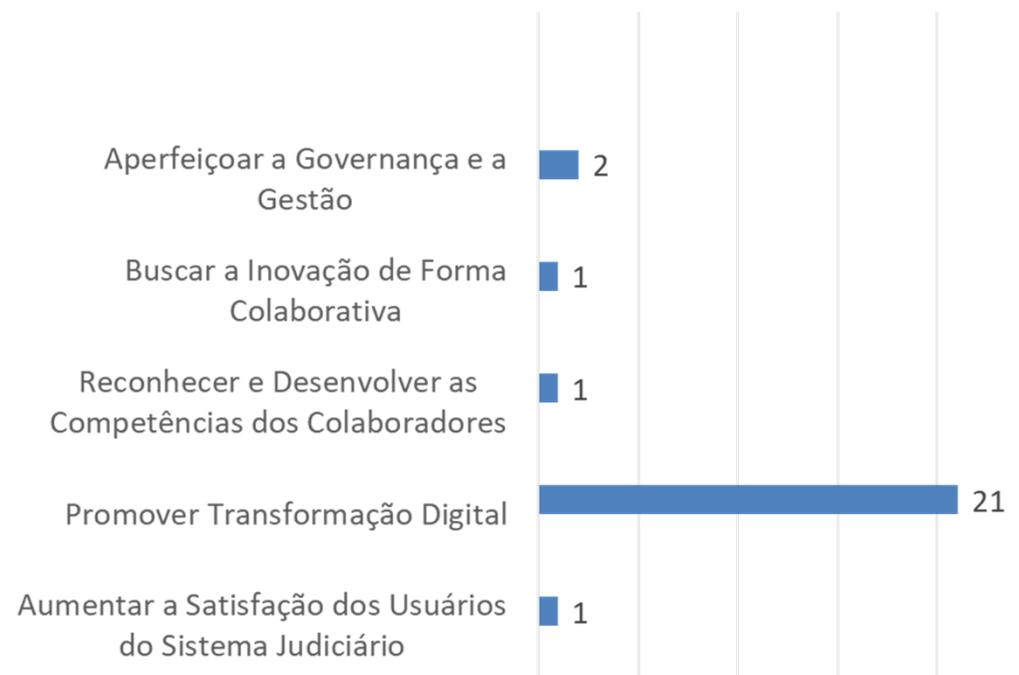

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	PREVJUD
Progresso	95% Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br , onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.
Entregas Realizadas	-
Próximas Entregas	- Processo Administrativo Previdenciário : Publicação junto com as demais melhorias e correções do Módulo Previdenciário (Dossiês e Intimação) - data a definir; Mod. Previdenciário : Inclusão de novos dados de dependentes: Realização de novos mapeamentos na aplicação para que os dados sejam retornados nos Dossiês; Intimação Judicial : Acompanhamento dos pilotos do TRF-3 e TRF-4; e Preparação da Documentação referente a versão 02 (versão com diversas melhorias e correções) dos <i>endpoints</i> para apresentação aos TRFs; Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev; Realização de webinários específicos para ramos da Justiça; e Aprimoramento dos tutoriais já lançados; Painel de BI.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Projeto	BNMP 3.0
Progresso	65% Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.
Entregas Realizadas	Homologações concluídas : Menu de Estatísticas; Guia de Internação; Regras Negociais para Dashboards (1901); Erro ao imprimir minuta para status aguardando assinatura; Melhoria do Cadastro da Parte; Alerta de não retorno da saída temporária; Guia de internação; Guia de Recolhimento; Certidão de Cumprimento do Mandado de Recaptura.
Próximas Entregas	Em homologação : Evento Audiência de Custódia / Análise de APF; Mandado de Acompanhamento de Medida diversa da prisão; Integração Sistac; Mandado de monitoramento eletrônico - Cautelar - Mandado de Monitoramento Eletrônico – Execução; Em desenvolvimento FrontEnd : 9 serviços; 13 peças; Em desenvolvimento BackEnd : 2 peças; Integrações: Sistac – aguardando término do módulo de “Audiência de Custódia” para iniciar homologação; ARPEN – em ajustes e correções.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Codex - Melhorias Evolutivas
Progresso	65% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Aprimoramentos no Codex , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.
Entregas Realizadas	Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua) com resolução de 50 issues, entre elas: [Extrator] Alterar o Job reprocessar itens com falhas no processamento (Correção de falha no reagendamento dos documentos; Melhoria na funcionalidade de sincronização dos órgãos julgadores e Ajuste no processamento da estrutura do reagendamento em lotes dos documentos); [Extrator] Implementação da funcionalidade histórico de distribuição no micro serviço (Garante que as informações dos tribunais sejam extraídas, sincronizadas e entrem em conformidade com a base do Codex .A melhoria deste incremento garante que um processo que foi distribuído a um determinado órgão julgador, e este órgão não sendo competente para julgá-lo, ocorra a redistribuição a outro órgão); [Conversor] Implementação da funcionalidade histórico de distribuição no micro serviço (Garante que as informações dos tribunais sejam convertidas e entrem em conformidade com a base do Codex: A melhoria deste incremento garante que um processo que foi distribuído a um determinado órgão julgador, e este órgão não sendo competente para julga-lo, ocorra a redistribuição a outro órgão).
Próximas Entregas	Atividade contínua: resolução de <i>issues</i> , correção de falhas e implementação de melhorias na ferramenta de acordo com as prioridades identificadas no backlog.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Projeto	Sniper
Progresso	96% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Software para cruzamento de informações de bases de dados diferentes , destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas.
Entregas Realizadas	-
Próximas Entregas	- Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em avaliação; e Publicação em produção do Módulo de Dados Sigilosos (previsão: AGO/23) ; e Capacitação autoinstrucional sobre Módulo de Dados Sigilosos (previsão: AGO/23) ; Base de dados do radar em revisão; Treinamento <i>Hands-on</i> para equipe CNJ de suporte.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Domicílio Eletrônico	
Progresso	92%	Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Módulo que possibilitará o recebimento de citação e intimação dos processos eletrônicos pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.	
Entregas Realizadas	- Empresas cadastradas: 3.243 empresas cadastradas; Usuários cadastrados: 962 usuários de empresas; 6 tribunais em produção (TJMT, TJRS, TJPA, TJRJ, TJGO e TJDFT); 21.908 comunicações processuais; Integração das empresas com APIs do Domicílio Eletrônico: 10 empresas com APIs liberadas em produção; 3 empresas conectadas em produção (Santander, Itaú e Luso); 27 empresas em homologação – Destaque para Caixa e Nubank.	
Próximas Entregas	Tribunais com integração em andamento: Total: 30 tribunais; Federal (4): TRF1, TRF-3 (PJe), TRF-4 (ePROC) e TRF-5 (PJe); Trabalho (3): TRT-9 (PJe JT), TRT16 e TST (PJe JT); Militar (3): TJMRS (eproc), TJMSP (PJe) e TJMMG (eproc); Eleitoral (1): TSE (PJe); Estaduais (19): PJe e Projudi – TJBA; PJe - TJAP, TJCE, TJMA, TJMG, TJPB, TJRN, TJES e TJRO; Projudi - TJAM, TJGO, TJPR e TJRR; SAJ – TJMS e TJSP; ePROC – TJSC, TRF4; SCVP – TJSE; PJe, DCP e EJUD – TJRJ	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens	
Progresso	96%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Sistema que visa o cadastro e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.	
Entregas Realizadas	- Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em elaboração.	
Próximas Entregas	- Implementação do Plugin SNGB via CODEX; Identificação e categorização dos problemas apontados pelos usuários no uso do sistema (bugs, usabilidade e performance); e Diagnóstico sobre a proposta visual e usabilidade do sistema.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Sinapses - Precedentes Qualificados	
Progresso	100%	Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de uma solução de Inteligência Artificial para busca e análise dos precedentes qualificados, com foco nos tribunais superiores (STJ e STF) , de forma que o algoritmo resultante seja capaz de identificar precedentes qualificados.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Aditivo de prazo e escopo em avaliação.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Serviços Estruturantes	
Progresso	98%	Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os módulos essenciais para o funcionamento da PDPJ-br.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	<p>- Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO): [Melhoria] Tela para acompanhamento dos logins pelos administradores dos Tribunais; [Melhoria] Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; [Melhoria] Habilitar health check do Keycloak; Serviço de Notificações: [Melhoria] Envio de Notificações por Telegram; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Minhas subscrições"; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Notificação em formato Email"; [Melhoria] Enviar notificações no formato Documento via Telegram; Pessoas e Endereços: [Melhoria] Validar CPF do operador; [Correção] Gravar origem do endereço inserido; [Correção] Não está ocorrendo atualização de atributos de pessoas físicas; [Melhoria] Melhorar a pesquisa PF por nome (bCPF); [Melhoria] Inserir atributos referentes a raça indígena.</p>	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Portal de Serviços	
Progresso	57%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país, poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.	
Principais Entregas	-	
Próximas Entregas	- Funcionalidade "Consulta Processual"; Funcionalidade "Peticionar"; Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.	
Impedimentos	- Revisão de escopo prevendo a implementação do Portal utilizando a nova arquitetura da PDPJ-Br.	

Projeto	Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA	
Progresso	89%	Data de Término 30/09/2023
Resultado Esperado	Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados", a ser lançado em setembro de 2023.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Justiça 4.0

Projeto	Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br	
Progresso	18%	Data de Término 31/08/2024
Resultado Esperado	Elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Plano de Trabalho em definição junto à Unifor; A serem oferecidos primeiro em formato síncrono com aulas ao vivo e depois em formato autoinstrucional via Ceajud: Capacitação em Java Básico; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Angular; e Capacitação em Testes Automatizados.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Justiça 4.0

Projeto	Expansão Codex	
Progresso	98%	Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Expansão do Codex para 92 Tribunais .	
Entregas Realizadas	- 2 tribunais em produção : TJMS e TJTO; Resolução de <i>issue</i> identificada no conversor do SAJ com o envio bem sucedido de dados pelo TJSP.	
Próximas Entregas	- A equipe segue prestando suporte aos Tribunais por meio dos canais de atendimento Rocket Chat e OTRS; realizando o inventário de atualizações dos microsserviços em andamento.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Justiça 4.0

Projeto	Data Lake
Progresso	41% Data de Término 31/10/2023
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os dados originados de sistemas do Poder Judiciário .
Entregas Realizadas	- Definição e validação da arquitetura ; testes funcionais; estimativa de custos.
Próximas Entregas	- Infraestrutura com desempenho para ingestão de 400 mil processos/hora ; Finalização da infraestrutura (AWS Cloud); Finalização do MVP 2.0; Implementação do repositório de dados; Estruturação do dicionário de dados e documentação dos metadados; e Planejamento do Data Lake abrangendo o CODEX; Configuração do ambiente de testes (<i>sandbox</i>); Configuração do ambiente de homologação (CSJT); Provisionamento de ambiente de produção; Desenvolvimento de APIs e rotinas de consumo de dados.
Impedimentos	Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Processo Eletrônico

Projeto	Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional	
Progresso	54%	Data de Término 06/11/2024
Resultado Esperado	Revisão da versão nacional para garantir uma maior acessibilidade dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.	
Entregas Realizadas	<ul style="list-style-type: none"> - Implantado no TRF1 e TRF3; - (20 mil usuários) Versão 1.7.46: Armazenar Dados de Extensão no Pje; Módulo Salva e Recuperar Informações no PJe. 	
Próximas Entregas	- Implantação do TJMT e no TJMG.	
Impedimentos	- Sem Impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	RECEITAJUD (Automação do InfoJud)		
Progresso	85%	Data de Término	30/11/2023
Resultado Esperado	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
Entregas Realizadas	- Responsividade para Mobile. Declaração ITR (Imposto Territorial Rural).		
Próximas Entregas	- Relatório dos testes de estresse da Aplicação; Atualização do código da DIRPF (Python); Liberação do ambiente de produção pela RFB; Atualização da documentação.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	DATAJUD Integrado ao CODEX		
Progresso	55%	Data de Término	30/09/2023
Resultado Esperado	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
Entregas Realizadas	- DATAJUD - Protocolo 01 (Higienização das Informações).		
Próximas Entregas	- CODEX - Extrator Ler Tabela Histórico de Distribuição do PJe. - 11/09/2023; Casos Novos: 1. Issue de classes e movimentos - 2. Reprocessamento dos inaptos - 3. Tratamento dos movimentos/capa dos autos; Baixa Definitiva: 1. Delimitação da regra DATAJUD - 2. Extração dados unidades 6286 e 6665 - 3. Comparativo.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	E-Natjus		
Progresso	48%	Data de Término	30/05/2024
Resultado Esperado	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.		
Entregas Realizadas	- Hospital Albert Einstein: KeyCoack para o ambiente de Produção; TJBA - Solução (Natjus) aprovada pelo CNJ.		
Próximas Entregas	- Albert Einstein: Implantando Login para Perfis do Cooperativo; TJBA: Natjus Implementação do KeyCloack; Fluxo de Transação de Nota Técnica.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	Integração do e-Carta ao PJe		
Progresso	80%	Data de Término	29/12/2023
Resultado Esperado	Integrar o envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.		
Entregas Realizadas	- Primeiras visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).		
Próximas Entregas	- Novas visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ); Disponibilização do ambiente e interface para o Painel do eCarta no CNJ.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	84%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Ajustes e adequações com as extensões do TRF5.	
Próximas Entregas	- Homologação no ambiente do CNJ e Piloto junto ao TRF5.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	69%	Data de Término 31/10/2023
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais.	
Entregas Realizadas	- Piloto de integração do Mandamus com o TJMT em produção; Compilação do código da aplicação para rodar no IOS e subida para a Apple Store.	
Próximas Entregas	- Piloto com novos Tribunais parceiros (TJPA, TJBA e TRF1). Painel Web de Configurações /Administração do Mandamus.	
Impedimentos	- Sem impedimento.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	69%	Data de Término 20/05/2024
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com máximo de automação para enfrentar o problema da execução fiscal .	
Entregas Realizadas	- Piloto no TJCE e TJRJ; TJRN Piloto (e-Carta na Unidade Núcleo de Execução fiscal 4.0).	
Próximas Entregas	- Tribunal TJCE: Fluxo de Trânsito em Julgado; Reunião negocial com os Magistrados dos Tribunais envolvidos 29/08/2023.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	
Projeto	Mineração de Processos - JuMP	
Progresso	96%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.	
Entregas Realizadas	- Ajustes e melhorias de performance nos algoritmos de carga de dados junto ao Codex.	
Próximas Entregas	- Visualizações do Módulo de Impacto das Transições do Fluxo Processual.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)		
Progresso	75%	Data de Término	10/03/2024
Resultado Esperado	Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais receber as ordens de autorização de venda de bens , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
Entregas Realizadas	- MJSP Aplicação Pronta para receber Requisições no Webhook Produtivo; SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP.		
Próximas Entregas	- SNGB: Parceria com o TJGO para realização de testes; Vídeos de Orientações da Integração. MJSP - Integrar com o SNGB.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)		
Progresso	65%	Data de Término	30/06/2024
Resultado Esperado	Permitir que os tribunais realizem a gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
Entregas Realizadas	- Ajustes nos ambientes de homologação e desenvolvimento do SIDEJUD no CNJ; Criação e configuração das bases de dados no CNJ: Serviço de Manutenção, Serviço de Remuneração e Notificação de Mensagem.		
Próximas Entregas	- Módulo de Transação Bancária (Previsão 12/2023). Novos ajustes e configurações nos ambientes do SIDEJUD no CNJ (estrutura, pipeline e arquivos).		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital




Governança e Gestão

Projeto	Elaboração do Plano de Transformação Digital do CNJ	
Progresso	95%	Data de Término 30/08/2023
Resultado Esperado	Elaborar o Plano de Transformação Digital do CNJ alinhado com os objetivos da ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 370/2021).	
Entregas Realizadas	- Versão preliminar do Plano de Transformação Digital .	
Próximas Entregas	- Validação Revisão do PTD para 2023 . Encerramento do projeto.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Governança e Gestão

Projeto	Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário		
Progresso	85%	Data de Término	01/09/2023
Resultado Esperado	Implementar e operacionalizar o Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNMC-TIC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC-TIC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec).		
Entregas Realizadas	- Apresentação do SNMC-TIC para os tribunais, resultando no cadastro de 1189 servidores com o perfil de Analista; Criação do novo ambiente de homologação.		
Próximas Entregas	- Publicação do MVP 1.5; MVP 2.0 integração com o PJe.		
Impedimentos	- Não há impedimentos.		



Informações Finais



Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

Proposta de agenda:

1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- 20 de março – 13ª reunião
- 17 de abril – 14ª reunião
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- **21 de agosto – 18ª Reunião**
- 18 de setembro – 19ª Reunião
- 23 de outubro – 20ª Reunião
- Novembro – A definir
- Dezembro – A definir



Contatos

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- segpp@cnj.jus.br
