



RORAIMA

**Pedido de prorrogação de prazo para
implementação da Resolução CNJ nº 487/2023**

Sumário

Apresentação.....	3
ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO	3
AÇÕES E PRAZOS CORRESPONDENTES.....	5
AÇÃO 1: INSTITUIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ ESTADUAL INTERINSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA ANTIMANICOMIAL - CEIMPA OU GRUPO DE TRABALHO – GT	5
AÇÃO 2: REVISÃO DOS PROCESSOS DE MEDIDA DE SEGURANÇA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO	7
AÇÃO 4: ELABORAÇÃO DE FLUXO PARA A PORTA DE ENTRADA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	10
AÇÃO 5: ELABORAÇÃO DE FLUXO E METODOLOGIA PARA A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PESSOAS EM MEDIDA DE SEGURANÇA QUE AINDA ESTEJAM EM PRESÍDIOS COMUNS, ESTABELECIMENTOS, ALAS OU INSTITUIÇÕES CONGÊNERES DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO	11
AÇÃO 6: ELABORAÇÃO DE PLANO PARA IMPLANTAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES CONECTORAS, EQUIPES MULTIDISCIPLINARES QUALIFICADAS E/OU EAP	13
AÇÃO 7: ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE FORMAÇÃO SOBRE O TEMA.....	14
AÇÃO 8: EXPANSÃO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RAPS	15
Anexos	16

APRESENTAÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar a justificativa, cronograma de ações e prazos correspondentes para cumprimento a Resolução CNJ nº 487/2023. Considerando a implantação do CEIMPA e as atividades planejadas, bem como os trabalhos de articulação interinstitucional, faz-se mister a ampliação do prazo, conforme redação dada pela Resolução CNJ nº 572/2024, que altera os arts. 16, 17 e 18 da Resolução CNJ nº 487/2023.

Além das ações elencadas, foram realizadas diversas outras articulações com municípios e instituições públicas, além dos envios de comunicações oficiais, do monitoramento cotidiano da política e das reuniões periódicas e sistemáticas do Comitê estadual.

ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO

O Comitê Estadual da Política Antimanicomial de Roraima identifica a necessidade de dilação do prazo até julho de 2025.

No dia 20 de setembro de 2023, realizou-se uma reunião na sala de audiências da Vara de Execução Penal da Comarca de Boa Vista/RR, sob a presidência do Meritíssimo Juiz Titular, Dr. Daniel Damasceno Amorim Douglas. Estiveram presentes o Secretário de Saúde, Edson Castro Neto, o Promotor de Justiça, Dr. Antônio Scheffer, o Defensor Público, Dr. Wagner Silva dos Santos, a Diretora do Departamento do Sistema Penitenciário, Fabianny Leandro Silva Said, e a Diretora da Cadeia Pública Masculina de Boa Vista/RR, Maria José da Conceição.

Também participaram a médica representante do Ministério Público do Estado de Roraima, Dra. Fabiana Zimmermann, a representante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário (GMF), Débora Nobrega, a representante da Defensoria Pública de Roraima, Maylane Adriane Melo da Silva, a psicóloga do GMF, Dra. Renata Moz, uma representante da área de psicologia do GMF e a Assessora Jurídica, Juliana Quintela Ribeiro da Silva. A médica Dra. Mariângela Nasário Andrade participou remotamente, via videoconferência. O encontro teve como pauta principal a discussão de temas relacionados à saúde e ao acompanhamento psicossocial no sistema penitenciário do Estado de Roraima.

Mediante reunião realizada, os pares assumiram os seguintes compromissos: a) encaminhar a escala mensal dos médicos atuantes na Cadeia Pública; b) finalizar a ala psiquiátrica até o mês de

novembro do corrente ano, podendo o Sistema Penitenciário encaminhar os reeducandos em medida de segurança e com necessidade psiquiátrica assim que finalizado o bloco no HGR; c) adequar a estrutura física do HGR para recebimento dos reeducandos, sem prejuízo da transferência destes até o dia 02/10/2023, e; d) receber os reeducandos com necessidade de internação clínica a partir do dia 02 de outubro de 2023.

A partir desse momento foram transferidos todos os presos em situação de tratamento de saúde que estavam no bloco de saúde da Cadeia Pública, ficando 07 presos psiquiátricos, com medida de segurança a serem desintitucionalizados após realização dos PTSs e encaminhamentos conforme a política antimanicomial do poder Judiciário.

De acordo com informações prestadas pela coordenadora de psiquiatria do Hospital Geral, a construção do bloco de cuidados psiquiátricos não foi finalizada, a previsão de conclusão da obra será até novembro de 2024 para receber pessoas que se encontram em sofrimento mental.

Foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a Portaria TJRR/PR/GMF N. 12, DE 12 de Setembro de 2024 que instituiu o Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial (CEIMPA) com a participação efetiva dos representantes em conformidade ao que dispõe a Resolução CNJ nº 487/2023.

Atualmente a equipe técnica do GMF (assistente social e psicóloga) em parceria com a equipe técnica da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cadeia Pública de Boa Vista (médico psiquiatra, assistente social, psicólogo, enfermeiro), têm se reunido semanalmente para construção dos Planos Terapêuticos Singulares (PTS) das pessoas que estão sob medida de segurança para efetivar a desinstitucionalização dos mesmos. As equipes têm avaliando cada caso e estudado as situações de forma detalhada com ações planejadas e articuladas com a rede de serviços socioassistencial e de saúde do município com previsão de término **até março de 2025**.

Reiteramos que no âmbito estadual, o estado de Roraima não conta com Hospital Psiquiátrico ou instituições de caráter asilar para pessoas com transtornos psicossociais. Os presos que estão na Unidade prisional Cadeia Pública Masculina, sob medida de segurança são em número de 07 (sete) e estão em fase de construção dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTSs) sob acompanhamento da equipe técnica do GMF.

A título de informação, enquanto composição da rede socioassistencial, no âmbito do SUS, Roraima conta com 08 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 03 na capital Boa Vista e 05 no interior do estado (Alto Alegre, Bonfim, Pacaraima e Rorainópolis); 11 leitos integrais em saúde mental no Hospital Geral que estão em fase de reforma, 03 hospitais (Hospital Geral de Urgência e Emergência de Roraima/HGR, Hospital das Clínicas que atende internações, e Hospital Coronel Mota que atende somente clínica especializada), nenhuma Unidade de Acolhimento para pessoas em situação de rua ou com transtornos mentais, 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS) na capital, segundo dados da Gerência de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (SESAU).

No âmbito do SUAS, Roraima conta com 07 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) na capital, havendo cobertura em todos os 15 municípios do estado e 13 Centros Especializados de Referência da Assistência Social (CREAS), sendo 02 na capital Boa Vista.

A implementação dessa política tem sido fundamental para o aprimoramento da RAPS e do SUAS. No entanto, para garantir a desinstitucionalização de forma efetiva e qualitativa, especialmente das pessoas que permanecem detidas sob medida de segurança nas unidades prisionais, é imprescindível a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido. Esse período adicional será essencial para assegurar que o trabalho seja concluído com excelência. A articulação intersetorial entre secretarias e órgãos governamentais, que já está em curso, continuará a ser um pilar central para alcançar os objetivos propostos. Abaixo, apresentamos as ações planejadas e os cronogramas correspondentes, que permitirão a execução integral das metas dentro do prazo solicitado.

AÇÕES E PRAZOS CORRESPONDENTES

AÇÃO 1: INSTITUIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ ESTADUAL INTERINSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA ANTIMANICOMIAL - CEIMPA OU GRUPO DE TRABALHO – GT

Meta da ação: 1 Comitê instituído.

Status da ação: Realizado. Instituído o Comitê Interinstitucional Roraimense de Monitoramento da Política Antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 487/2023, por meio da Portaria TJRR/PR/GMF N. 12, DE 12 de Setembro de 2024, com a seguinte composição:

Compõem o Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial de:

1. Poder Judiciário, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização(GMF);
2. Poder Judiciário por meio da 1ª Vara de Execução Penal da Capital (VEP);
3. Ministério Público de Roraima (Promotoria da Execução Penal);
4. Ordem dos Advogados do Brasil/RR (OAB/RR);
5. Defensoria Pública de Roraima;
6. Secretaria Municipal de Saúde de Roraima/SMSA;
7. Secretaria Estadual de Saúde de Roraima/SESAU;
8. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Roraima (SEJUC);
9. Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social (SETRABES)
10. Secretaria Municipal de Gestão Social (SEMGES);
11. Conselho Regional de Serviço Social (CRESS);
12. Conselho Regional de Psicologia(CRP);
13. Conselho Regional de Medicina(CRM)

Tarefas	Início <i>[mês/ano]</i>	Término <i>[mês/ano]</i>	Responsáveis
Reunião de instituição CEIMPA	29/07/2024	-	GMF
Reunião de planejamento CEIMPA (Fluxo de saneamento das pessoas em cumprimento com medidas de segurança- PTS)	12/08/2024	12/08/2024	GMF
Deliberação de equipe emergencial para elaboração dos PTS das pessoas em Medidas de Segurança no CPMBV	26/08/2024	14/11/2024	GMF + Equipe de Saúde UBS/SESAU

Reunião CEIMPA – mobilização de rede do município para adesão equipe EAP-Desisnt (PORTARIA GM/MS Nº 4.876 DE 18 DE JULHO DE 2024)	Janeiro de 2025	-	GMF + SEMSA
Mobilização da Rede Psicossocial para divulgação do fluxo da política antimanicomial do poder judiciário.	Fevereiro de 2025	Março de 2025	GMF+CEIMPA

Produto da ação: Portaria TJRR/PR/GMF N. 12, DE 12 de Setembro de 2024

AÇÃO 2: REVISÃO DOS PROCESSOS DE MEDIDA DE SEGURANÇA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Meta da ação: Revisar 07 processos de pessoas em cumprimento de medida de segurança.

Status da ação: Neste momento, todas as pessoas já tiveram seus Projetos Terapêuticos Singulares elaborados.

Tarefas	Início <i>[mês/ano]</i>	Término <i>[mês/ano]</i>	Responsáveis
07 Processos de Medida de Segurança	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Equipe Técnica da UBS da Cadeia Masculina
07 Processos revisados	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Equipe Técnica da UBS da Cadeia Masculina
Realizar levantamento da população com transtorno mental e/ou deficiência psicossocial em conflito com a lei.	Agosto de 2024	Abril de 2025	GMF+VEP+SEJUC+SESAU
Elaboração de censo da população com transtorno mental, com indicação dos dados qualificadores, município de referência, se possui apoio familiar, se está referenciado/conectado com a rede SUS e SUAS, se possui necessidade de serviço residencial terapêutico, aspectos sociodemográficos, jurídicos e a situação clínico-diagnóstica.	Agosto de 2024	Abril de 2025	GMF+VEP+SEJUC+SESAU
Monitoramento e atualização da população com transtorno mental em unidades prisionais	Agosto de 2024	Contínuo	GMF+VEP+SEJUC+SESAU

Produtos da ação: 07 PTS emitidos à VEP.

Contexto e observações: Em contato com a Vara de Execução Penal foram identificados 07 pessoas nesta modalidade de cumprimento. Desde o mês de agosto de 2024, a equipe vem executando atividade de elaboração dos PTS.

AÇÃO 3: ARTICULAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES (PTS) DE TODAS AS PESSOAS EM MEDIDA DE SEGURANÇA E/OU EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE EM HCTPS OU CONGÊNERES, COM OU SEM A MEDIDA EXTINTA, DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Meta da ação: 07 PTS elaborados.


Status da ação: Articulação com a Secretaria de Estado da Saúde/SESAU e o GMF, foi solicitado que a equipe técnica da UBS da unidade prisional onde se encontram as pessoas em medida de segurança, realizassem a elaboração dos PTS enquanto não ocorre a instituição das equipes EAP.

Tarefas	Início [mês/ano]	Término [mês/ano]	Responsáveis
07 PTS elaborados	Setembro de 2024	Dezembro de 2024	Equipe Técnica da UBS da Cadeia Masculina + GMF
Mapear os serviços da Rede de Atenção a Saúde/RAS (com foco na Rede de Atenção Psicossocial/RAPS) e SUAS do estado.	Agosto de 2024	Finalizado	GMF
Atualização sistemática dos serviços, com contato e endereço, da RAPS e SUAS	Outubro de 2024	Dezembro de 2024	CEIMPA/Escritório Social
Articulação política através de reuniões com as Secretarias de Estado com pautas relacionadas à Política Antimanicomial e com o Núcleo Gestor do Governo do Estado, para apresentação do plano de ação	Fevereiro de 2025	Março de 2025	CEIMPA/GMF

Produtos da ação: Como produto desta ação, o GMF identificou no âmbito do SUS, que Roraima conta com 08 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 03 na capital Boa Vista, e 05 no interior do estado (Alto Alegre, Bonfim, Pacaraima e Rorainópolis), 15 leitos integrais em saúde mental no Hospital Geral que estão em fase de reforma, 03 hospitais (Hospital Geral de Urgência e Emergência de Roraima/HGR, Hospital das Clínicas que atende internações, e Hospital Coronel Mota que atende somente clínica especializada). Nenhuma Unidade de Acolhimento para pessoas em situação de rua ou com transtorno mental, 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS) na capital, segundo dados da Gerência de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima (SESAU).

No âmbito do SUAS, Roraima conta com 07 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) na capital, havendo cobertura em todos os 15 municípios do estado e 13 Centros Especializados de Referência da Assistência Social (CREAS), sendo 02 na capital Boa Vista.

Contexto e observações: Ainda como produto, foi construído um mapa ilustrativo desta rede de serviços socioassistencial e de *saúde*:

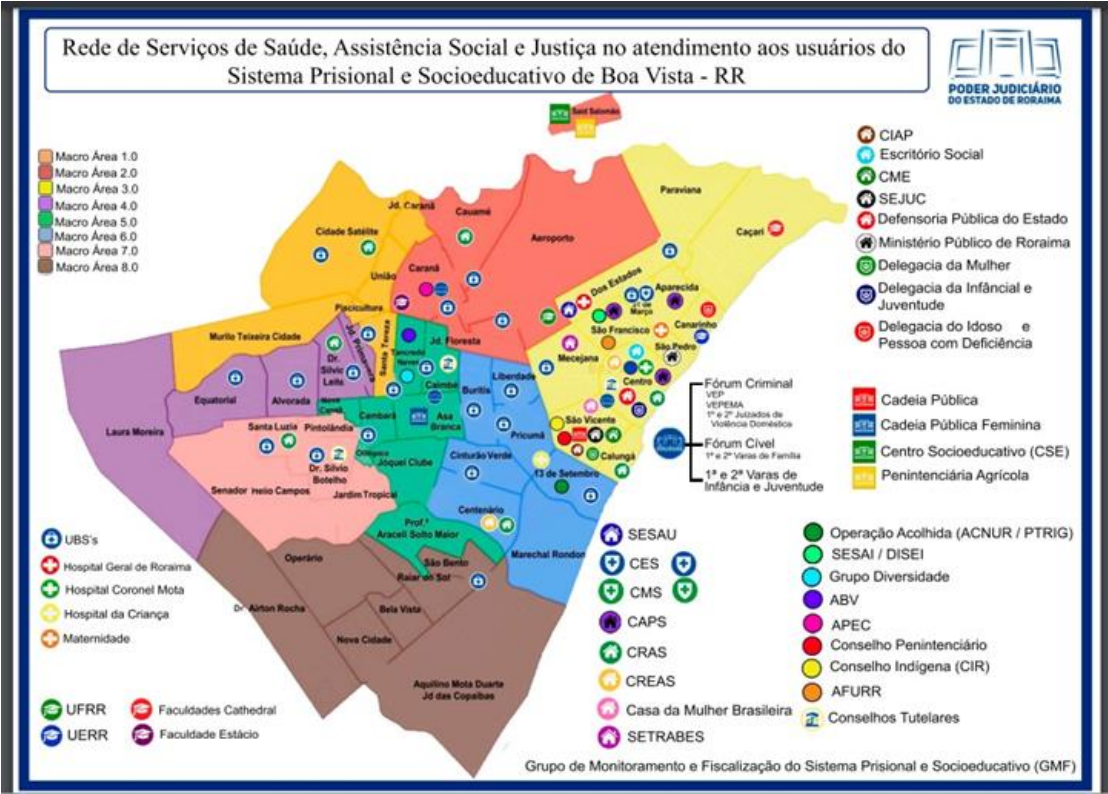

AÇÃO 4: ELABORAÇÃO DE FLUXO PARA A PORTA DE ENTRADA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Meta da ação: Elaboração de fluxo para a porta de entrada a partir da audiência de custódia.

Status da ação: Em construção.

Tarefas	Início [mês/ano]	Término [mês/ano]	Responsáveis
Realização de reuniões técnicas para alinhamento metodológico com vistas a subsidiar a construção dos procedimentos e fluxos interinstitucionais em conformidade com a Política Antimanicomial do	Fevereiro de 2025	Abril de 2025	CEIMPA/GMF

Poder Judiciário.			
Construção de procedimentos e fluxos interinstitucionais em conformidade com a Política Antimanicomial do Poder Judiciário.	Fevereiro de 2025	Maio de 2025	CEIMPA/GMF

Produtos da ação: Após elaboração dos fluxos interinstitucionais, publicação de portaria conjunta informando sobre as responsabilidades dos atores envolvidos.

- Resolução da Corregedoria do TJRR com fluxos de porta de entrada a partir da audiência de custódia e serviço APEC.
- Subsídios para magistradas e magistrados (BNMP);

Contexto e observações: O intuito da ação é fortalecer os fluxos interinstitucionais nas Audiências de Custódia e Serviço APEC. Prestando subsídios para esses atores fazerem articulações e encaminhamentos assertivos para a RAPS.

AÇÃO 5: ELABORAÇÃO DE FLUXO E METODOLOGIA PARA A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PESSOAS EM MEDIDA DE SEGURANÇA QUE AINDA ESTEJAM EM PRESÍDIOS COMUNS, ESTABELECIMENTOS, ALAS OU INSTITUIÇÕES CONGÊNERES DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

Meta da ação: Elaboração de 1 (um) fluxo.

Status da ação: Fluxo ainda não elaborado. No momento atual, o GMF, de forma emergencial, como deliberado em primeira reunião do CEIMPA, em conjunto com a unidade de saúde básica do estado presente na unidade prisional, onde estão acolhidos os reeducandos em cumprimento de medida de segurança, está realizando a elaboração dos Projetos Terapêuticos Singulares com vistas a desinstitucionalização dos casos. O GMF, por meio da equipe técnica está acompanhando esta ação e contribuindo com a articulação entre as instituições e poderes.

Tarefas	Início	Término	Responsáveis
---------	--------	---------	--------------

	[mês/ano]	[mês/ano]	
Elaborar Plano de ação de desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental em cumprimento de Medida de Segurança	Agosto de 2024	Setembro de 2024	GMF+Equipe UBS
Elaboração dos PTS das pessoas em cumprimento de Medida de Segurança	Setembro de 2024	Dezembro de 2024	GMF+Equipe UBS
Envio dos PTS e parecer para VEP para processo de desinstitucionalização	Setembro de 2024	Novembro de 2024	GMF+VEP
Monitoramento pelo Comitê dos dados de pessoas em meio aberto e demais informações da política antimanicomial	Outubro de 2024	Contínuo	CEIMPA, GMF
Matriciamento das equipes EAP para apoio na elaboração de PTS dos casos complexos de pessoas privados de liberdade no sistema prisional	Quando instituído		CEIMPA, GMF
Elaborar o fluxo para a desinstitucionalização das pessoas em medida de segurança.	Abril de 2025	Maio de 2025	CEIMPA, GMF
Implementação do fluxo criado	Maio de 2025	Junho 2025	CEIMPA, GMF

Produtos da ação: O produto dessa ação está sendo executado por meio da elaboração dos PTS pela equipe técnica da UBS Cadeia Pública masculina.

Contexto e observações: O GMF mobilizou a equipe técnica da UBS, para de maneira emergencial elaborar os PTS dos presos em medidas de segurança. Após a construção do fluxo e instituição de Equipe EAP, a responsabilidade passar a ser deste equipamento.

AÇÃO 6: ELABORAÇÃO DE PLANO PARA IMPLANTAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES CONECTORAS, EQUIPES MULTIDISCIPLINARES QUALIFICADAS E/OU EAP

Meta da ação: Mobilizar Secretaria Municipal e Estadual de Saúde para adesão à Portaria GM/MS Nº 4.876 DE 18 DE JULHO DE 2024 que institui equipe EAP.

Status da ação: Roraima não possui equipe EAP instituída. Atualmente estamos em fase de articulação com o poder executivo para a implantação de equipes EAP para atuação no estado.

Tarefas	Início [mês/ano]	Término [mês/ano]	Responsáveis
Mobilização do executivo municipal e/ou estadual para adesão equipe EAP-Desinstitucionalização.	Janeiro de 2025	Março de 2025	GMF + SEMSA e SESAU
Realização de concurso ou processo seletivo para composição das outras equipes EAP	Março de 2025	Abril de 2025	SEMSA, SESAU
Capacitação dessas equipes EAP	Abril de 2025	Maior de 2025	SEMSA, SESAU
Elaboração de fluxos institucionais	Maior de 2025	Julho de 2025	SEMSA, SESAU, EAP, GMF, CEIMPA

Produtos da ação:

- Edital de concurso, seleção pública ou instrumento congênere, para equipes EAP habilitadas pelo Ministério da Saúde;
- Emenda de Curso de Formação para novas equipes EAP;
- Fluxos entre VEP, Unidades Prisionais e EAP, de acompanhamento das pessoas em meio aberto.

Contexto e observações: É de fundamental importância articulação com os poderes executivos municipais e estaduais para implantação da Equipe EAP no estado. No momento atual, disputas político-partidárias interferem no andamento das ações. Assim, se faz necessário intervenção do Poder Judiciário para melhor diálogo entre os atores.

AÇÃO 7: ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE FORMAÇÃO SOBRE O TEMA

Meta da ação: Criação de 1 (um) cronograma de formação interna e externa do Comitê Estadual.

Status da ação: Em planejamento.

Tarefas	Início	Término	Responsáveis
---------	--------	---------	--------------

[mês/ano] [mês/ano]			
Capacitação de Equipe EAP	Após adesão do executivo municipal e/ou estadual à portaria MS	-	GMF+CNJ
Realização do I Seminário da Política Antimanicomial no Sistema de Justiça no Estado de Roraima	Abril de 2025	-	GMF/RR, CEIMPA
Realização de encontros temáticos para sensibilização de municípios para adesão à PNAISP; atuação de equipes conectoras; desigualdade social e questão manicomial; SUS e Reforma Psiquiátrica; desinstitucionalização e desinternação responsivas etc).	Abril de 2025	Julho de 2025	GMF, CEIMPA, SESAU, SMSA, SETRABES, SEMGES
Promoção de campanha de sensibilização para sistema de justiça sobre política antimanicomial	Abril de 2025	Julho de 2025	GMF, CEIMPA
Realização de Educação Permanente com SUAS E SUS de Roraima.	Contínuo	-	GMF, CEIMPA, SESAU, SMSA, SEMGES, SETRABES

Produtos da ação: Cronograma de formações internas e públicas do Comitê Estadual.

Contexto e observações: A perspectiva é que a formação seja ação sistemática e perene do comitê, interna e externamente.

ACÇÃO 8: EXPANSÃO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – RAPS

Meta da ação: O estado de Roraima conta com uma rede de saúde mental e assistência social ainda incipiente no que se refere ao acolhimento ao público em privação de liberdade e que possuem algum transtorno mental. Assim, alguns serviços necessitam de incremento no que se refere ao

aumento no número de vagas e serviços propriamente ditos, como um Serviço de Residência Terapêutica, por exemplo. Se faz necessário articulação com o poder executivo e legislativo para implantação e qualificação desses serviços, uma vez que a partir da execução desta política a demanda tenderá a aumentar.

Status da ação: Em fase de articulação.

Tarefas	Início	Término	Responsáveis
	<i>[mês/ano]</i>	<i>[mês/ano]</i>	
Reunião com executivo estadual para mediar possibilidades de expansão e qualificação de serviços	Março de 2025	Maio de 2025	GMF+CEIMPA
Reunião com executivo municipal para mediar possibilidades de expansão e qualificação de serviços	Março de 2025	Maio de 2025	GMF+CEIMPA

Produtos da ação: Expansão da Rede de Atenção Psicossocial;

Contexto e observações: Compreendendo a necessidade de fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial de Roraima, o GMF iniciou um processo de articulação com os poderes executivos para expandir a rede no sentido de garantir a assistência à população em sofrimento mental. Esse processo está em andamento e pretendemos concluir até julho de 2025.

ANEXOS

- 1. Modelo de PTS utilizado.

[illegible]
